



DECRETO ALCALDICIO N° 410 /
APRUEBA CANCELACIÓN ESTADO DE
PAGO N°1.
PROYECTO INSTALACIÓN Y RECAMBIO
DE SEÑALETICAS VIALES, SECTORES
VARIOS, COMUNA DE REQUINOA.

REQUINOA,

06 FEB 2026

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21.634 que moderniza la Ley N° 19.886 otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.

El Decreto Alcaldicio N° 661/2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.866, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250 de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

CONSIDERANDO:

La Res. Ext. N° 5360/2025 de fecha 14.08.2025, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que aprueba el Proyecto y la Transferencia de Recursos a la Municipalidad de Requinoa con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea Tradicional, año 2025

CODIGO	DESCRIPCION	MUNICIPALIDAD	TIPOLOGIA	PRESUPUESTO	MONTO (\$)
1-B-2025-39	INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES, SECTORES VARIOS, REQUINOA	REQUINOA	VIALIDAD	2025	39.195.923

El Decreto Alcaldicio N° 2321 de fecha 02.09.2025, que Autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, denominada **"INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES, SECTORES VARIOS, REQUINOA"**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas Formatos y Planimetría. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada Sr. Cristian Donoso M., Arquitecto, Secpla, el Sr. Jeyson Mendoza N., Ingeniero Constructor, Secpla, el Sr. Franco Illesca C., Arquitecto, Asesor Urbanista, Secpla, y el Sr. Franco Faundez S., Arquitecto, D.O.M., o quienes los subroguen.

El Certificado N° 163 de fecha 16.10.2025, del H. Concejo Municipal, que Aprueba por unanimidad Adjudicación de la Licitación Pública ID3656-115-LE25 **"INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES SECTORES VARIOS, REQUINOA"**, al Oferente **JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ, Rut [REDACTED]** por un monto de **\$ 35.470.181 IVA Inc.**, y un plazo de ejecución de **25 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2756 de fecha 21.10.2025, que Autoriza Licitación Pública ID **3656-115-LE25** adjudicada la obra **"INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES. SECTORES VARIOS, REQUINOA"**, al Oferente **JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ, Rut [REDACTED]** por un monto de **\$ 35.470.181 IVA Inc.**, y un plazo de ejecución de



25 días corridos. Designa Inspector Técnico de Obra, al profesional de la Dirección de Obras Municipales, Sr. Víctor Martínez González, Constructor Civil. Autoriza suscripción de Contrato.

El Decreto Alcaldicio N° 3017 de fecha 17.11.2025, que Aprueba acta de entrega de terreno de fecha 07.11.2025, correspondiente a la obra "**INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES. SECTORES VARIOS, REQUINOA**" adjudicado al Sr. **JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ**, Rut [REDACTED]. La fecha de los trabajos, será a contar del lunes 10.11.2025 y tendrá una duración de 25 días corridos, vale decir hasta el 04.12.2025

El Decreto Alcaldicio N° 3317 de fecha 11.12.2025, que nombra comisión de recepción provisoria de obras, correspondiente al proyecto "**INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES. SECTORES VARIOS, REQUINOA**". Adjudicado al Sr. **JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ**, Rut [REDACTED] la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermudez Quezada, Director de Obras Municipales, Franco Faundez Solís, Profesional DOM, Elisa Herrera Vergara, Profesional SECPLA, o quienes lo subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 3475 de fecha 26.12.2025, que aprueba acta de Recepción Provisoria de fecha 19.12.2025 correspondiente a la obra "**INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES. SECTORES VARIOS, REQUINOA**", al contratista Juan Carlos Muñoz SÁEZ Rut [REDACTED]

El Memo N° 046 de fecha 05.02.2026, de DOM, mediante el cual remite el Estado de pago N°1 de la obra denominada "**INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES. SECTORES VARIOS, REQUINOA**". Adjudicado al Sr. Juan Carlos Muñoz SÁEZ Rut [REDACTED] Equivalente a un total de \$ 35.470.181 (treinta y cinco millones cuatrocientos setenta mil ciento ochenta y un pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del contrato equivalente a \$1.773.509, resultando un monto líquido a cancelar de \$ 33.696.672 (treinta y tres millones seiscientos noventa y seis mil seiscientos setenta y dos pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100,0%.

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 16.12.2025, que aprueba Presupuesto Municipal 2026, aprobado en Sesión Extraordinaria N° 38 del Concejo Municipal, de fecha 11.12.2025.

DECRETO :

APRUEBASE cancelación de Estado de pago N°1 equivalente a un total de \$ 35.470.181 (treinta y cinco millones cuatrocientos setenta mil ciento ochenta y un pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del contrato equivalente a \$1.773.509, resultando un monto líquido a cancelar de \$ 33.696.672 (treinta y tres millones seiscientos noventa y seis mil seiscientos setenta y dos pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra "**INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES, SECTORES VARIOS, REQUINOA**", adjudicada al contratista Juan Carlos Muñoz SÁEZ Rut 12.009.274-K.


LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIO MUNICIPAL


CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (S)

CAB/LGE/MBQ/LAR/VMG/vmg.-

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Finanzas (1)

Dir. Obras Municipales (1)



FOLIO	734
FECHA	06/07/26
HORA	9:49

	FECHA	HORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
SECRETARÍA MUNICIPAL		
SECPLA		
DIDECO		
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
DEPTO. PERSONAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS		
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO		
RENTAS		
COMUNICACIONES		
CULTURA		
CONTROL		
JURÍDICO		
JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
DAEM		
DEPTO. DE SALUD		
CONCEJO		
MEDIO AMBIENTE		
AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA		
SECRETARIA ALCALDÍA		
O.I.R.S.		
SEGURIDAD PUBLICA		
JEFE DE GABINETE		

Administrador Municipal
FECHA
HORA

Alcalde
FECHA
HORA

6/2/26



MEMO. : N° 046 /
MAT. : Lo que indica
Requínoa, 05 de Febrero de 2026.

DE : **LUIS AGUILERA RIOS**
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S).

A : **CARLOS ARRIAGADA BLANCO**
ALCALDE (S).

1. A través del presente y en relación al proyecto **“INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES, SECTORES VARIOS, REQUINOA”**, a cargo del Sr. **Juan Carlos Muñoz Sáez, Rut [REDACTED]** tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago N°1 equivalente a un total de \$ 35.470.181 (treinta y cinco millones cuatrocientos setenta mil ciento ochenta y un pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del contrato equivalente a \$1.773.509, resultando un monto líquido a cancelar de \$ 33.696.672 (treinta y tres millones seiscientos noventa y seis mil seiscientos setenta y dos pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100,0% y viene con el visto bueno del sr. Víctor Martínez González en calidad de ITO del proyecto.


Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
 - Nómina de los trabajadores que prestaron servicios en obra.
 - Carátula Estado de Pago.
 - Estado de avance por ítem y porcentaje.
 - Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duración del contrato.
 - Factura N° 3028 de fecha 04 de Febrero 2026, por un monto de \$35.470.181 IVA incluido.
 - Nota de Crédito N°412 de fecha 04 de Febrero 2026, por un monto de \$35.470.181 IVA incluido (Error de digitación en factura electrónica N°3028).
 - Factura N° 3029 de fecha 04 de Febrero 2026, por un monto de \$33.696.672 IVA incluido.
 - Certificado de materiales requeridos por el ITO.
 - Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2026/18574027 y N°2000/2026/18599411.
 - Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodo Noviembre y Diciembre del 2025.
 - Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
 - Registro Fotográfico con avance de la obra.
 - MEMO ITO N° 045 de fecha 05.02.2026
2. Lo anterior, para su autorización mediante Decreto Alcaldicio.

Sin otro particular. Saluda atentamente a Ud.

LUIS AGUILERA RIOS
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S).

LAR/VMG/vmg
Distribución
- c.c Alcaldía
- c.c D.o.m.
- c.c Carpeta.



MEMO.: N° 45 /
MAT. : Lo que indica
Requinoa, 05 de Febrero de 2026.

DE : VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS.

A : LUIS AGUILERA RIOS
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S).

1. A través del presente y en relación al proyecto **“INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES, SECTORES VARIOS, REQUÍNOA”**, a cargo del Sr. **Juan Carlos Muñoz Sáez, Rut** [REDACTED] tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago N°1 equivalente a un total de \$ 35.470.181 (treinta y cinco millones cuatrocientos setenta mil ciento ochenta y un pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del contrato equivalente a \$1.773.509, resultando un monto líquido a cancelar de \$ 33.696.672 (treinta y tres millones seiscientos noventa y seis mil seiscientos setenta y dos pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100,0%.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
 - Nómina de los trabajadores que prestaron servicios en obra.
 - Carátula Estado de Pago.
 - Estado de avance por ítem y porcentaje.
 - Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duración del contrato.
 - Factura N° 3028 de fecha 04 de Febrero 2026, por un monto de \$35.470.181 IVA incluido.
 - Nota de Crédito N°412 de fecha 04 de Febrero 2026, por un monto de \$35.470.181 IVA incluido (Error de digitación en factura electrónica N°3028).
 - Factura N° 3029 de fecha 04 de Febrero 2026, por un monto de \$33.696.672 IVA incluido.
 - Certificado de materiales requeridos por el ITO.
 - Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2026/18574027 y N°2000/2026/18599411.
 - Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodo Noviembre y Diciembre del 2025.
 - Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
 - Registro Fotográfico con avance de la obra.
2. Lo anterior, para su autorización mediante Decreto Alcaldicio.

Sin otro particular. Saluda atentamente a Ud.



VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS.

VMG/vdg.-
Distribución
- c.c Alcaldía.
- c.c Dom.
- c.c Carpeta proyecto.



FOLIO	619
FECHA	03/02/26
HORA	9:58

	FECHA	HORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
SECRETARÍA MUNICIPAL		
SECPLA		
DIDECO		
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
DEPTO. PERSONAL		
X DIRECCIÓN DE OBRAS		
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO		
RENTAS		
COMUNICACIONES		
CULTURA		
CONTROL		
JURÍDICO		
JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
DAEM		
DEPTO. DE SALUD		
CONCEJO		
MEDIO AMBIENTE		
AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA		
SECRETARIA ALCALDIA		
O.I.R.S.		
SEGURIDAD PUBLICA		
JEFE DE GABINETE		

Administrador Municipal
FECHA
HORA

Alcalde
FECHA
HORA

(Signature)
3/24/26

1


2

3

4



JUAN CARLOS MUÑOZ



Santiago, 15 de ENERO de 2026

Sr.
Víctor Martínez
Dirección de Obras
Municipales
Ilustre Municipalidad de Requinoa

Asunto: Carta Conductor Estado de Pago N°1

Junto con saludar, nos dirigimos a usted para hacer entrega y solicitar dar curso al Estado de Pago N°1 correspondiente por un monto de \$33.696.672, de la obra: **"INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIALES, SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25**

Los Documentos anexados son los siguientes:

1. Carta solicitud Estado de Pago N°1.
2. Nomina Personal.
3. Caratula de Estado de pago.
4. Estado de Avance de Obra por ítem y en porcentaje.
5. Informe de las intervenciones realizadas en el periodo de duración del contrato.
6. Factura a nombre de la Municipalidad.
7. Certificado de Cumplimientos de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1)
8. Certificado de pagos de cotizaciones previsionales.
9. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30).
10. Entrega de set fotografías digitales y CD, en dos copias, que muestren avance de las secuencias de las distintas fases de la construcción de las obras, para respaldar rendición a SECPLA y obras.

Sin otro particular, se despide atentamente

Juan Carlos Muñoz Sáez
Contratista en Obras Viales

JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ

CONTRATISTA EN OBRAS VIALES Y CIVILES
09-7793600 02-28859528
juan.cmsaez@gmail.com

I. MUNICIPALIDAD REQUINOA	
DIRECCIÓN DE OBRAS	
Fecha:	04/02/2026
Folio:	10
Línea:	FS
CORRESPONDIENTE RECIBIDA	

04/02/26



Faint, illegible text or markings at the bottom left corner of the page.



MANDANTE: **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**
OBRA : **OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIALES,SECTORES VARIOS, REQUINOA"**
CONTRATISTA: **JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ**
RUT CONTRATISTA: [REDACTED]

NOMINA DE PERSONAL DE OBRA

Nº	Nombres	DIIT
1	BASTIAN ALEJANDRO BAHAMONDES CARRASCO	[REDACTED]
2	CARLOS ANDRES CARDENAS NAVARRO	[REDACTED]
3	JULIO CESAR SAEZ DIAZ	[REDACTED]
4	MARIO ANTONIO TUDELA GARAY	[REDACTED]

JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ
[REDACTED]

CONTRATISTA EN OBRAS MENORES
09-7793600 02-8859528
juan.cmsaez@gmail.com

ESTADO DE PAGO N°1

**"INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS
VIALES,SECTORES VARIOS, REQUINOA"**

ID DE MERCADO PUBLICO: ,3656-115-LE25

CONTRATISTA : JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ

RUT :

DIRECCIÓN : NUEVA IMPERIAL 4288, QUINTA NORMAL, STGO

1



MUNICIPALIDAD DE REQUINOA



ESTADO DE PAGO N°	1
VALOR E. DE PAGO \$	35.470.181
TIPO DE REAJUSTE	S/R
AVANCE FISICO	100%
FECHA E. DE PAGO	14-01-2026

"INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIALES, SECTORES VARIOS, REQUINOA"
ID DE MERCADO PUBLICO: 3656-115-LE25

CONTRATISTA : **JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ**
 OBRAS CONTRATADAS SEGÚN: **Decreto Alcaldicio N°2866 de fecha 04 de Noviembre de 2025.**
 FECHA INICIO DEL CONTRATO: **10-11-2025**
 FECHA TERMINO CONTRATO: **04-12-2025** PLAZO: **25 días corridos**
 AUMENTO DE PLAZO
 NUEVA FECHA TERMINO CONTRATO:
 MONTO DEL CONTRATO INICIAL: \$ **35.470.181**
 MODIFICACIONES AL CONTRATO (AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES): \$ **0**
 REAJUSTES AL CONTRATO: \$ **0**
MONTO TOTAL: \$ 35.470.181

	TOTAL
MONTO TOTAL DE LAS OBRAS Y REAJUSTES HASTA LA FECHA, INCLUIDO EL PRESENTE ESTADO DE PAGO	\$ 35.470.181
MONTO CANCELADO HASTA EL ESTADO DE PAGO ANTERIOR	\$ -
VALOR DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO	\$ 35.470.181
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO	
RETENIDO HASTA ESTADO DE PAGO ANTERIOR	
RETENCIONES PRESENTE ESTADO DE PAGO	5% \$ 1.773.509
SUB-TOTAL	\$ -1.773.509
LIQUIDO A PAGAR	\$ 33.696.672


DETALLE DE DECRETOS E INDICES BASES DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO

DECRETOS	INDICE BASE	MONTO
Decreto Alcaldicio N°2866 de fecha 04 de Noviembre de 2025.		\$ 35.470.181
TOTAL ESTADO DE PAGO		\$ 33.696.672

JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ
 CONTRATISTA

Victor Martinez
 ITO







ESTADO DE PAGO N°	\$	1
VALOR E. DE PAGO \$	\$	35.470.181
NUMERO DE HOJAS		2-3

ANEXO N° 1

"INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIALES, SECTORES VARIOS, REQUINOA"

ID DE MER 3656-115-LE25

CONTRATISTA:

JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ

OBRAS CONTRATADAS SEGÚN:

Decreto Alcaldicio N°2866 de fecha 04 de Noviembre de 2025.

DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS AL 04-12-2025


ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	Unidad	Cantidad	Precio	SUBTOTAL	Cantidad	% Avance	TOTAL
1 OBRAS PROVISORIAS								
1.1	Letro de obra	u	1,0	\$780.000	\$ 780.000	1,0	100%	\$ 780.000
1.2	Instalación de faenas	mes	1,0	\$1.250.000	\$ 1.250.000	1,0	100%	\$ 1.250.000
1.2.1	Servicios higiénicos provisorios	mes	1,0	\$150.000	\$ 150.000	1,0	100%	\$ 150.000
1.3	Retiro de señalética existente y demolición de poyos de hormigón	m²	21,00	\$35.000	\$ 735.000	21,0	100%	\$ 735.000
2 OBRA GRUESA								
2.1 Fundación								
2.1.1	Excavación	m²	4,40	\$95.000	\$ 418.000	4,4	100%	\$ 418.000
2.1.2	Emplantillado G-5 (e=5cm)	m²	0,40	\$125.000	\$ 50.000	0,4	100%	\$ 50.000
2.1.3	Hormigón G-20	m²	4,10	\$125.000	\$ 512.500	4,1	100%	\$ 512.500
2.2 Señaléticas								
2.2.1	Señalética doble con anclaje	uni	42,00	\$450.000	\$ 18.900.000	42,0	100%	\$ 18.900.000
3 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS								
3.1	Aseo final y retiro de escombros	m²	42,00	\$25.000	\$ 1.050.000	42,0	100%	\$ 1.050.000
					COSTO DIRECTO	\$23.845.500		
					GASTOS GENERALES (10%)	\$2.384.550		
					UTILIDADES (15%)	\$3.576.825		
					NETO	\$29.806.875		
					IVA 19% (SOBRE EL NETO)	\$5.663.306		
					TOTAL (NETO+IVA)	\$35.470.181		
					TOTAL	\$35.470.181		


 JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ
 CONTRATISTA


 VICTOR MARTINEZ
 ITO




 MUNICIPALIDAD DE REQUINOA





INFORME DE INTERVENCIONES REALIZADAS

OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIALES, SECTORES VARIOS,
REQUINOA" ID 3656-115-LE25"


Fecha	Acciones
10-nov	Entrega de Terreno
11-nov	Marcado de Puntos
12-nov	Marcado de Puntos
13-nov	Marcado de Puntos
14-nov	Confección de Perforaciones
15-nov	Confección de Perforaciones
16-nov	Confección de Perforaciones
17-nov	Confección de Perforaciones
18-nov	Confección de Perforaciones
19-nov	Confección de Perforaciones
20-nov	Confección de Perforaciones

JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ

CONTRATISTA EN OBRAS VIALES Y CIVILES

09-7793600 02-28859528

juan.cmsaez@gmail.com




21-nov	Confección de Perforaciones
22-nov	Confección de Perforaciones
23-nov	Confección de Perforaciones
24-nov	Confección de Perforaciones
25-nov	Instalación de Postes
26-nov	Instalación de Postes
27-nov	Instalación de Postes
28-nov	Instalación de Postes
29-nov	Instalación de Postes
30-nov	Instalación de Señales
01-dic	Instalación de Señales
02-dic	Instalación de Señales
03-dic	Limpieza de Obra
04-dic	Limpieza de Obra

Sin otro particular, se despide atentamente


 Juan Carlos Muñoz Sáez
 Contratista en Obras Viales
 12.009.274-K

JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ

CONTRATISTA EN OBRAS VIALES Y CIVILES
 09-7793600 02-28859528
 jjuan.cmsaez@gmail.com





JUAN CARLOS MUNOZ SAEZ

SUBCONTRATISTA DE OBRAS CIVILES-ALQUILER EQUIPOS CONSTRUCCIÓN

Dirección:
NUEVA IMPERIAL 4288
Quinta Normal - Santiago
Fono: 228859528 - 97793600
juan.cmsaez@gmail.com

R.U.T.: 12.009.274-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 3028


S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 04 de febrero de 2026

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA Teléfono :
R.U.T. : 69.081.300-9 Vencimiento :
Giro : FISCAL Forma de Pago :
Dirección : Comercio 121 Municipalidad de Requinoa Ciudad : REQUINOA
Comuna : REQUINOA
Referencia : desde licitacion ID: 3656-115-LE25 en ORDEN DE COMPRA : Nro. 3656-814-SE25 del 05-11-2025

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	INSTALACION Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES, SECTORES VARIOS, REQUINOA	UN	1	29.806.875	0	29.806.875

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto: \$ 29.806.875
19% I.V.A.: \$ 5.663.306
Total: \$ 35.470.181

Observaciones:

Cancelado por : _____

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



JUAN CARLOS MUNOZ SAEZ

SUBCONTRATISTA DE OBRAS CIVILES-ALQUILER EQUIPOS CONSTRUCCIÓN

Dirección:
NUEVA IMPERIAL 4288
Quinta Normal - Santiago
Fono: 228859528 - 97793600
juan.cmsaez@gmail.com

R.U.T.: 12.009.274-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 3028

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE


Santiago, 04 de febrero de 2026

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA Teléfono :
R.U.T. : 69.081.300-9 Vencimiento :
Giro : FISCAL Forma de Pago :
Dirección : Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna : REQUINOA Ciudad : REQUINOA
Referencia : desde licitacion ID: 3656-115-LE25 en ORDEN DE COMPRA : Nro. 3656-814-SE25 del 05-11-2025

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	INSTALACION Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES, SECTORES VARIOS, REQUINOA	UN	1	29.806.875	0	29.806.875

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS.--

Neto: \$ 29.806.875
19% I.V.A.: \$ 5.663.306
Total: \$ 35.470.181



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Observaciones:

Cancelado por : _____

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



JUAN CARLOS MUNOZ SAEZ

SUBCONTRATISTA DE OBRAS CIVILES-ALQUILER EQUIPOS
CONSTRUCCIÓN

Dirección:
NUEVA IMPERIAL 4288
Quinta Normal - Santiago
Fono: 228859528 - 97793600
juan.cmsaez@gmail.com

R.U.T.: 12.009.274-K

NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

N° 412

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE


Santiago, 04 de febrero de 2026

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. : 69.081.300-9
Giro : FISCAL
Dirección : Comercio 121 Municipalidad de Requinoa
Comuna : REQUINOA
Referencia : ERROR DE DIGITACION en FACTURA ELECTRONICA : Nro. 3028 del 04-02-2026

Teléfono :
Vencimiento :
Forma de Pago :
Ciudad : REQUINOA

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	INSTALACION Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES, SECTORES VARIOS, REQUINOA	UN	1	29.806.875	0	29.806.875

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto: \$ 29.806.875
19% I.V.A.: \$ 5.663.306
Total: \$ 35.470.181

Observaciones:

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Documento creado por www.facturacion.cl



JUAN CARLOS MUNOZ SAEZ

SUBCONTRATISTA DE OBRAS CIVILES-ALQUILER EQUIPOS CONSTRUCCIÓN

Dirección:
NUEVA IMPERIAL 4288
Quinta Normal - Santiago
Fono: 228859528 - 97793600
juan.cmsaez@gmail.com

R.U.T.: 12.009.274-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 3029

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 04 de febrero de 2026

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. : 69.081.300-9
Giro : FISCAL
Dirección : Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna : REQUINOA


Teléfono :
Vencimiento :
Forma de Pago :
Ciudad : REQUINOA

Referencia : DESDE LICITACION ID: 3656-115-LE25 en ORDEN DE COMPRA : Nro. 3656-814-SE25 del 05-11-2025

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	ESTADO DE PAGO N° 1 INSTALACION Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIALES, SECTORES VARIOS, REQUINOA	UN	1	28.316.531	0	28.316.531

SON: TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS.--

Neto: \$ 28.316.531
19% I.V.A.: \$ 5.380.141
Total: \$ 33.696.672



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Observaciones:

Cancelado por : _____

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Documento creado por www.facturacion.cl



JUAN CARLOS MUNOZ SAEZ

SUBCONTRATISTA DE OBRAS CIVILES-ALQUILER EQUIPOS
CONSTRUCCIÓN

Dirección:
NUEVA IMPERIAL 4288
Quinta Normal - Santiago
Fono: 228859528 - 97793600
juan.cmsaez@gmail.com

R.U.T.: 12.009.274-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 3029


S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 04 de febrero de 2026

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA Teléfono :
R.U.T. : 69.081.300-9 Vencimiento :
Giro : FISCAL Forma de Pago :
Dirección : Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna : REQUINOA Ciudad : REQUINOA
Referencia : DESDE LICITACION ID: 3656-115-LE25 en ORDEN DE COMPRA : Nro. 3656-814-SE25 del 05-11-2025

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	ESTADO DE PAGO N° 1 INSTALACION Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES, SECTORES VARIOS, REQUINOA	UN	1	28.316.531	0	28.316.531

SON: TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto: \$ 28.316.531
19% I.V.A.: \$ 5.380.141
Total: \$ 33.696.672

Observaciones:

Cancelado por :

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Documento creado por www.facturacion.cl

CEDIBLE

RUT: 77.314.397-8
FACTURA ELECTRÓNICA
NRO 34691

S.I.I. - UNIDAD SAN BERNARDO

CONSTRUCTOR 31

CONSTRUCTOR 31 SPA

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA
GRAN AVENIDA 10200, EL BOSQUE
Fono: +56979674400

Señor(es)	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ
Fecha	20-11-2025
RUT	12008274-4
Dirección	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ
Ciudad	-
Giro	-
Comuna	Puente Alto
Condiciones de Pago	Contado
Hora emisión	17:28:04

Item x Cant	Precio Unit	Total
H30 HORMIGON CONCRETO PREPARADO 25KG H30 TORO X 180 UNID		
	\$ 3.100,84	\$ 558.151,2
GASTOS DE ENVIO X 1 UNID		
	\$ 30.168,07	\$ 30.168,07

REFERENCIAS


Nota de pedido Nro. 1577670647403-01 del 20-11-2025
Pedido Online

OBSERVACIONES

Este documento no es válido para Retirar Productos en
Tienda, ya que puede ser reimpresso reiteradas veces.
Por lo cual sólo tendrá validez para Retirar en Tienda el
vale interno correctamente timbrado y validado.

Monto Neto	\$ 588.319
Monto Exento	\$ 0
IVA 19%	\$ 111.781
Total	\$ 700.100

Sistemas de facturación y administración de www.facto.cl



Timbre Electrónico SII

Resolución Ex. SII N° 11 de 2016 - Verifique documento:

<https://boletaelectronica.facto.cl>





Fecha Emisión: 08-01-2026

Hora Emisión: 14:25

Nº Certificado: 2000/2026/18574027

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)


Nombre o Razón Social	RUT		
JUAN CARLOS MUÑOZ SÁEZ	[REDACTED]		
Representante Legal	RUT Representante Legal		
JUAN CARLOS MUÑOZ SÁEZ	[REDACTED]		
Código Actividad Económica	Correo Electrónico	Teléfono	
	juan.cmsaez@gmail.com	997793932	
Región	Comuna		
REGION METROPOLITANA	QUINTA NORMAL		
Calle	Número	Departamento	
NUEVA IMPERIAL	4288		

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razón Social	RUT		
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9		
Representante Legal	RUT Representante Legal		
WALDO ANTONIO VALDIVIA MONTECINOS	8.278.834-4		
Calle	Número	Región	Comuna
COMERCIO 121	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUINOA

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Según Contrato Civil	Modo Participación		
3656-51-LE25 Adquisición e Instalación de señalizaciones con nombres de calle en Los Lirios y El Abra	Contratista		
Tipo de Obra	Empresa Principal		
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		
Domicilio	Número	Región	Comuna
calles de la comuna	sn	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUINOA



3 - Periodos

Objetivo del Certificado

Cursar estado de pago

Institución Recaudadora

Previred

3.1 - Periodo : Noviembre 2025

Trabajadores	Vigentes 4	Despedidos 0	
Cotizaciones Previsionales	Pagadas Si	Adjunta Nomina No	
Remuneraciones	Pagadas 4	No Pagadas 0	Monto Informado \$5.926.975
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	Pagadas No Aplica	No Pagadas No Aplica	Monto Informado No Aplica
Indemnización por Año(s) de Servicio	Pagadas No Aplica	No Pagadas No Aplica	Monto Informado No Aplica

4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio 3656-51-LE25 Adquisición e Instalación de señáleticas con nombres de calle en Los Lirios y El Abra en el (los) periodo(s):

- Noviembre 2025

5 - Información Importante


Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.



Alejandro Enrique Salazar Aguirre
Jefe Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

Nº Certificado: 2000/2026/18574027 Clave: Fy36HqCz





Fecha Emisión: 08-01-2026

Hora Emisión: 14:25

N° Certificado: 2000/2026/18574027


Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Noviembre 2025		
N°	RUT	Nombre Trabajador
1		Bastian Alejandro Bahamondes Carrasco
2		Carlos Andres Cardenas Navarro
3		Julio Cesar Saez Diaz
4		Mario Antonio Tudela Garay
		Total Trabajadores 4





Fecha Emisión: 12-01-2026

Hora Emisión: 17:47

Nº Certificado: 2000/2026/18599411

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)


Nombre o Razón Social	RUT		
JUAN CARLOS MUÑOZ SÁEZ	[REDACTED]		
Representante Legal	RUT Representante Legal		
JUAN CARLOS MUÑOZ SÁEZ	[REDACTED]		
Código Actividad Económica	Correo Electrónico	Teléfono	
	[REDACTED]	[REDACTED]	
Región	Comuna		
REGION METROPOLITANA	QUINTA NORMAL		
Calle	Número	Departamento	
NUEVA IMPERIAL	4288		

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razón Social	RUT		
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9		
Representante Legal	RUT Representante Legal		
WALDO ANTONIO VALDIVIA MONTECINOS	8.278.834-4		
Calle	Número	Región	Comuna
COMERCIO 121	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Según Contrato Civil	Modo Participación		
3656-51-LE25 Adquisición e Instalación de señalizaciones con nombres de calle en Los Lirios y El Abra	Contratista		
Tipo de Obra	Empresa Principal		
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		
Domicilio	Número	Región	Comuna
calles de la comuna	sn	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA



3 - Periodos

Objetivo del Certificado

Cursar estado de pago

Institución Recaudadora

Previred

3.1 - Periodo : Diciembre 2025

Trabajadores	Vigentes. 4	Despedidos 0		
Cotizaciones Previsionales	Pagadas Si	Adjunta Nomina No		
Remuneraciones	Pagadas 4	No Pagadas 0	Monto Informado \$6.081.339	
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	Pagadas No Aplica	No Pagadas No Aplica	Monto Informado No Aplica	
Indemnización por Año(s) de Servicio*	Pagadas No Aplica	No Pagadas No Aplica	Monto Informado No Aplica	

4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio 3656-51-LE25 Adquisición e Instalación de señáleticas con nombres de calle en Los Lirios y El Abra en el (los) periodo(s):

- Diciembre 2025

5 - Información Importante


Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.



Alejandro Enrique Salazar Aguirre
Jefe Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

Nº Certificado: 2000/2026/18599411 Clave: Wx2y6TBi





Fecha Emisión: 12-01-2026

Hora Emisión: 17:47

N° Certificado: 2000/2026/18599411


Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Diciembre 2025		
N°	RUT	Nombre Trabajador
1		Bastian Alejandro Bahamondes Carrasco
2		Carlos Andres Cardenas Navarro
3		Julio Cesar Saez Diaz
4		Mario Antonio Tudela Garay
		Total Trabajadores 4



Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) BASTIAN ALEJANDRO BAHAMONDES CARRASCO, Rut [REDACTED] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador JUAN CARLOS MUNOZ SAEZ, Rut: 12.009.274-K, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Noviembre 2025	REM	\$1.722.475	\$15.502	13/12/2025	2006251100937892
PLANVITAL (SIS)	Noviembre 2025	REM	\$1.722.475	\$25.665	13/12/2025	2004202511371701
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2025	REM	\$1.722.475	\$193.951	13/12/2025	2004202511371701
PLANVITAL (AFC)	Noviembre 2025	REM	\$1.722.475	\$51.674	13/12/2025	2004202511371701
FONASA (COTIZACION SALUD)	Noviembre 2025	REM	\$1.722.475	\$120.573	13/12/2025	2017251101018477
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Noviembre 2025	REM	\$1.722.475	\$57.014	13/12/2025	2081202511180293

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)


Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
 Gerente General

Certificado Electrónico
06/01/2026 12:56:37
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.



Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) JULIO CESAR SAEZ DIAZ, Rut: [REDACTED] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ, Rut: 12.009.274-K, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Noviembre 2025	REM	\$1.338.052	\$12.042	13/12/2025	2006251100937892
PROVIDA (SIS)	Noviembre 2025	REM	\$1.338.052	\$19.937	13/12/2025	2005202511469220
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2025	REM	\$1.338.052	\$154.545	13/12/2025	2005202511469220
PROVIDA (AFC)	Noviembre 2025	REM	\$1.338.052	\$40.141	13/12/2025	2005202511469220
FONASA (COTIZACION SALUD)	Noviembre 2025	REM	\$1.338.052	\$93.664	13/12/2025	2017251101018477
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Noviembre 2025	REM	\$1.338.052	\$44.290	13/12/2025	2081202511180293

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)


Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
 Gerente General

Certificado Electrónico
06/01/2026 12:56:37
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.



Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) CARLOS ANDRES CARDENAS NAVARRO, Rut: [REDACTED] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ, Rut: 12.009.274-K, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Noviembre 2025	REM	\$1.762.048	\$15.858	13/12/2025	2006251100937892
HABITAT (SIS)	Noviembre 2025	REM	\$1.762.048	\$26.255	13/12/2025	2002202511414201
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2025	REM	\$1.762.048	\$200.345	13/12/2025	2002202511414201
HABITAT (AFC)	Noviembre 2025	REM	\$1.762.048	\$52.861	13/12/2025	2002202511414201
FONASA (COTIZACION SALUD)	Noviembre 2025	REM	\$1.762.048	\$123.343	13/12/2025	2017251101018477
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Noviembre 2025	REM	\$1.762.048	\$58.324	13/12/2025	2081202511180293

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)


Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen Nº 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
 Gerente General

Certificado Electrónico
06/01/2026 12:56:37
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.



Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) MARIO ANTONIO TUDELA GARAY, Rut: [REDACTED], por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador JUAN CARLOS MUNOZ SAEZ, Rut: 12.009.274-K, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Nº Folio Planilla</i>
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Noviembre 2025	REM	\$1.104.400	\$9.940	13/12/2025	2006251100937892
HABITAT (SIS)	Noviembre 2025	REM	\$1.104.400	\$16.456	13/12/2025	2002202511414201
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2025	REM	\$1.104.400	\$125.570	13/12/2025	2002202511414201
HABITAT (AFC)	Noviembre 2025	REM	\$1.104.400	\$33.132	13/12/2025	2002202511414201
FONASA (COTIZACION SALUD)	Noviembre 2025	REM	\$1.104.400	\$77.308	13/12/2025	2017251101018477
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Noviembre 2025	REM	\$1.104.400	\$36.556	13/12/2025	2081202511180293

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)


Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
 Gerente General

Certificado Electrónico
06/01/2026 12:56:37
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.



Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) BASTIAN ALEJANDRO BAHAMONDES CARRASCO, Rut: [REDACTED] por los periodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador JUAN CARLOS MUNOZ SAEZ, Rut: 12.009.274-K, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Nº Folio Planilla</i>
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Diciembre 2025	REM	\$1.786.152	\$16.075	12/01/2026	2006251200903589
PLANVITAL (SIS)	Diciembre 2025	REM	\$1.786.152	\$26.614	12/01/2026	2004202512376711
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Diciembre 2025	REM	\$1.786.152	\$201.121	12/01/2026	2004202512376711
PLANVITAL (AFC)	Diciembre 2025	REM	\$1.786.152	\$53.585	12/01/2026	2004202512376711
FONASA (COTIZACION SALUD)	Diciembre 2025	REM	\$1.786.152	\$125.031	12/01/2026	2017251200976936
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Diciembre 2025	REM	\$1.786.152	\$59.122	12/01/2026	2081202512171462

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)


Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
 Gerente General

Certificado Electrónico
15/01/2026 12:43:40
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.



Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) JULIO CESAR SAEZ DIAZ, Rut: [REDACTED] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ, Rut: 12.009.274-K, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Nº Folio Planilla</i>
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Diciembre 2025	REM	\$1.225.062	\$11.026	12/01/2026	2006251200903589
PROVIDA (SIS)	Diciembre 2025	REM	\$1.225.062	\$18.253	12/01/2026	2005202512475884
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Diciembre 2025	REM	\$1.225.062	\$141.495	12/01/2026	2005202512475884
PROVIDA (AFC)	Diciembre 2025	REM	\$1.225.062	\$36.751	12/01/2026	2005202512475884
EONASA (COTIZACION SALUD)	Diciembre 2025	REM	\$1.225.062	\$85.754	12/01/2026	2017251200976936
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Diciembre 2025	REM	\$1.225.062	\$40.550	12/01/2026	2081202512171462

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)


Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gérente General

Certificado Electrónico
15/01/2026 12:43:40
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.



Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) CARLOS ANDRES CARDENAS NAVARRO, Rut: [REDACTED] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ, Rut: 12.009.274-K, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Nº Folio Planilla</i>
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Diciembre 2025	REM	\$1.702.698	\$15.324	12/01/2026	2006251200903589
HABITAT (SIS)	Diciembre 2025	REM	\$1.702.698	\$25.370	12/01/2026	2002202512418851
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Diciembre 2025	REM	\$1.702.698	\$193.597	12/01/2026	2002202512418851
HABITAT (AFC)	Diciembre 2025	REM	\$1.702.698	\$51.081	12/01/2026	2002202512418851
FONASA (COTIZACION SALUD)	Diciembre 2025	REM	\$1.702.698	\$119.189	12/01/2026	2017251200976936
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Diciembre 2025	REM	\$1.702.698	\$56.359	12/01/2026	2081202512171462

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)


Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
 Gerente General

Certificado Electrónico
15/01/2026 12:43:40
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.



Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PREVIRED, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) MARIO ANTONIO TUDELA GARAY, Rut: [REDACTED] por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ, Rut [REDACTED] mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>N° Folio Planilla</i>
SEGURO SOCIAL PREVISIONAL	Diciembre 2025	REM	\$1.367.427	\$12.307	12/01/2026	2006251200903589
HABITAT (SIS)	Diciembre 2025	REM	\$1.367.427	\$20.375	12/01/2026	2002202512418851
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Diciembre 2025	REM	\$1.367.427	\$155.476	12/01/2026	2002202512418851
HABITAT (AFC)	Diciembre 2025	REM	\$1.367.427	\$41.023	12/01/2026	2002202512418851
FONASA (COTIZACION SALUD)	Diciembre 2025	REM	\$1.367.427	\$95.720	12/01/2026	2017251200976936
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	Diciembre 2025	REM	\$1.367.427	\$45.262	12/01/2026	2081202512171462

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY); Planillas Complementarias (COM)


Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PREVIRED y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
 Gerente General

Certificado Electrónico
15/01/2026 12:43:40
PREVIRED

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.





Nº: 2000 / 2026 / 22724

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
██████████	JUAN CARLOS MUNOZ SAEZ	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
██████████	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	
DOMICILIO		
NUEVA IMPERIAL 4288 0		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	QUINTA NORMAL	(2) 997793600
CORREO ELECTRÓNICO		
JUAN.CMSAEZ@GMAIL.COM		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)


MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --



3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 07/02/2026 , siendo válido en todo el territorio nacional.

ALEJANDRO ENRIQUE SALAZAR AGUIRRE
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCION NACIONAL


EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificador de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Antecedentes Laborales y Previsionales")

N1r6fY31

ASA /

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes








OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOVA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial










OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial

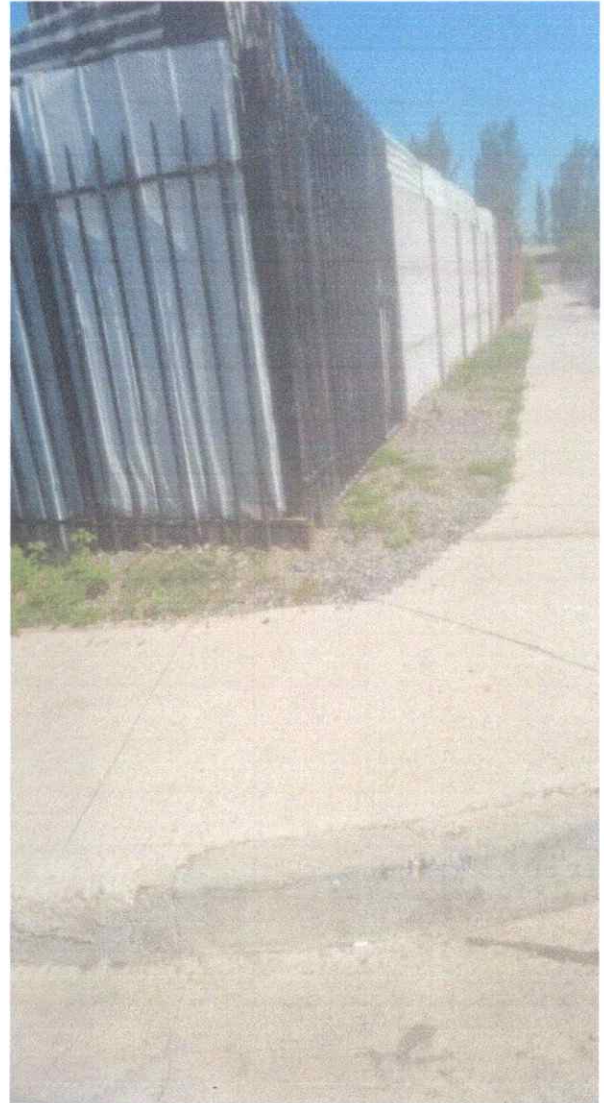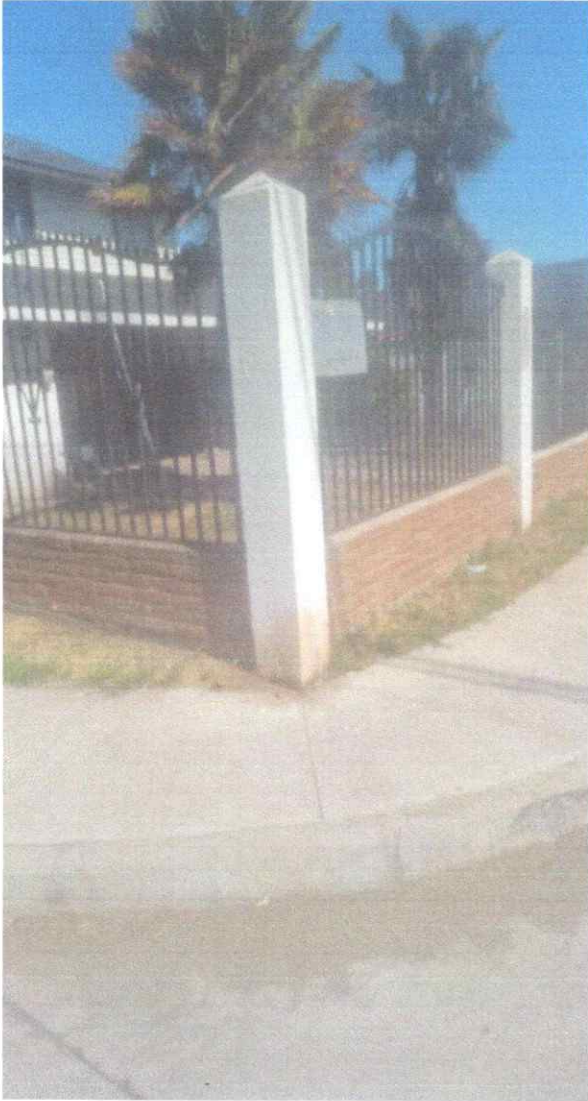







OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial

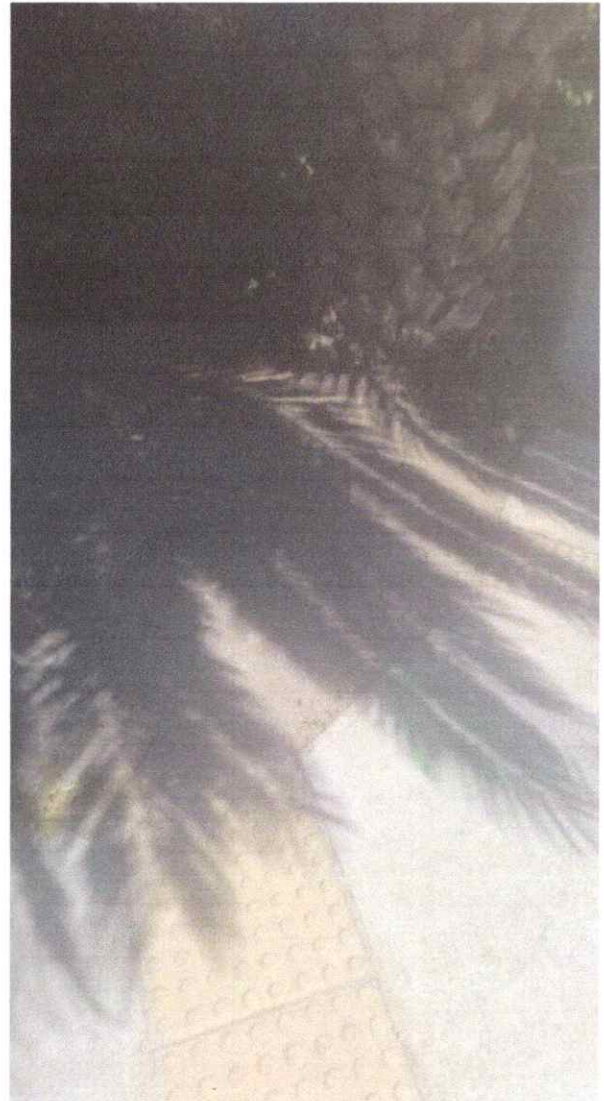






OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial








OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial

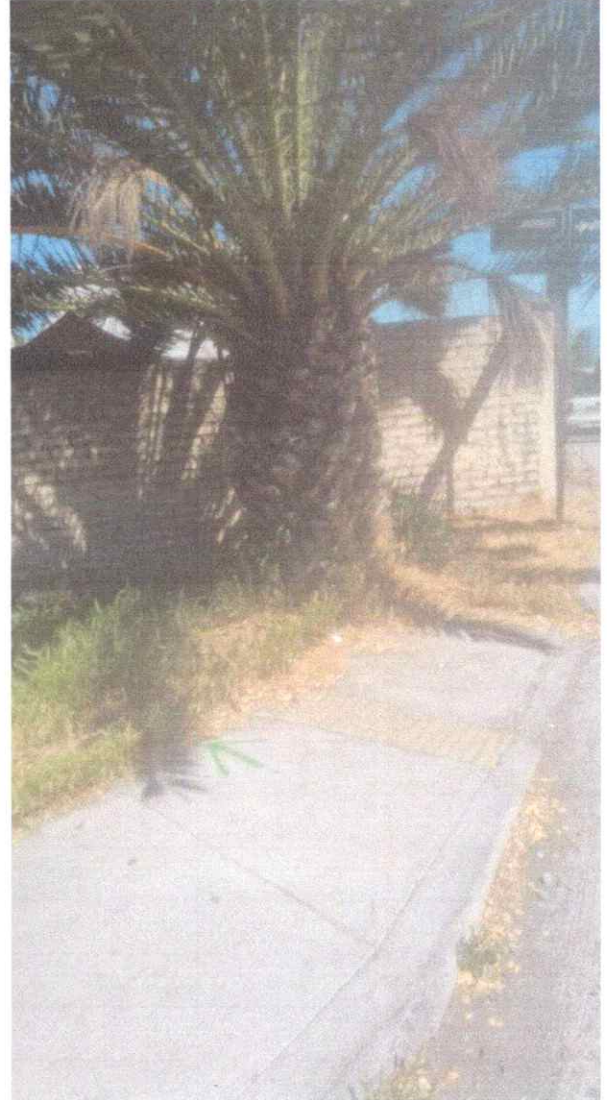




OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial








OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial








OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial








OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial








OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial








OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial








OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOVA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial










OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial

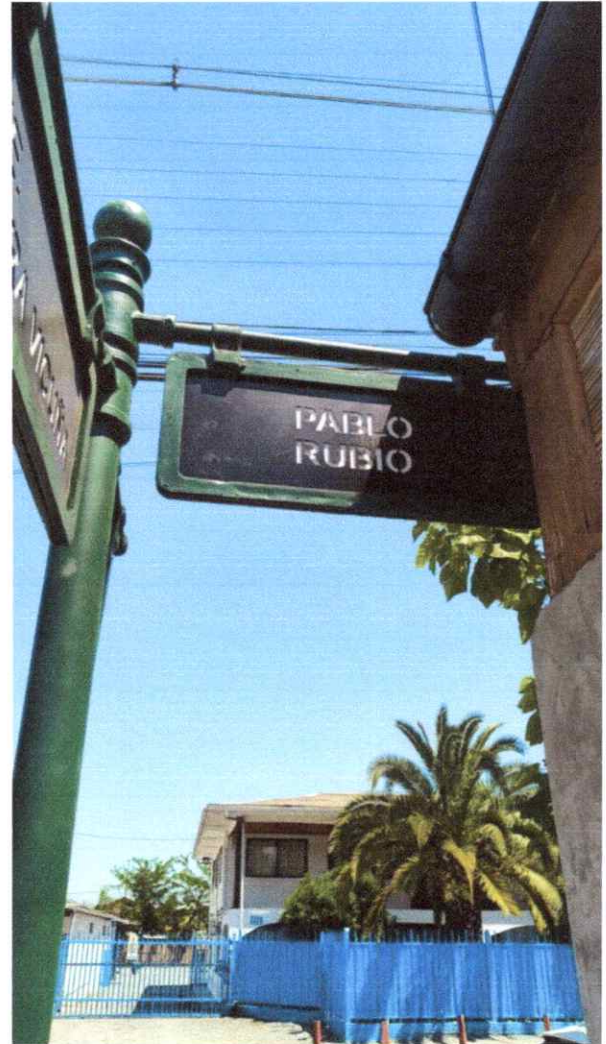
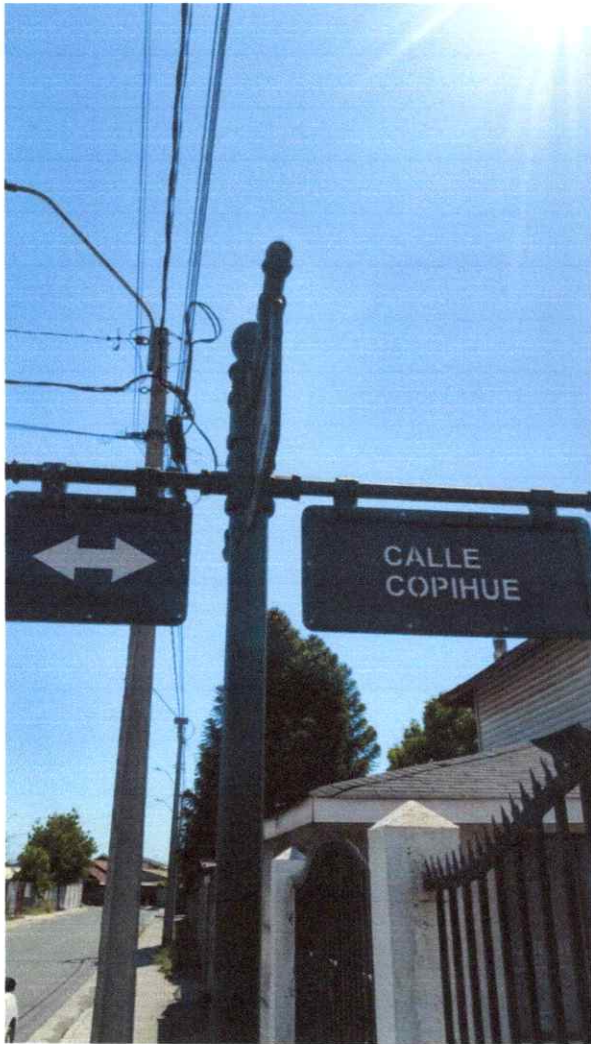






OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25


JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial

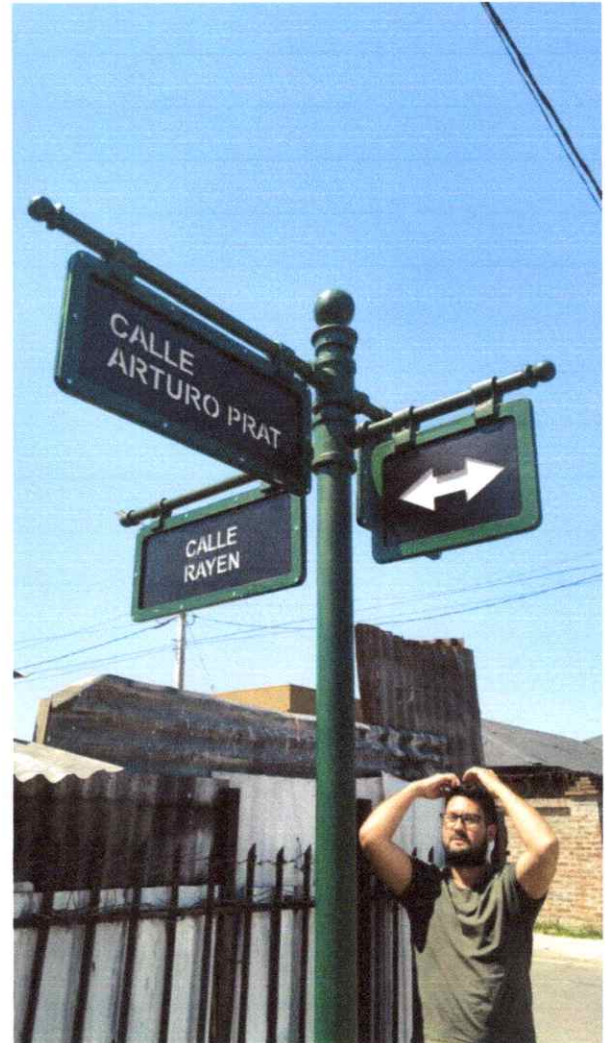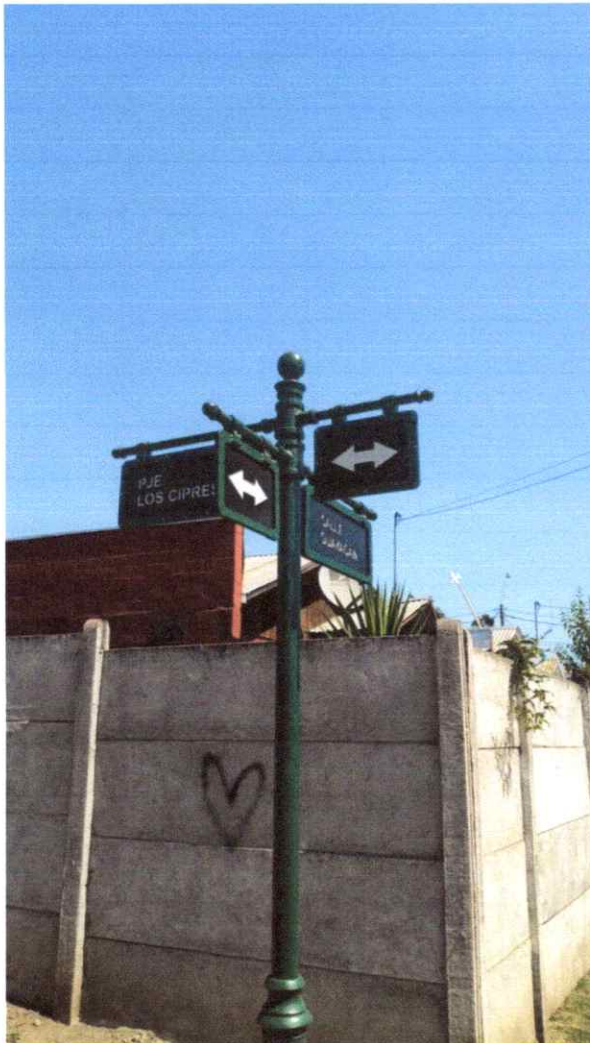




OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial


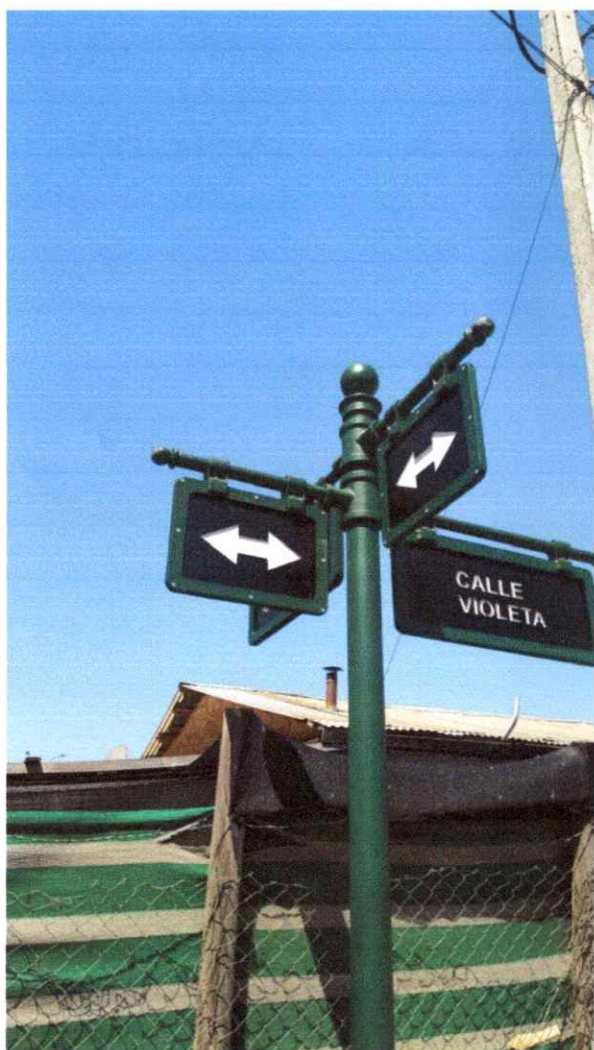


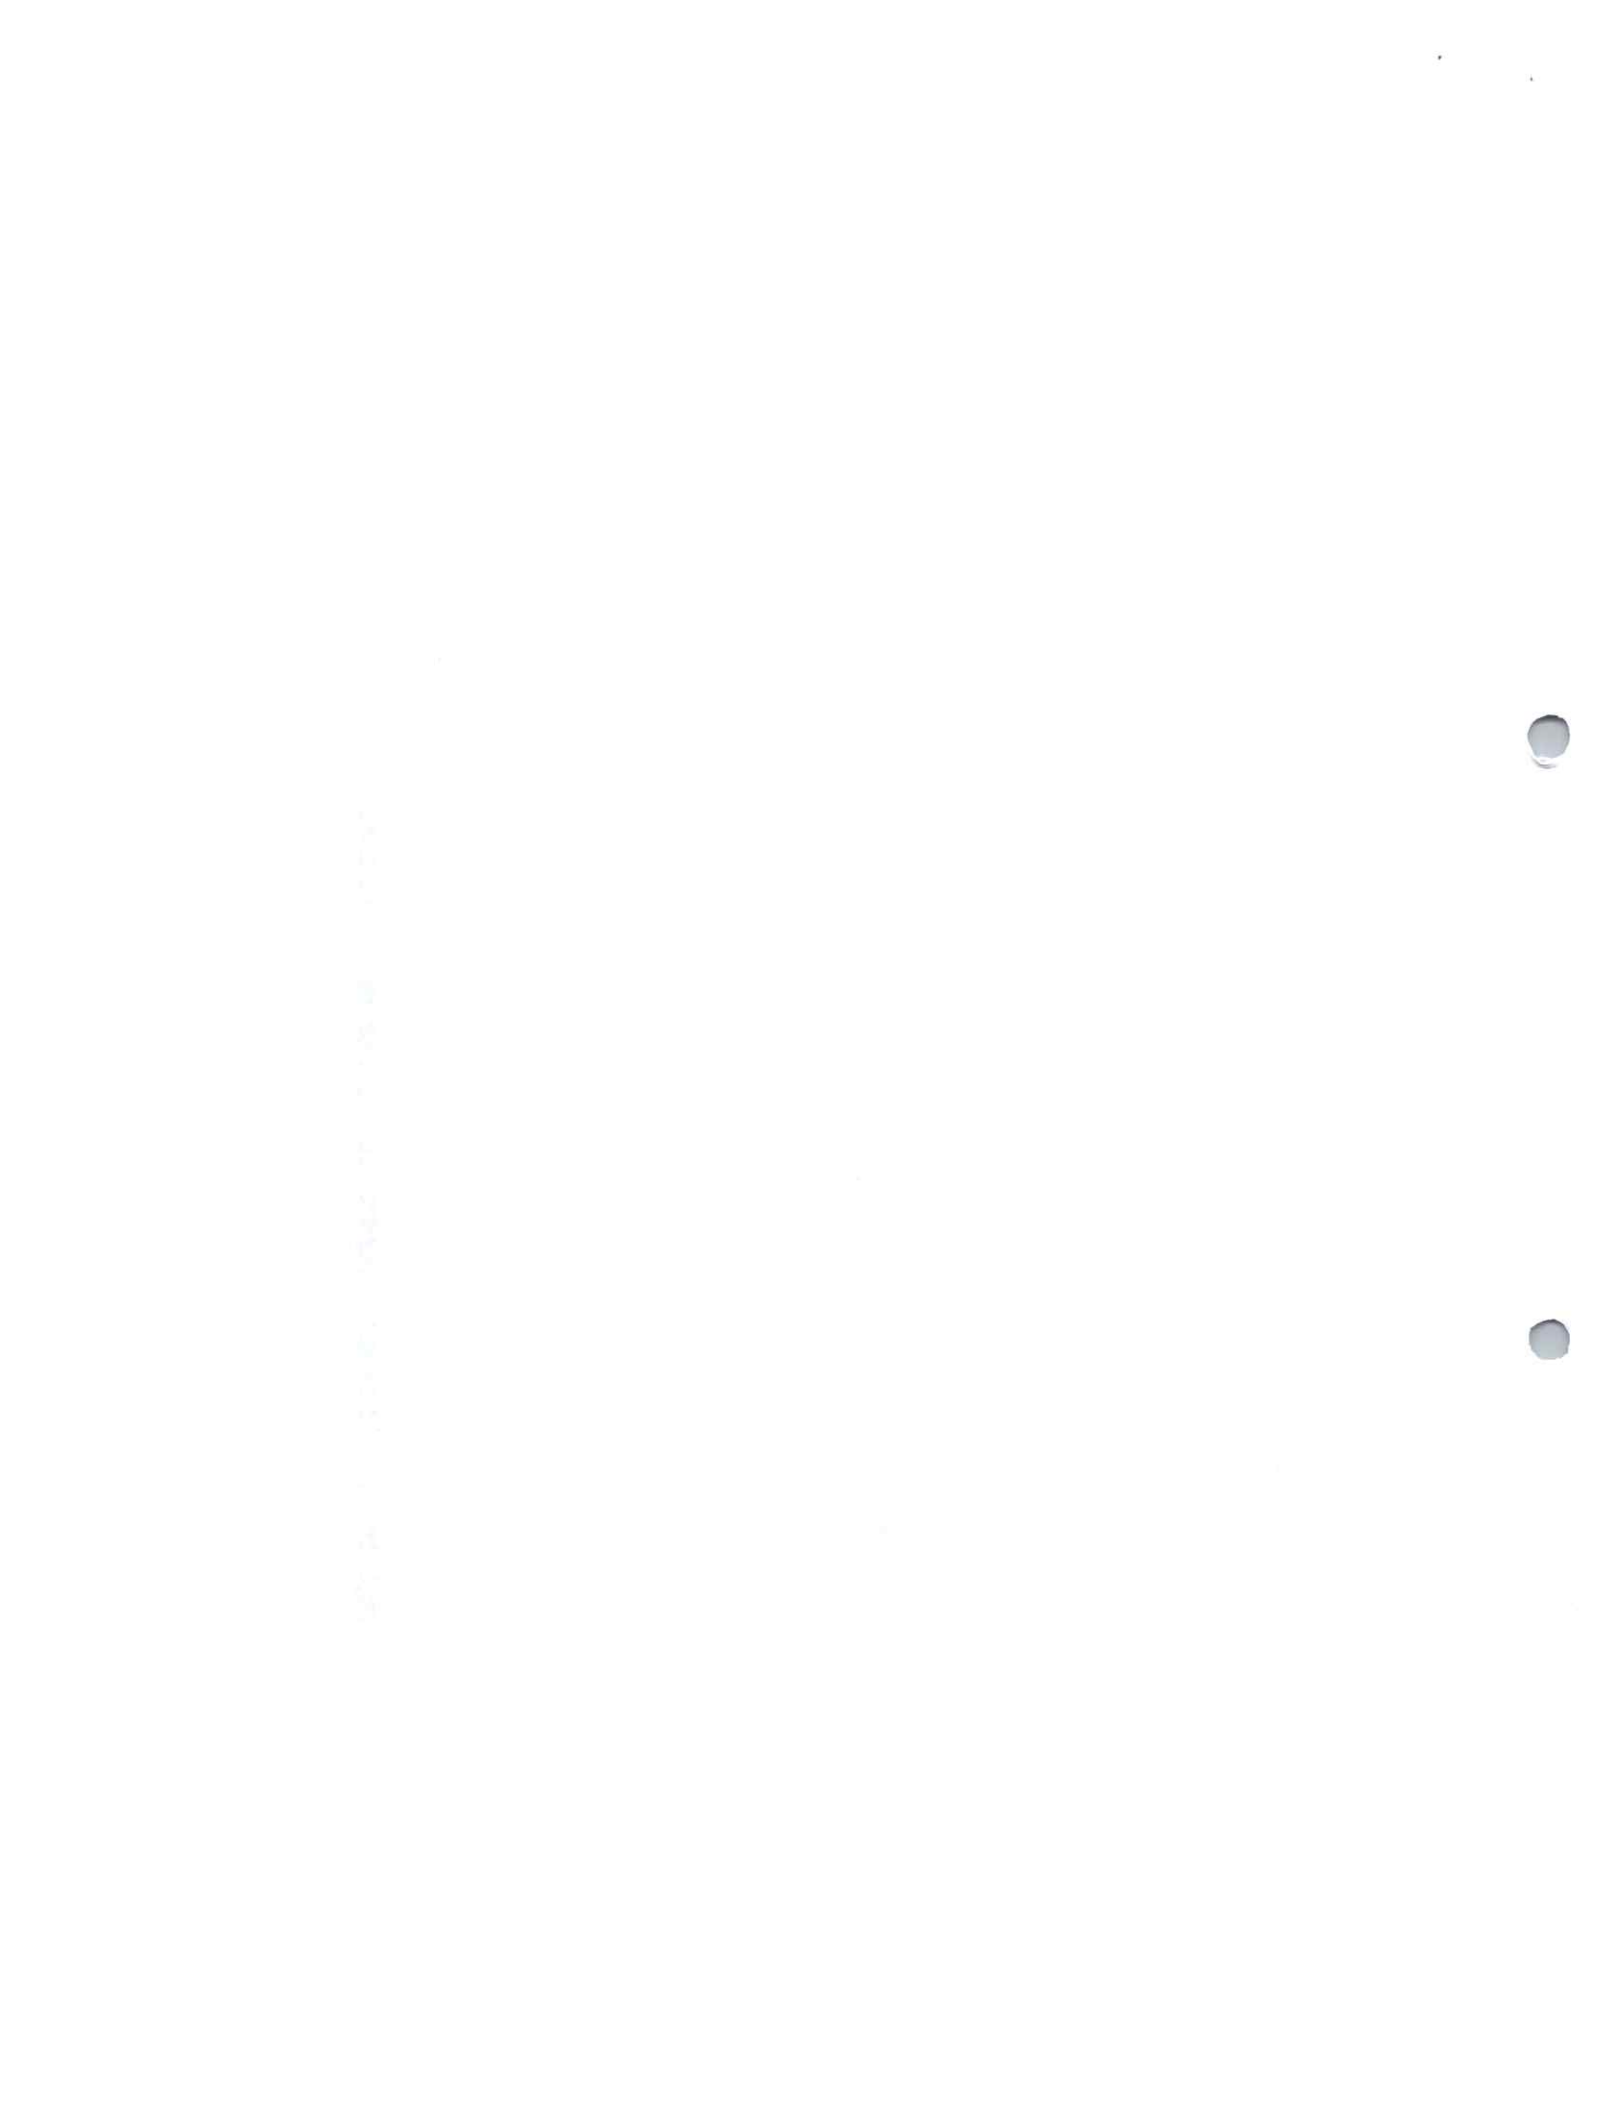




OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial

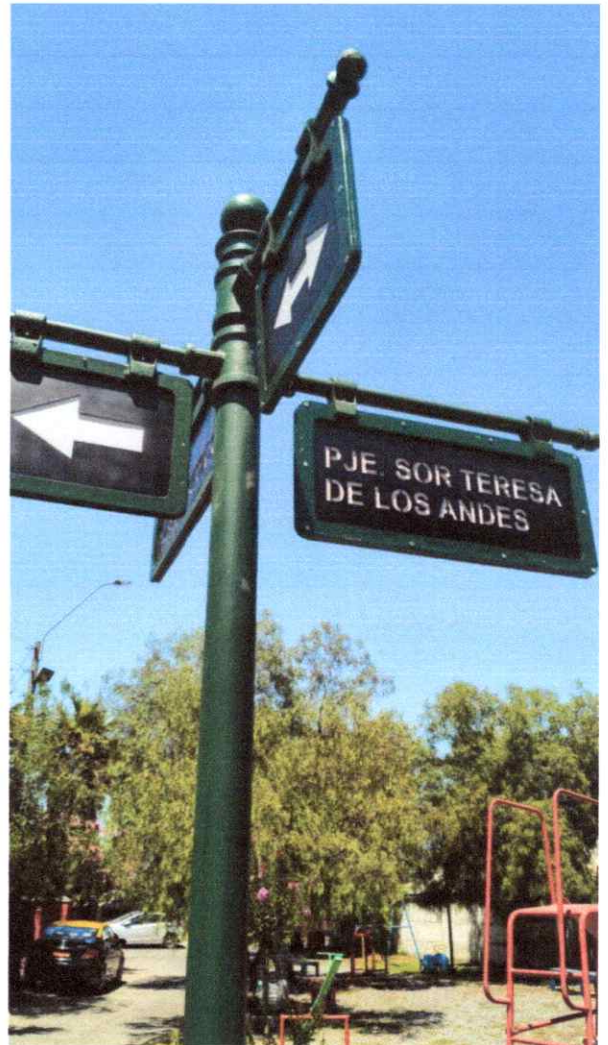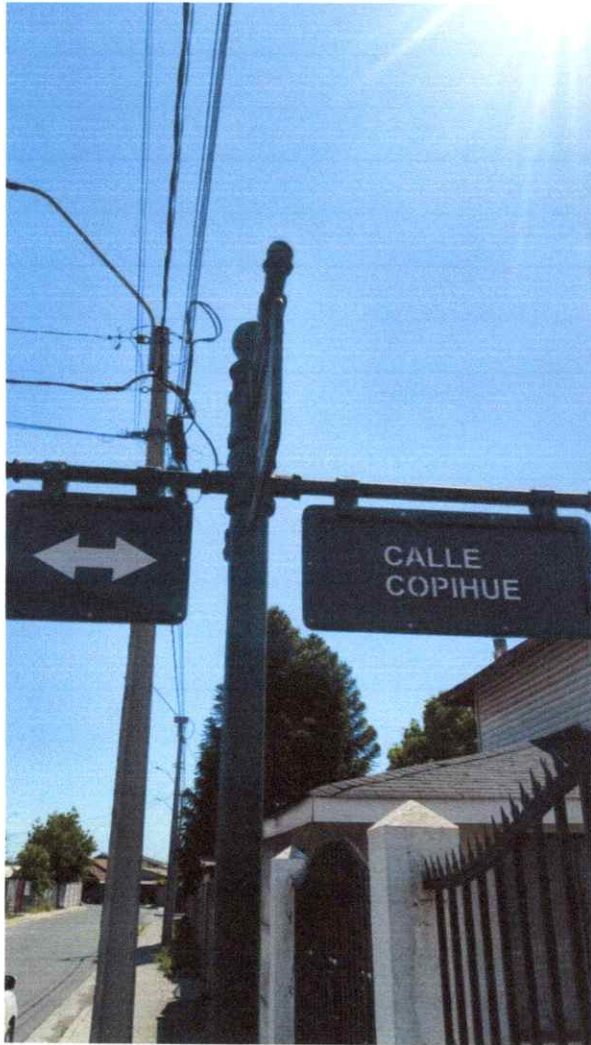






OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial

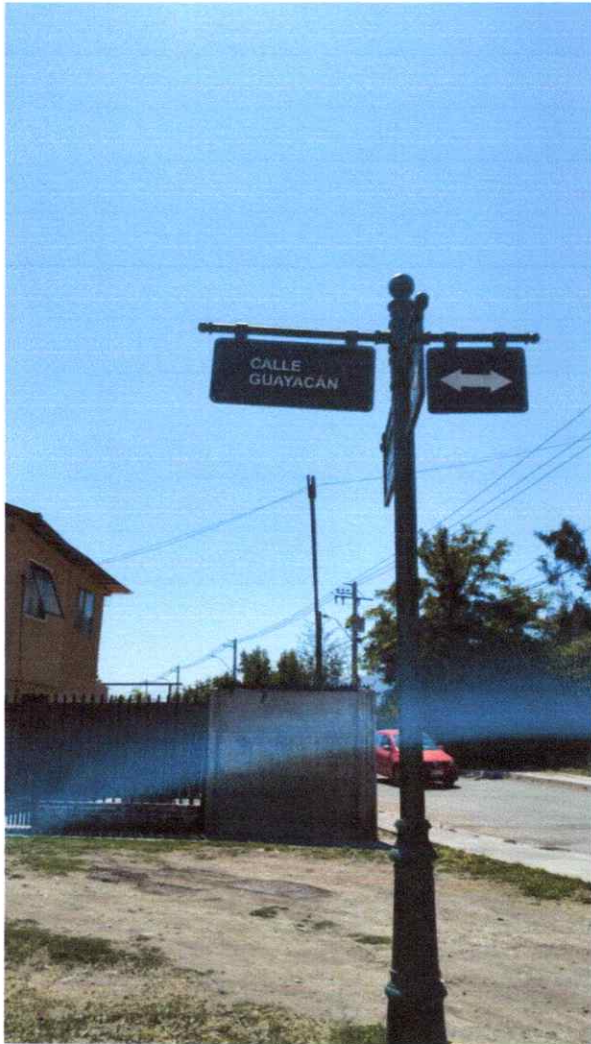

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.



OBRA "INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE SEÑALÉTICAS VIAL
SECTORES VARIOS, REQUINOA" ID 3656-115-LE25

JUAN CARLOS MUÑOZ
señalización y demarcación vial

