DECRETO ALCALDICIO
APRUEBASE CANCELACIÓN ESTADO DE PAGO N°1.
OBRA QUE INDICA
REQUINOA

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley 21.634 Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado y su reglamento vigente.

Decreto 661/2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como de proveedores que venden sus productos y servicios a los organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N°9604 de fecha 23.12.2025, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que aprueba Proyecto **"REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PARAGUAY, COMUNADE REQUINOA"**, por un monto de **$143.421.361.-**

El Decreto Alcaldicio N°825 de fecha 30.03.2026, que declara desierto el proceso de Licitación Pública **ID3656-45-LP26**, denominada **"REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PARAGUAY, COMUNA DE REQUÍNOA"**, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto N°661, que aprueba el reglamento que moderniza la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en atención a que las ofertas presentadas han sido declaradas inadmisibles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del mismo cuerpo normativo.

El Decreto Alcaldicio Nº 840 de fecha 01.04.2026, que autoriza inicio al segundo proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, correspondiente a la obra **"REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PARAGUAY, COMUNA DE REQUINOA".** Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Planimetría, Especificaciones Técnicas y Formatos y designa comisión evaluadora de ofertas a la Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil de Secpla, el Sr. Franco Illesca Castro, Arquitecto de Secpla y la Srta. Pilar Gutiérrez Caro, Ingeniero Constructor de la Dirección de Obras Municipales, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N°1502 de fecha 01.06.2026, que autoriza Licitación Pública **ID-3656-88-LP26**. Adjudica contratación de la obra denominada **"REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PARAGUAY, COMUNA DE REQUINOA"**, al oferente **INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (UTP), Rut: 77.947.259-0**, por un monto de **$131.527.543**.- IVA incluido, en un plazo máximo de 105 días corridos. Aprueba suscripción de contrato y designa Inspector Técnico de Obras (ITO) al profesional de la Dirección de Obras Municipales, el Sr. Víctor Martínez González.

MABQ

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/SxgSa3lqyRuB03u
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

El Decreto Alcaldicio N°1694 de fecha 18.06.2026, que Aprueba el contrato de fecha 16.06.2026, suscrito entre la Municipalidad de Requínoa y el contratista **INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (UTP)**, Rut: **77.947.259-0**, para la ejecución de la obra **"REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PARAGUAY, COMUNA DE REQUINOA",** por un monto de **$131.527.543**.- IVA incluido, en un plazo máximo de ejecución de 105 días corridos. Autoriza la emisión de Orden de Compras en el Portal Mercado Publico.cl. Imputa el gasto a la cuenta 215-31-02-004-230-000 PMU REPOSICIÓN VEREDAS POBLACIÓN PARAGUAY SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES.

El Decreto Alcaldicio N°1834 de fecha 06.07.2026, que Aprueba acta de entrega de terreno de fecha 23.06.2026, correspondiente a la Obra **"REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PARAGUAY, COMUNA DE REQUINOA" ID-3656-88-LP26**, Adjudicado a los Sres. **INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (UTP)**, Rut: **77.947.259-0**, Representante Legal el Sr. Felipe Andrés Pereira Becerra Rut: [redacted] la fecha de los trabajos serán a contar del miércoles 24.06.2026 y tendrá una duración de 105 días corridos, vale decir hasta el 06.10.2026.

El Decreto Alcaldicio N°1857 de fecha 08.07.2026, que Aprueba suspensión de plazos de ejecución de la obra **"REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PARAGUAY, COMUNA DE REQUINOA" ID-3656-88-LP26.** Adjudicado a los Sres. **INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (UTP)**, Rut: **77.947.259-0.** A contar del día 26.06.2026, esto debido al ingreso de al ingreso de boleta de garantía y la dictación de la resolución administrativa que autoriza la ejecución de las obras de pavimentación de SERVIU Región de O´Higgins, por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo establecido y conforme al punto 12 de las BAE, "se podrá suspender los plazos para tramitar permisos en servicios tales como: Solicitar autorización y/o resolución con algún organismo Público Externo y/o privado".

El Decreto Alcaldicio N° 1951 de fecha 23.07.2026, que Aprueba activación de plazos de ejecución de la obra **"REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PARAGUAY, COMUNA DE REQUINOA" ID-3656-88-LP26.** Adjudicado a los Sres. **INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (UTP)**, Rut: **77.947.259-0.** A contar del día 21.07.2026, esto debido a que se obtuvo aprobación de permiso de rotura y reposición de pavimentos SERVIU O´Higgins N° 61/26 de fecha 20/07/2026, el cual autoriza la ejecución de las obras del proyecto denominado **"REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PARAGUAY, COMUNA DE REQUÍNOA"**. Quedando como nueva fecha de término el 25/06/2026. Quedando como nueva fecha de término el 31.10.2026.

El Memo N° 414 de fecha 11.09.2026, de DOM, mediante el cual remite el estado de pago N°1, correspondiente a la obra denominada **"REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PARAGUAY, COMUNA DE REQUINOA" ID-3656-88-LP26.** Adjudicado a los Sres. **INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (UTP)**, Rut: **77.947.259-0,** equivalente a un total de $ 31.429.728 (treinta y un millones cuatrocientos veintinueve mil setecientos veintiocho pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a $ 3.142.973, resultando un monto líquido a cancelar de $ 28.286.755 (veintiocho millones doscientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 23,9%.

El decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba presupuesto municipal año 2026.

MABQ

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/SxgSa3lqyRuB03u
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

D E C R E T O :

APRUEBASE el Estado de pago N°1 equivalente a un total de $ 31.429.728 (treinta y un millones cuatrocientos veintinueve mil setecientos veintiocho pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a $ 3.142.973, resultando un monto líquido a cancelar de $ 28.286.755 (veintiocho millones doscientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco pesos IVA incluido). Correspondiente a la obra **"REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PARAGUAY, COMUNA DE REQUINOA" ID-3656-88-LP26.** Adjudicado a los Sres. **INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (UTP)**, Rut: **77.947.259-0.**

IMPUTESE el gasto a la cuenta 215-31-02-004-230-000 PMU REPOSICIÓN VEREDAS POBLACIÓN PARAGUAY SERVICIOS COMUNITARIOS / PROYECTOS MUNICIPALES.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal
Secpla
Finanzas
Dir. Obras Municipales

MABQ

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/SxgSa3lqyRuB03u
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MAT. : Lo que indica.

A: WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

DE: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A través del presente, y en relación al proyecto denominado **"REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PARAGUAY, COMUNA DE REQUÍNOA"** a cargo de los Sres. **INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN ALBURA LIMITADA (UTP) RUT: 77.947.259-0**, Representante Legal el Sr. **Felipe Andrés Pereira Becerra RUT:** [redacted] tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago N°01 equivalente a un total de $ 31.429.728 (treinta y un millones cuatrocientos veintinueve mil setecientos veintiocho pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a $ 3.142.973, resultando un monto líquido a cancelar de $ 28.286.755 (veintiocho millones doscientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 23,9% y viene con el visto bueno del Sr. Víctor Martínez González en calidad de ITO del proyecto.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.
- Carátula Estado de Pago.
- Estado de avance por ítem y porcentaje.
- Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duración del contrato.
- Factura N° 48 de fecha 07 de Septiembre del 2026, por un monto de $28.286.755 IVA incluido.
- Certificado de materialidad según requerimiento de ITO.
- Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2026/19746974.
- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodo julio del 2026.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales del periodo julio del 2026.
- Registro Fotográfico con avance de la obra.
- MEMO ITO N°411 de fecha 11 de septiembre del 2026.

Saluda atentamente.

MABQ

Firmado electrónicamente
MARIELA ALEJANDRA
BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS
MUNICIPALES

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/sYtFzbcS3C9Rhtw
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

F 2023
DON

CONSTRUCTORA
ALBURA
INGENIERIA, ARQUITECTURA & CONSTRUCCION

ORD. N° : 18 - 2026

MAT. : Ingreso Estado de Pago N°1

Requinoa, 08 de septiembre de 2026

I. MUNICIPALIDAD REQUINOA
DIRECCION DE OBRAS
Fecha: 08/09/2026
Folio: 1118
Línea: 670
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

A : Sr. WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

AT : Sr. VICTOR MARTINEZ GONZALEZ
ITO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DE : Sr. FELIPE PEREIRA BECERRA
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA.

Referente a la Licitación N°3656-88-LP26 "Reposición de Veredas Población Paraguay, comuna Requinoa".

Por la presente vengo a ingresar Estado de Pago N°1, correspondiente al contrato "Reposición de Veredas Población Paraguay, comuna Requinoa".

Se Adjunta la siguiente Documentación:

- Carta de Solicitud
- Nómina de Trabajadores.
- Caratula de Estado de Pago.
- Estado de Avance de Obra por Ítem.
- Informe de las Intervenciones Realizadas.
- Factura.
- Certificaciones de Materiales según requiriendo ITO
- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1).
- Certificado de pago de cotizaciones previsionales.
- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30).
- Set Fotográficos.

Saluda cordialmente.

Ingeniería, Arquitectura y Construcción
ALBURA LIMITADA
77.947.259-0

FELIPE PEREIRA BECERRA
Representante Legal
ING. ARQ. Y CONST. ALBURA LTDA.

FPB/fpb

Parque Industrial Lote A-2 San Fernando, e-mail: constructora.albura.d@gmail.com

09/09/2026

NOMINA DE TRABAJADORES JULIO 2026

RUT	TRABAJADOR
[redacted]	ANGEL PATRICIO PONCE ESPINOZA
	FABIAN OCTAVIO ALBORNOZ DINAMARCA

CONTRATO DE TRABAJO

AFP CUPRUM/FONASA

En San Fernando, con fecha 22 de JULIO de 2026, entre la firma INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LTDA., Cédula Nacional de Identidad Nº 77.947.259-0, Representada por Don FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA, RUT. 17.258.721-6 ambos con domicilio en Parque Industrial Lote A-2, comuna de San Fernando, y Don FABIAN OCTAVIO ALBORNOZ DINAMARCA, de nacionalidad CHILENA, estado civil SOLTERO, nacido el 04 de JUNIO de 1982, R.U.T. [redacted] se celebra el siguiente contrato para Faena Determinada.

PRIMERO.- El trabajador se compromete a ejecutar las siguientes labores: PROFESIONAL DE OBRA, realizando labores tales como:

Realización de trámites y actualización de datos ante organismo públicos, informes de gastos, archivo de documentos, cubicación de proyectos, inspección mito, autocontrol y firmas, preparación de presupuestos, cotizaciones, supervisión de obras, carta Gantt, dibujos autocad, presentación en licitaciones verificaciones de materiales en bodegas, informes que se soliciten según su gestión, emisión de órdenes de compra, atención de proveedores y todas aquellas actividades inherentes a su cargo

Tareas serán realizadas, en la sección, **CONSTRUCCION VEREDAS POBLACION PARAGUAY,** del establecimiento denominado INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA, ubicada **CALLE PABLO RUBIO S/N** en la comuna de **REQUINOA**. Pudiendo ser trasladado a otro domicilio, o labores similares, dentro de la ciudad o comuna, por causa justificada, sin ello importe menoscabo para el trabajador.

SEGUNDO.- El Trabajo se realizara por MES, Pactándose una Jornada de 42 hrs. Semanales:

Lunes a Jueves: 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 18:00 hrs.
Viernes : 08:00 a 14:00 hrs.

TERCERO.- El empleador se compromete a remunerar al trabajador mensualmente en la forma que se indica:

Sueldo base mensual : 2.500.000.- (Dos Millones Quinientos mil pesos).-
Gratificación Legal : 25% de lo ganado con tope de 4,75 ingresos mínimos.-

CUARTO.- El presente contrato durará: **HASTA EL TERMINO DE FAENA** y podrá ponérsele término cuando concurra para ello las causales de caducidad o término establecidas en el Código del Trabajo y/o Reglamento Interno

QUINTO.- Se deja constancia que don, FABIAN OCTAVIO ALBORNOZ DINAMARCA ingresó al servicio el 22 de JULIO de 2026.

SEXTO.- Se entienden incorporadas al presente contrato todas las disposiciones legales que se dicten con posterioridad a la fecha de suscripción y que tengan relación con él.

SEPTIMO.- En el acto, el trabajador declara recibir una copia del Reglamento Interno, haberlo leído y comprendido, y se compromete a cumplirlo cabalmente asume y entiende que las presentes exigencias definidas en el reglamento interno son imposiciones de la Constructora y que el no cumplimiento de tales exigencias puede originar el termino del presente Contrato en las condiciones descritas en el articulo 160 N° 7 del código del Trabajo.

Para constancia firman las partes el presente contrato en tres ejemplares, quedando uno de ellos en poder de cada parte.

Ingeniería, Arquitectura y Construcción
ALBURA LIMITADA
77.947.259-0

FIRMA DEL TRABAJADOR
FABIAN OCTAVIO ALBORNOZ DINAMARCA
R.U.T [redacted]

FIRMA DEL EMPLEADOR
R.U.T. 77.947.259-0
R.L FELIPE PEREIRA BECERRA
[redacted]

CONTRATO DE TRABAJO

AFP PLAN VITAL/FONASA

En San Fernando, con fecha 29 de JULIO de 2026, entre la firma INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LTDA., Cédula Nacional de Identidad Nº 77.947.259-0, con domicilio en Parque Industrial Lote A-2, comuna de San Fernando, y Don ANGEL PATRICIO PONCE ESPINOZA de nacionalidad CHILENA, estado civil SOLTERO, nacido el 09 de FEBRERO de 1970, R.U.T. [redacted], se celebra el siguiente contrato para Faena Determinada.

PRIMERO.- El trabajador se compromete a ejecutar las siguientes labores de **MAESTRO** y realizara las labores determinadas que se especifican:

Saca niveles y realizada trazados de elementos geométricos colocación de base, estabilizado, colocación de moldajes para hormigón y afinamiento de hormigón, cortes de hormigón y sellos asalticos y pegado de soleras.

Tareas serán realizadas, en la sección, **CONSTRUCCION VEREDAS POBLACION PARAGUAY,** del establecimiento denominado INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA, ubicada **CALLE PABLO RUBIO S/N** en la comuna de **REQUINOA**. Pudiendo ser trasladado a otro domicilio, o labores similares, dentro de la ciudad o comuna, por causa justificada, sin ello importe menoscabo para el trabajador.

SEGUNDO.- El Trabajo se realizara por MES, Pactándose una Jornada de 42 hrs. Semanales:

Lunes a Jueves:		08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 18:00 hrs.
Viernes	:	08:00 a 14:00 hrs.

TERCERO.- El empleador se compromete a remunerar al trabajador mensualmente en la forma que se indica:

Sueldo Base	:	553.553.- (Quinientos Cincuenta y Tres mil Quinientos cincuenta y tres pesos).-
Gratificación Legal	:	25% de lo ganado, con tope, según Ley de 4,75 Ingresos Mínimos.

CUARTO.- El presente contrato durará: **HASTA EL TERMINO DE CONSTRUCCION VEREDAS CALLE PABLO RUBIO, COMUNA DE REQUINOA,** podrá ponérsele término cuando concurra para ello las causales de caducidad o término establecidas en el Código del Trabajo y/o Reglamento Interno

QUINTO.- Se deja constancia que don, ANGEL PATRICIO PONCE ESPINOZA ingresó al servicio el 29 de JULIO de 2026.

SEXTO.- Se entienden incorporadas al presente contrato todas las disposiciones legales que se dicten con posterioridad a la fecha de suscripción y que tengan relación con él.

SEPTIMO.- En el acto, el trabajador declara recibir una copia del Reglamento Interno, haberlo leído y comprendido, y se compromete a cumplirlo cabalmente asume y entiende que las presentes exigencias definidas en el reglamento interno son imposiciones de la Constructora y que el no cumplimiento de tales exigencias puede originar el termino del presente Contrato en las condiciones descritas en el artículo 160 N° 7 del código del Trabajo.

Para constancia firman las partes el presente contrato en tres ejemplares, quedando uno de ellos en poder de cada parte.

Ingeniería, Arquitectura y Construcción
ALBURA LIMITADA
77.947.259-0

FIRMA DEL TRABAJADOR
ANGEL PATRICIO PONCE ESPINOZA
R.U.T. : [redacted]

FIRMA DEL EMPLEADOR
R.U.T. 77.947.259-0
R.L. FELIPE PEREIRA BECERRA
RUT. [redacted]

GOBIERNO REGIONAL
REGIÓN DE O'HIGGINS

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

CARATULA ESTADO DE PAGO

ESTADO DE PAGO	N°1
FECHA	08/09/2026
MONTO	**$ 31.429.728**
AVANCE FINANCIERO	23,90%
AVANCE FISICO	23,90%

NOMBRE PROYECTO: REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY
CODIGO IDI (BIP):
ID LICITACIÓN: 3656-88-LP26
CONTRATISTA: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCCION ALBURA LIMITADA

DECRETO ADJUDICACION: N° 1502 FECHA 01/06/2026
FECHA INICIO DE OBRA: 24/06/2026 PLAZO 105 DIAS CORRIDOS
MODIFICACION DE PLAZO DECRETO N° DE AUMENTO
FECHA TERMINO DE OBRA: 06/10/2026

SUSPENSIÓN DE PLAZO: DECRETO N° 1857 DE 03/07/2026
INICIO SUSPENSIÓN DE OBRA: 26/06/2026

ACTIVACIÓN DE PLAZO: DECRETO N° 1951 DE 23/07/2026
NUEVA FECHA TERMINO DE OBRA: 31/10/2026

MONTO CONTRATO INICIAL (IVA INCLUIDO) $ 131.527.543
MODIFICACION MONTO DECRETO N° DE AUMENTO

MONTO TOTAL CONTRATO (IVA INCLUIDO) **$ 131.527.543**

MONTO TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS HASTA LA FECHA INCLUIDO EL PRESENTE ESTADO DE PAGO	$	31.429.728
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO IVA INCLUIDO	**$**	**31.429.728**
RETENCIONES	$	3.142.973
MULTAS ESTADO DE PAGO		
LIQUIDO A PAGAR	**$**	**28.286.755**

RESUMEN E.P.

N° ESTADO DE PAGO	*MONTO*	*MULTAS*	*RETENCIONES*	*$*
1	*$ 31.429.728*		*$ 3.142.973*	*$ 28.286.755*
TOTAL	***$ 31.429.728***	***$ -***	***$ 3.142.973***	***$ 28.286.755***

Inganieria, Arquitectura y Construcción
ALBURA LIMITADA
77.947.259-0

FIRMA Y NOMBRE CONTRATISTA

FIRMA , NOMBRE Y TIMBRE INSPECTOR TECNICO DE OBRA

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

FORMATO N°3

PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDA

	I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
	CUBICACION Y PRESUPUESTO OFICIAL
PROYECTO:	REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY
UBICACIÓN:	POBLACION PARAGUAY
COMUNA:	REQUÍNOA

CUBICACIÓN Y PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	PRECIO	TOTAL	ESTADO DE PAGO N°1				
						CANT	% AVANCE ANTERIOR	% AVANCE ACTUAL	% AVANCE ACUMULADO	Total a pago / partida
1	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS									
1.1	**OBRAS PROVISIONALES**									
1.1.1	Instalación de faena	uni	1,0	$ 2.400.000	$ 2.400.000		0%	0%	0%	$ -
1.1.2	Señalización provisoria	uni	1,0	$ 1.500.000	$ 1.500.000		0%	0%	0%	$ -
1.1.3	Letrero indicativo de obra	uni	1,0	$ 550.000	$ 550.000	1,00	0%	100%	0%	$ 550.000
1.2	**OBRAS PRELIMINARES**									
1.2.1	Destronque	uni	7,0	$ 36.000	$ 252.000		0%	0%	0%	$ -
2	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y ACCESOS VEHICULRES									
2.1	**OBRAS DE PREPARACIÓN DE TERRENO**									
2.1.1	Demolición de aceras	m2	1790,00	$ 6.000	$ 10.740.000	520,00	0%	29%	0%	$ 3.120.000
2.1.2	Excavaciones	m3	124,00	$ 25.000	$ 3.100.000	35,00	0%	28%	0%	$ 875.000
2.1.3	Transporte a botadero	m3	303,00	$ 20.000	$ 6.060.000	85,00	0%	28%	0%	$ 1.700.000
2.2	**REPOSICIÓN DE ACERAS Y ACCESOS VEHICULARES**									
2.2.1	Base estabilizada e=0,05 mt (aceras de HC e =0,07 mt)	m3	58,40	$ 25.000	$ 1.460.000	14,00	0%	24%	0%	$ 350.000
2.2.2	Base estabilizada e=0,15 mt (aceras de HC e=0,12mt)	m3	254,31	$ 25.000	$ 6.357.750	51,00	0%	20%	0%	$ 1.275.000
2.2.3	Moldajes de madera	ml	825,13	$ 2.200	$ 1.815.286	190,00	0%	23%	0%	$ 418.000
2.2.4	Aceras de HC e=0,07 mt (circulación peatonal)	m2	1168,00	$ 21.800	$ 25.462.400	269,00	0%	23%	0%	$ 5.864.200
2.2.5	Aceras de HC e=0,12 mt (acceso vehicular y circulación peatonal)	m2	1097,00	$ 23.800	$ 26.108.600	307,00	0%	28%	0%	$ 7.306.600
2.3	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERAS**									
2.3.1	Reposición de soleras Tipo A	ml	26,85	$ 25.000	$ 671.250		0%	0%	0%	$ -
2.3.2	Reposición de soleras Tipo C	ml	27,00	$ 15.000	$ 405.000		0%	0%	0%	$ -
2.4	**CONSTRUCCIÓN DE RAMPA**									
2.4.1	Rebaje de solera	ml	33,50	$ 25.000	$ 837.500		0%	0%	0%	$ -
2.4.2	Rampa	m2	47,90	$ 22.000	$ 1.053.800	5,00	0%	10%	0%	$ 110.000
2.4.3	Base para instalación BMV	m2	18,24	$ 5.000	$ 91.200	2,00	0%	11%	0%	$ 10.000
2.4.4	BMV Tipo Minvu 0 color amarillo	m2	18,24	$ 35.000	$ 638.400	2,00	0%	11%	0%	$ 70.000
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS									
3.1	Demarcación de Soleras	ml	70,00	$ 10.400	$ 728.000		0%	0%	0%	$ -
3.2	Aseo y entrega	uni	1,00	$ 365.000	$ 365.000		0%	0%	0%	$ -
SUBTOTAL					**$ 90.596.186**					**$ 21.648.800**
GASTOS GENERALES		%	10		$ 9.059.619					$ 2.164.880
UTILIDADES		%	12		$ 10.871.542					$ 2.597.856
SUBTOTAL OBRAS A EJECUTAR+GASTOS GENERALES+UTILIDADES					**$ 110.527.347**	$ -		$ -		**$ 26.411.536**
IVA		%	19		$ 21.000.196					$ 5.018.192
TOTAL					**$ 131.527.543**	$ -		$ -		**$ 31.429.728**

FIRMA DEL CONTRATISTA

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Ingeniería, Arquitectura y Construcción
ALBURA LIMITADA
77.947.259-0

FIRMA DEL ITO MUNICIPAL

UNIDAD TECNICA I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DIRECCION DE OBRAS I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

FIRMA DOM

INFORME DE INTERVENCIONES REALIZADAS

DIA	FECHA	INTERVENCIONES REALIZADAS
1	21.07.2025	LLUVIAS
2	22.07.2026	SE REALIZA LA INSTALACION DEL LETRERO DE OBRA
3	23.07.2026	SE RECIBE MATERIALES Y SE REALIZA INSTALACION DE FAENA
4	24.07.2026	SE TRAZA Y SE RATIFICAN NIVELES TOPOGRAFICOS PARA INTERVENCION DE LA VEREDA SE DETERMINA LA PARTIDA EN PASAJE GUARANI
5	27.07.2026	LLUVIAS
6	28.07.2026	LLUVIAS
7	29.07.2026	SE INICIA DEMOLICION EN SECTOR PASAJE GUARANI
8	30.07.2026	SE REALIZA DEMOLICION EN SECTOR PASAJE GUARANI Y PABLO RUBIO ENTRE PSJ ASUNCION Y PSJ GUARANI LADO ORIENTE
9	31.07.2026	LLUVIAS
10	03.08.2026	LLUVIAS
11	04.08.2026	SE REALIZA DEMOLICION EN SECTOR PABLO RUBIO ENTRE ASUNCION Y GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE
12	05.08.2026	SE SIGUE CON LA DEMOLICION EN SECTOR PABLO RUBIO ENTRE ASUNCION Y GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE
13	06.08.2026	SE REALIZA COMPACTACION , INSTALACION DE MOLDAJES Y BASE ESTABILIZADA SECTOR PABLO RUBIO ENTRE ASUNCION Y GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE
14	07.08.2026	SE REALIZA LA COLOCACION DE HORMIGON EN SECTOR DE PABLO RUBIO ENTRE ASUNCION Y GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE.
15	10.08.2026	SE REALIZAN LOS CORTES Y SE INSTALA MOLDAJES SECTOR ESQUINA PABLO RUBIO CON GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE
16	11.08.2026	SE REALIZA COMPACTACION , INSTALACION DE MOLDAJES Y BASE ESTABILIZADA SECTOR PABLO RUBIO ESQUINA GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE, PASAJE GUARANI Y PABLO RUBIO ENTRE PASAJE GUARANI Y PASAJE ASUNCION LADO ORIENTE
17	12.08.2026	SE REALIZA LA COLOCACION DE HORMIGON EN SECTOR DE PABLO RUBIO ESQUINA GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE , PASAJE GUARANI Y PABLO RUBIO ENTRE PSJ ASUNCION Y PASAJE GUARANI LADO ORIENTE
18	13.08.2026	SE REALIZAN LOS CORTES Y SE INSTALA MOLDAJES SECTOR ESQUINA PABLO RUBIO CON GABRIELA MISTRAL
19	14.08.2026	SE REALIZA DEMOLICION EN SECTOR PABLO RUBIO ENTRE ASUNCION Y GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE
20	17.08.2026	SE REALIZA COMPACTACION , INSTALACION DE MOLDAJES Y BASE ESTABILIZADA SECTOR PABLO RUBIO ESQUINA PSJ ASUNCION LADO PONIENTE
21	18.08.2026	SE REALIZA LA COLOCACION DE HORMIGON EN SECTOR DE PABLO RUBIO ESQUINA PSJ ASUNCION LADO PONIENTE
22	19.08.2026	SE REALIZA COMPACTACION , INSTALACION DE MOLDAJES Y BASE ESTABILIZADA SECTOR PABLO RUBIO ESQUINA PSJ JUAQUIN CONTRERAS LADO PONIENTE Y PASAJE GUARANI ENTRADAS VEHICULAR
23	20.08.2026	SE REALIZA LA COLOCACION DE HORMIGON EN SECTOR DE PABLO RUBIO ESQUINA PSJ JUAQUIN CONTRERAS LADO PONIENTE Y PASAJE GUARANI
24	21.08.2026	SE REALIZAN LOS CORTES Y SE INSTALA MOLDAJES Y BASE ESTABILIZADA SECTOR PABLO RUBIO ESQUINA PSJ JUAQUIN CONTRERAS LADO PONIENTE
25	24.08.2026	SE REALIZA LA COLOCACION DE HORMIGON EN SECTOR DE PABLO RUBIO ESQUINA JUAQUIN CONTRERAS LADO PONIENTE
26	25.08.2026	LLUVIAS
27	26.08.2026	LLUVIAS
28	27.08.2026	SE REALIZA DEMOLICION EN SECTOR PABLO RUBIO ENTRE ASUNCION Y GABRIELA MISTRAL LADO ORIENTE
29	28.08.2026	SE REALIZA COMPACTACION , INSTALACION DE MOLDAJES Y BASE ESTABILIZADA SECTOR PABLO RUBIO ENTRE ASUNCION Y GABRIELA MISTRAL LADO ORIENTE

INGENIERIA, ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA
Giro: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCTORA
PARQUE INDUSTRIAL LT A- 2- SAN FERNANDO
eMail : consultora.omega2021@gmail.com Telefono : TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.947.259- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº48

S.I.I. - SAN FERNANDO

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO


Fecha Emision: 07 de Septiembre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESTADO DE PAGO N°1 REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY, COMUNA DE REQUINOA ID 3656-88-LP26	1	23.770.382			23.770.382

Referencias:
- Orden Compra N° 3656-349-SE26 del 2026-06-19

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.770.382
I.V.A. 19%	$	4.516.373
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	28.286.755



Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

INGENIERIA, ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA
Giro: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCTORA
PARQUE INDUSTRIAL LT A- 2- SAN FERNANDO
eMail : consultora.omega2021@gmail.com Telefono : TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.947.259- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº48

S.I.I. - SAN FERNANDO

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Septiembre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESTADO DE PAGO N°1 REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY, COMUNA DE REQUINOA ID 3656-88-LP26	1	23.770.382			23.770.382

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-349-SE26 del 2026-06-19

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.770.382
I.V.A. 19%	$	4.516.373
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	28.286.755

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089480

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
07-08-2026	337925	615623	2945079		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	8	98027
	INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:			
	REQUINOA FABIAN ALBORNOZ 981784066			

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
9:00	8:28	08/45	09/10	09/15	09/30	09/53	10/20	

CONTROL INTERNO		AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	DFRW93	Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	3224-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	BRAUULIO HUMBERTO / 76084154-4		
Operador:	LGALARCE		
Transportista		Nombre y Firma Op.Mixer / Nombre y Firma Cliente	

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: FABIAN ALBORNOZ

RUT: FECHA:

RECINTO: FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

CEDIBLE CON SU FACTURA

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 628 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089486

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
07-08-2026	337929	615888	2945379		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	8	98027

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

REQUINOA FABIAN ALBORNOZ 981784066

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
11:00	10:29	1054	1114	1116	1154	1200	1207	

CONTROL INTERNO			AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	ZP3806		Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	1333-X			Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	OLMOS FERNANDO	76084154-4		
Operador:	LGALARCE			
Transportista			Nombre y Firma Op.Mixer / Nombre y Firma Cliente	

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: Fran's Rivas

RUT: FECHA:

RECINTO: FIRMA:

(El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4°, y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s))

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

CEDIBLE CON SU FACTURA

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089565

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
12-08-2026	340953	619379	2945302		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	CALLE PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11004798	HORMIGON GN20.0(10)20/08	m3	7	83732

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

FELIPE PEREIRA

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
9:00	8:31	8:35	9:18	9:40	10:40	10:48		

CONTROL INTERNO		AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	LRTP23	Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	2670-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de Regada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos limites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	BARRALES MORAGA GE 76084154-4		
Operador:	LGALARCE	Nombre y Firma Op.Mixer	Nombre y Firma Cliente
Transportista			

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el homrigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: FELIPE PEREIRA

RUT: 17.287.446 FECHA: 12/08/2026

RECINTO: REQUINOA FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE CON SU FACTURA

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089573

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
12-08-2026	340955	619718	2945311		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	CALLE PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	7	98027

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

REQUINOA FELIPE PEREIRA

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
11:30	11:01	11:13	11:45	11:50	12:25	12:30	13	

CONTROL INTERNO		AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	DFRW93	Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	3224-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	BRAULIO HUMBERTO /76084154-4		
Operador:	LGALARCE	Nombre y Firma Op.Mixer	Nombre y Firma Cliente
Transportista			

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: FELIPE PEREIRA

RUT: 17.282.721-6 FECHA: 12/08/2026

RECINTO: REQUINOA FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 3° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE CON SU FACTURA

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089665

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
18-08-2026	343704	623783	476095		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	CALLE PABLO RUBIO POBLACION PARAGUA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	8	98027

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

FABIAN ALBORNOZ 981784066

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
9:00	8:34							

CONTROL INTERNO		AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	HTBP39	Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	1314-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	SILVA MIGUEL ANGEL 76084154-4		
Operador:	LGALARCE		
Transportista		Nombre y Firma Op.Mixer / Nombre y Firma Cliente	

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente: recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE:

RUT: FECHA:

RECINTO: FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

CEDIBLE CON SU FACTURA

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089677

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
18-08-2026	343708	624116	476140		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	CALLE PABLO RUBIO POBLACION PARAGUA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	8	98027

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

FABIAN ALBORNOZ 981784066

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
12:00	11:25	11:45	12:05	12:10	12:45	12:55	12:55	13:20

CONTROL INTERNO		AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	HBXR69	Adiciona Agua SI ( ) NO ( )	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	3233-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	76084154-4		
Operador:	LGALARCE		
Transportista		Nombre y Firma Op.Mixer / Nombre y Firma Cliente	

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: FELIPE FIGUEROA.

RUT: 17.278.721-6 FECHA: 18/08/2026

RECINTO: EQUILOS FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 3° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE CON SU FACTURA

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089730

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
20-08-2026	344569	626268	476222		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	7	98027

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

FABIAN ALBORNOZ 981784066

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
9:00	8:23	08:47	09:04	09:28	10:03		10:23	11:46

CONTROL INTERNO	AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente: XH5083	Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°: 1134-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.: MANRIQUEZ BARRIA MA 76084154-4		
Operador: LGALARCE	Nombre y Firma Op.Mixer	Nombre y Firma Cliente
Transportista		

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: Erika Alvarez

RUT: FECHA:

RECINTO: FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4°, y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

CEDIBLE CON SU FACTURA

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089830

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
24-08-2026	347054	629676	476317		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	CALLE PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	7	98027

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

FABIAN ALBORNOZ 981784066

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
11:00	10:52	11:05	11:25	11:30	12:10	12:25		

CONTROL INTERNO		AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	WB1968	Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	1137-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	CASTILLO EDUARDO 76084154-4		
Operador:	LGALARCE	Nombre y Firma Op.Mixer	Nombre y Firma Cliente
Transportista			

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: [illegible] RECEPCIONA

RUT: 18.258.[illegible]-6 FECHA: 24/08/2026

RECINTO: REQUINOA FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

CEDIBLE CON SU FACTURA

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089979

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
01-09-2026	351372	636421	476439		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	CALLE PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	7	98027

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

FABIAN ALBORNOZ 981784066

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
9:00	8:20	08:43	09:07	09:17	10:16		10:27	10:50

CONTROL INTERNO		AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	XH5083	Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	1134-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	MANRIQUEZ BARRIA MA 76084154-4		
Operador:	LGALARCE		
Transportista		Nombre y Firma Op.Mixer / Nombre y Firma Cliente	

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: Felix Reyes

RUT: 17.258.721-6 FECHA: 01/09/2026

RECINTO: Requinoa FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4°, y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE CON SU FACTURA

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089995

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
01-09-2026	351379	636855	476386		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	CALLE PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11004798	HORMIGON GN20.0(10)20/08	m3	7	83732

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

FABIAN ALBORNOZ 981784066

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
12:30	11:46	1205	1233	1235	1355	1405		

CONTROL INTERNO			AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO		MUESTRA N°
Patente:	WH7915		Adiciona Agua	SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	1135-X				Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	RIQUELME MARCELO	76084154-4	Nombre y Firma Op.Mixer	Nombre y Firma Cliente	
Operador:	LGALARCE				
Transportista					

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el homrigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE:

RUT: FECHA:

RECINTO: FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

CEDIBLE CON SU FACTURA

REGISTRO DE CALIDAD
Aréa Mecánica de Suelos
Método Nuclear para la determinación de la Densidad de Suelos
(Mèt. 8.502.1 Dic. 2003 M.C. V.8)

Cód.: F-S-11
Fecha: 28/01/19
N° Edición: 00
Pág 1 de 1

O.T.	242621	FECHA:	18-08-26	COD. DENSIMETRO:	122-01

Det. N°	Ubicación / lado / Kmp. / Sector	Capa N°	Prof. Controlada Cms.	Datos del Terreno			Ref. D.Min.	D.M.C.S D. Max.	Comp %
				D. C. H	H %	D. C. S.			
1	Acceso Vehicular Unifamiliar Calle Pablo Rubio F/casa 69	Base	15	2384	7,2	2224		2,24	99,3
	(Requinoa)								

Cont. Alburra Ltda
Suc = Rte De Verdos
Pdr. Paraguay
Requinoa

OT = 242621

18-8-26

Referencia N° OT	241946		

OBSERVACIONES:

Nombre y Firma Profesional Responsable de Obra

Mario Rojas
Responsable del Ensayo

V° B° Jefe de Area

	REGISTRO DE CALIDAD Aréa Mecánica de Suelos Método Nuclear para la determinación de la Densidad de Suelos (Mét. 8.502.1 Dic. 2003 M.C. V.8)	Cód. F-S-11 Fecha: 28/01/19 N° Edición: 00 Pág. 1 de 1

O.T.	242620	FECHA:	18-08-26	COD. DENSIMETRO:	122-01

Det. N°	Ubicacion / lado / Km. / Sector	Capa N°	Prof. Controlada Cms.	Datos del Terreno			Rel D.Min.	D.M.C.S D. Max	Comp. %
				D. C. H.	H %	D. C. S.			
1	Acceso Vehicular Unifamiliar Calle Pablo Rubio F/casa. 69	S/e	20	2271	8,7	2089	/	2,17	96,3
	(Requinoa)								

Referencia N° OT	241945		

OBSERVACIONES

Nombre y Firma Profesional
Responsable de Obra

Mario Rojas
Responsable del Ensayo

V° B° Jefe de Area

REGISTRO DE CALIDAD

Área hormigón y **Morteros**

I. Determinacion de la docilidad, Método de Asentamiento del cono Abrams. Nch 1019 EOf 2009. Determinación de la consistencia-Parte 3 Método del Asentamiento del cono Nch 2257/3 Of 96. **Extracción de muestras del Hormigón Fresco NCh171-2008**
Morteros-Confección de probetas en obra y determinación de la resistencia a compresión Nch 2261-2010
Hormigón-confección en obra y curado de probetas para ensayos de compresión, tracción por flexión y hendimiento NCh1017-2009

Cód.: F-H-3
Fecha: 02/10/24
Edición: 02

N° O.T.: 242107

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre **de la obra**
Ubicación de la obra
Nombre de la empresa
Solicitante Ensayo
Responsable **de obra**

EXTRACCIÓN DE MUESTRA

Fecha
N° identif. del cliente
Nombre Inspector obra
Volumen que representa el muestreo

Hora confección H° _
Hora de salida planta
Hora llegada **a la obra**
Hora descarga
Hora de muestreo
Hora de termino descarga

TIPO DE MUESTRAS	Tipo	Cantidad	N° Molde	EDAD DE ENSAYO Probeta	Dias
Cúbicas 15*15					
Cúbicas 20*20					
Cilíndricas 15*30					
Prismáticas 15*53	X	3		3	7
Prismáticas 4*16				2	28

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Cantidad de la Muestra Mayor a 30 lts (Hormigon)	Si	No
Hormigoneras estacionarias		
Camión Mezclador		X
Acopios		
Otros equipos de mezclado		
Muestra Compuesta		
Muestra Simple		X

M. compuesta: Cantidad de hormigón formada por dos o más porciones obtenida de una amasada.
M. simple: Cantidad de hormigón formada por una porción obtenida de una amasada.

DOCILIDAD - ASENTAMIENTO CONO DE ABRAMS **O CONO REDUCIDO**

Fecha
Hora obtención muestra
Hora inicio ensayo
Hora término ensayo
Valor Asentamiento de Cono : 6 Cms. (Hormigón) (Menor a 5 minutos desde la obtención de la muestra) (Menor a 2,5 minutos desde el inicio del ensayo) mm. (Mortero)

	SI	NO
* El hormigón moldeado sufre disgregaciones		X
* El hormigón moldeado carece de plasticidad y cohesión		X
* Incluinación superficie superior (< a 5 cm o repetir ensayo)		X

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Cantidad de la Muestra Mayor a 5 lts (Morteros)	Si	No
Mecanico		
No Mecanico		
METODO DE MUESTREO		
Pison		
Mesa Vibradora		

COD. CONO: 34.01
COD. REGLA: 03.02

PROCEDIMIENTO DE CURADO **PARA HORMIGÓN Y MORTEROS**

Curado Inicial 16 a 27°C	
a) Cubiertas con láminas de material impermeable y protegidas por sus lado con arena	X

Curado de probetas desmoldadas **21 a 25°C**	
a) Piscina de curado rengo temperatura	X

ANTECEDENTES DEL HORMIGON **Y MORTEROS**

Resistencia especificada
Nivel de confianza %
Ensayos(s) solicitados(s)
Volumen de amasada de H°
Procedencia de los áridos
Tipo de cemento

Elemento hormigonado (Proporcionado por cliente)
Ubicación del elemento Hormigonado (Proporcionado por cliente)
Ubicación del Muestreo (Responsabilidad del laboratorio)

Procedencia del H°

Fabricado en Obra	
Suministro Externo	X
Otros	

Comp. Muestras

Vibrada	X
Apisonada	

Temperaturas

	Corregida
Hormigón °C	12.3
Ambiente °C	7.7
Curado Inicial °c	

Fecha de retiro:
Hora:
Fecha de Recepción
Hora

*** Las muestras de hormigon y morteros seran transportadas en sus respectivos moldes para cuidar su condición y forma***

COD. VIBRADOR: 36.04 | COD. TERMOMETRO: 17.13 | COD. PISÓN:

SOLO PARA HORMIGONES **DE SUMINISTRO EXTERNO**

Proveedor
Guia N° 308780 Camión N° 322 Patente N° DTDW-39

Observaciones:

REGISTRO DE CALIDAD

Área hormigón y **Morteros**

I. Determinacion de la docilidad. Método de Asentamiento del cono Abrams. Nch 1019 EOf 2009. Determinación de la consistencia-Parte 3 Método del Asentamiento del cono Nch 2257/3 Of 96. **Extracción de muestras del Hormigón Fresco NCh171-2008**
Morteros-Confección de probetas en obra y determinación de la resistencia a compresión Nch 2261-2010
Hormigón-confección en obra y curado de probetas para ensayos de compresión, tracción por flexión y hendimiento NCh1017-2009

Cód.: F-H-3
Fecha: 02/10/24
Edición: 02
Pág. 1 de 1

N° O.T.: 242166

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre de la obra
Ubicación de la obra
Nombre de la empresa
Solicitante Ensayo
Responsable **de obra**

EXTRACCIÓN DE MUESTRA

Fecha: 07/06/24
N° identif. del cliente: 242166
Nombre Inspector obra
Volumen que representa el muestreo: 30 Lts

Hora confección H° _
Hora de salida planta: 08:10
Hora llegada **a la obra**
Hora descarga
Hora de muestreo: 09:25
Hora de termino descarga

TIPO DE MUESTRAS

	Tipo	Cantidad	N° Molde		
Cúbicas 15*15					
Cúbicas 20*20					
Cilíndricas 15*30	X	3	32	33	
Prismáticas 15*53					
Prismáticas 4*16					

EDAD DE ENSAYO

Probeta	Días
1	7
2	28

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

Cantidad de la Muestra Mayor a 30 lts (Hormigon)

Si		No	
Hormigoneras estacionarias			
Camión Mezclador			X
Acopios			
Otros equipos de mezclado			
Muestra Compuesta			
Muestra Simple			X

M. compuesta: Cantidad de hormigón formada por dos o más porciones obtenida de una amasada.
M. simple: Cantidad de hormigón formada por una porción obtenida de una amasada.

DOCILIDAD - ASENTAMIENTO CONO DE ABRAMS **O CONO REDUCIDO**

Fecha: 07/06/24
Hora obtención muestra: 08:45
Hora inicio ensayo: 08:50
(Menor a 5 minutos desde la obtención de la muestra)
Hora término ensayo: 08:55
(Menor a 2,5 minutos desde el inicio del ensayo)
Valor Asentamiento de Cono: 0.0 Cms. (Hormigón) ____ mm. (Mortero)

	SI	NO
* El hormigón moldeado sufre disgregaciones		X
* El hormigón moldeado carece de plasticidad y cohesión		X
* Incluinación superficie superior (< a 5 cm o repetir ensayo)		

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

Cantidad de la Muestra Mayor a 5 lts (Morteros)

Si		No	
Mecanico			
No Mecanico			

METODO DE MUESTREO

Pison			
Mesa Vibradora			

COD. CONO: 37.07
COD. REGLA: 03-21

PROCEDIMIENTO DE CURADO **PARA HORMIGÓN Y MORTEROS**

Curado Inicial 16 a 27°C

a) Cubiertas con láminas de material impermeable y protegidas por sus lado con arena: X

Curado de probetas desmoldadas **21 a 25°C**

a) Piscina de curado rengo temperatura: X

ANTECEDENTES DEL HORMIGÓN **Y MORTEROS**

Resistencia especificada: H-25 G-30 / H-30
Nivel de confianza %: 90%
Ensayos(s) solicitados(s): 7 y 28
Volumen de amasada de H°: 6 m3
Procedencia de los áridos
Tipo de cemento

Elemento hormigonado (Proporcionado por cliente): Radier
Ubicación del elemento Hormigonado (Proporcionado por cliente): Eje 1 a 10
Ubicación del Muestreo (Responsabilidad del laboratorio): Obra

Procedencia del H°

Fabricado en Obra	
Suministro Externo	2
Otros	

Comp. Muestras

Vibrada	2
Apisonada	

Temperaturas

	Corregida
Hormigón °C	15.3
Ambiente °C	17.4
Curado Inicial °c	

Fecha de retiro:
Hora:
Fecha de Recepcion:
Hora:


*** Las muestras de hormigon y morteros seran transportadas en sus respectivos moldes para cuidar su condición y forma***

COD. VIBRADOR:	36.04	COD. TERMOMETRO	44.23	COD. PISÓN:	

SOLO PARA HORMIGONES **DE SUMINISTRO EXTERNO**

Proveedor: Inacesa
Guía N°: 3065765
Camión N°: 3227
Patente N°: DTDW-33

Observaciones:

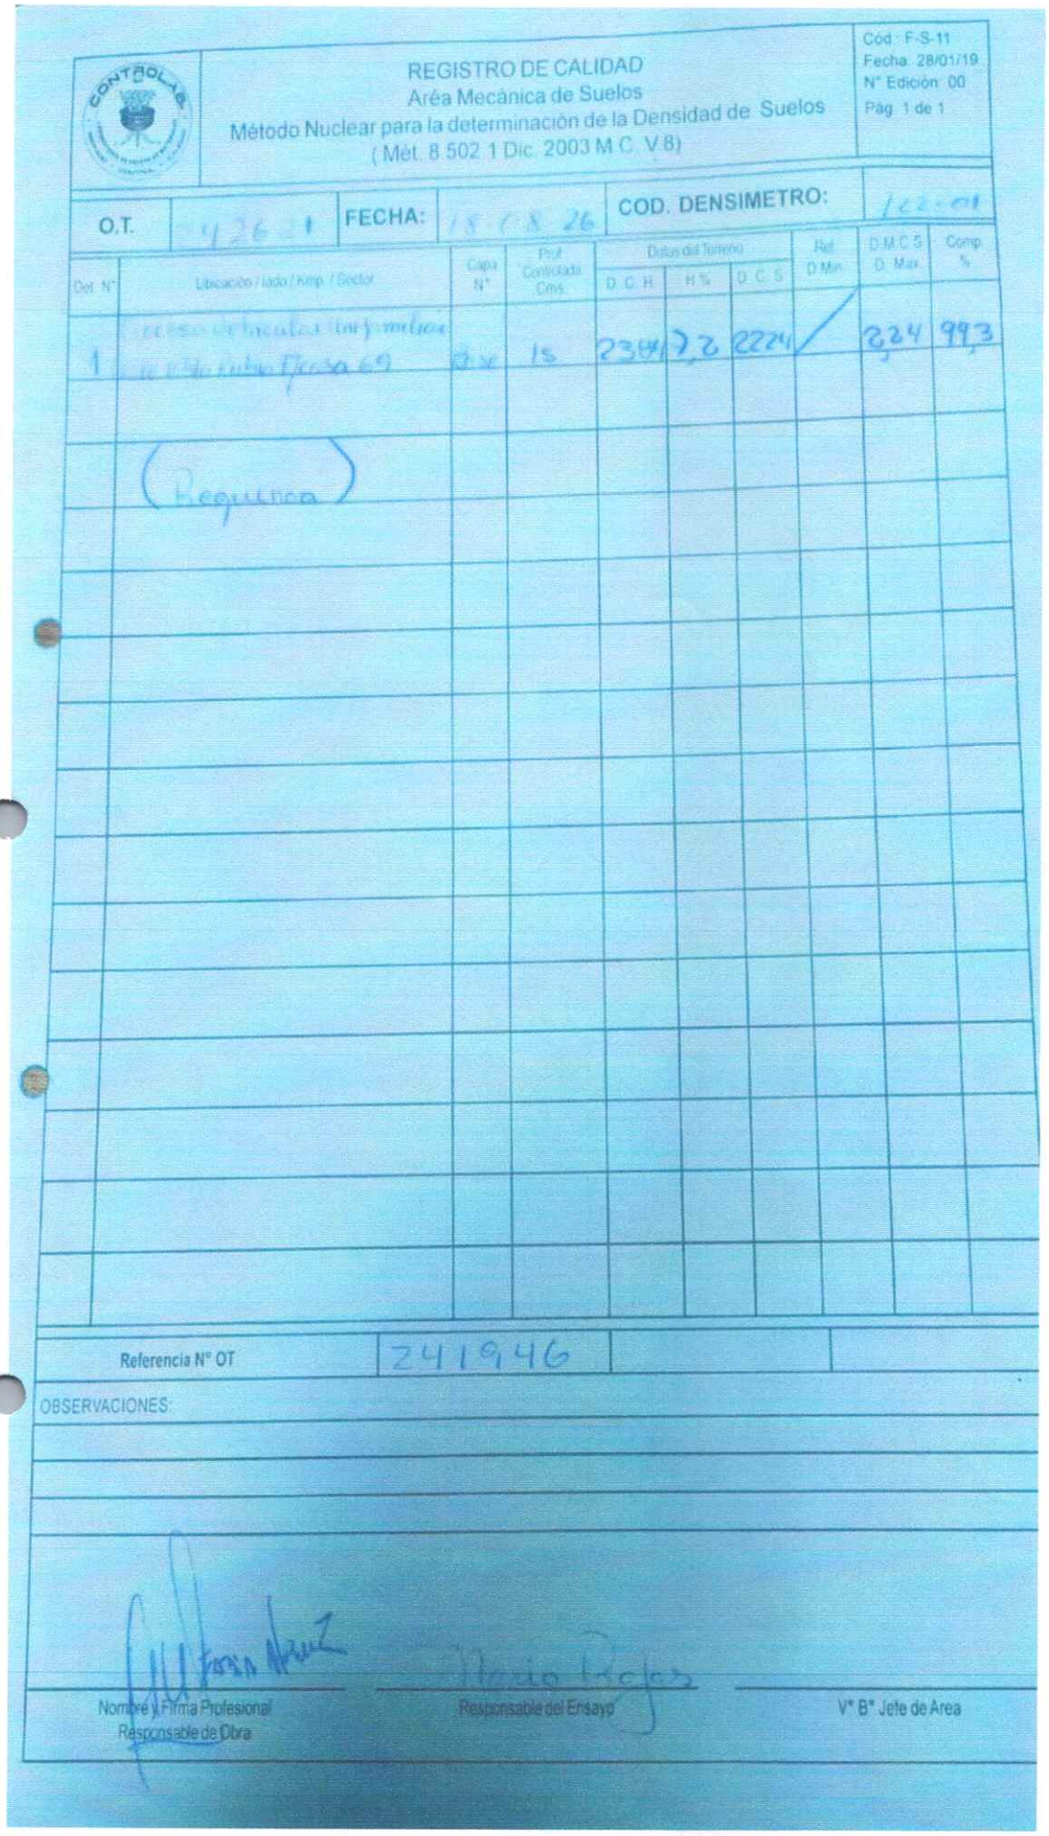

REGISTRO DE CALIDAD
Aréa Mecánica de Suelos
Método Nuclear para la determinación de la Densidad de Suelos
(Mét. 8.502.1 Dic. 2003 M.C. V.8)

Cód: F-S-11
Fecha: 28/01/19
N° Edición: 00
Pág. 1 de 1

O.T. 4261 FECHA: 18.08.26 COD. DENSIMETRO: 122-01

Det. N°	Ubicación / Lado / Km. / Sector	Capa N°	Prof. Controlada Cms.	Datos del Terreno D. C. H.	H %	D. C. S.	Rel. D Máx.	D.M.C.S. D. Max.	Comp. %
1	Acceso Circulación Informaciones Tubo Ejecución	2x	15	2364	7,2	2224	/	2,24	99,3
	(Requinoa)								

Referencia N° OT 241946

OBSERVACIONES:

Nombre y Firma Profesional Responsable de Obra

Responsable del Ensayo

V° B° Jefe de Area

CERTIFICADO DISPOSICION PARA RELLENO SANITARIO DISPOSICION FINAL PARA ESCOMBROS Y RESIDUOS INERTES

En la ciudad de Rancagua 26/08/2026

Jaramillo Ulloa Servicios y Tecnología Limitada, RUT: 76.273.262-9, con dirección en Los Suspiros #3558, Parcela 37, Ruta H30, Camino Doñihue, Rancagua. Resolución Sanitaria N° 04360, de fecha 29/04/2015, modificación N° Folio 2006436613, de fecha 14/12/2020 y rectificación Resolución Exenta N° 5004 de fecha 21/12/2020, todas otorgadas por el SEREMI de Salud de la región del Libertador Bernardo O´Higgins, certifica que los residuos inertes han sido depositados en nuestro relleno sanitario para escombros.

GENERADOR DE RESIDUO.

Nombre:	*Ilustre Municipalidad de Requínoa.*
Rut:	*69.081.300-9*
Dirección:	*Comercio N° 121, Requinoa..*

ORIGEN DEL RESIDUO.

Obra:	*Reposición veredas en Población Paraguay, Requínoa.*
Dirección:	*Poblacion Paraguay, Requinoa.*
Cantidad:	*135 M³.*
Periodo:	*Agosto de 2026.*

EMPRESA TRANSPORTISTA.

Nombre:	*Ingenieria, Arquitectura y Construcción Albura Ltda.*
Rut:	*77.947.259-0*
Dirección:	*Parque Industrial Lote A2, San Fernando.*

VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO.

Numero de Certificado:	***617/2026***
N° de factura de servicio:	*Boletas de servicios.*
Código de verificación:	*5895354697*
N° de Copia:	*1 (JUST LTDA. no entrega copias digitales)*

Para verificar la validez del origen del certificado, contactar al correo karla.ahumada@justservicios.cl y/o gonzalo.herrera@justservicios.cl, entregando el código de verificación podrá comprobar que este certificado es verdadero y confirmar la información contenida en el documento.

GONZALO HERRERA P.
Gerente de Operaciones
JUST SERVICIOS

GONZALO HERRERA POBLETE.
GERENTE DE OPERACIONES.
JUST LIMITADA.

Fecha Emisión: **13-08-2026**

Hora Emisión: **08:30**

Nº Certificado: **2000/2026/19746974**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

Nombre o Razón Social	RUT		
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA	77.947.259-0		
Representante Legal	**RUT Representante Legal**		
FELIPE PEREIRA BECERRA	[redacted]		
Código Actividad Económica	**Correo Electrónico**	**Teléfono**	
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION	constructora.albura.d@gmail.com	995752265	
Región	**Comuna**		
REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	SAN FERNANDO		
Calle	**Número**	**Departamento**	
PARQUE INDUSTRIAL LT A- 2	0		

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razón Social	RUT		
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9		
Representante Legal	**RUT Representante Legal**		
WALDO VALDIVIA MONTECINOS	8.278.834-4		
Calle	**Número**	**Región**	**Comuna**
COMERCIO 121	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Según Contrato Civil	Modo Participación		
REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY	Contratista		
Tipo de Obra	**Empresa Principal**		
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		
Domicilio	**Número**	**Región**	**Comuna**
CALLE PABLO RUBIO	0	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

3 - Periodos

Objetivo del Certificado	Institución Recaudadora
Cursar estado de pago	Previred

3.1 - Periodo : Julio 2026

Trabajadores	**Vigentes** 2	**Despedidos** 0	
Cotizaciones Previsionales	**Pagadas** Si	**Adjunta Nomina** No	
Remuneraciones	**Pagadas** 2	**No Pagadas** 0	**Monto Informado** $127.231
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica
Indemnización por Año(s) de Sevicio	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica

4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY en el (los) periodo(s):

- Julio 2026

5 - Información Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.



María Begoña Inés Iglesias Danilla
Jefa Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

Nº Certificado: **2000/2026/19746974** Clave: **Jp85Gwb3**

Fecha Emisión: **13-08-2026**

Hora Emisión: **08:30**

N° Certificado: **2000/2026/19746974**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Julio 2026		
N°	**RUT**	**Nombre Trabajador**
1	[redacted]	Angel Patricio Ponce Espinoza
2		Fabian Octavio Albornoz Dinamarca
		Total Trabajadores 2

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

Fonasa

8X30HVA520 - NCLEWC3amK - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKK37 - WWYX1mh8Y6 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA6

NÚMERO DE SERIE: 2017260700830537

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	X	Declaración y No Pago		Pago Declaración Anterior		Pago Parcial de Declaración	
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	X	Empleador Público		Entidad Pagadora de Subsidios			
	Trabajador Independiente		Empleador Casa Particular		Independiente TGR			

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY)			
R.U.T: 77.947.259-0			
Dirección: PABLO RUBIO		N°: 0	Depto:
Comuna: REQUÍNOA	Ciudad: REQUINOA	Región: VI Región	
Teléfono: 995752265	Casilla:	Correo electrónico: constructora.albura.d@gmail.com	
Código Actividad Económica: 439000			
Nombre Repr. Legal: FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA			
R.U.T. Repr [redacted]			
Nombre Caja Compensación: Los Andes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN $	127.231

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL [ ]		RETROACTIVO [ ]	
07 / 2026				
Mes Año	Mes Año DESDE	Mes Año HASTA	Mes Año DESDE	Mes Año HASTA

Tasa de Cotización		7%	X	2.8%
Modalidad de Pago	X	Electrónico		Mixto

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	3.563
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA	=	3.563
Compensación Asignación Familiar	-	0
MONTO PAGADO	=	3.563

N° de Afiliados	2
N° de Líneas de Detalles	2
N° Hojas Anexas	1

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30HVA520 - NCLEWC3amK - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKK37 - WWYX1mh8Y6 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA6

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017260700830537

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA

RUT 77.947.259-0

PERIODO DE REMUNERACIÓN 07 (MES) 2026 (AÑO)

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones																
N°	R.U.T C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN $	COTIZACIÓN 7% ó 2,8% EN $	* Ccd. Mov.	Movimiento del personal					
										FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	[redacted]	ALBORNOZ	DINAMARCA	FABIAN OCTAVIO	1	AFP	104.166	2.917	7	31	07	2026			
2		PONCE	ESPINOZA	ANGEL PATRICIO	1	AFP	23.065	646	7	31	07	2026			

	Renta Imponible	Cotiz Obligatoria
TOTAL PÁGINA	127.231	3.563
TOTAL ACUMULADO	127.231	3.563

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

*** CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL**

0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios(Licencia médica)	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

AFP Cuprum

Número de Folio: 2001202607152407

8X3ZNC4hT2 - X2T2WC3am4 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKEX5 - WGL51mh8Y6 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hAK

Identificación del Empleador: Empresa					
Nombre o Razón Social					RUT
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY)					77.947.259-0
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
PABLO RUBIO 0	REQUÍNOA	REQUINOA	VI Región	995752265	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Autorizo notificación electrónica *	Correo Electrónico	Cód. Actividad Económica	N° Trab. Dependientes
FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA	[redacted]	[X] SI [ ] NO	constructora.albura.d@gmail.com	439000	5

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	07/2026	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	12/08/2026

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	104.166	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	104.166
Cotización Obligatoria	12.021
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	2.083
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Cuprum	14.104

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	104.166	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	3.125
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	3.125

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/08/2026
3:43 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

* Esta autorización habilita notificar por correo electrónico las demandas de cobranza judicial de cotizaciones previsionales adeudadas, conforme a las modificaciones introducidas a la Ley N° 17.322 , con los mismos efectos legales de una notificación válidamente practicada.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Cuprum

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 07/2026

Número de Folio: 2001202607152407

8X3ZNC4hT2 - X2T2WC3am4 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKEX5 - WGL51mh8Y6 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hAK

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
[redacted]	ALBORNOZ DINAMARCA FABIAN OCTAVIO	104.166	12.021	2.083	0		0	0	104.166	0	3.125	6	31/07/2026	
TOTALES GENERALES		104.166	12.021	2.083	0		0	0	104.166	0	3.125			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

AFP PlanVital

Número de Folio: 2004202607274014

8X3ZM0a1d6 - 5LAMWC3am5 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKXP8 - WW4m1mh8Y7 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA8

Identificación del Empleador: Empresa					
Nombre o Razón Social					RUT
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY)					77.947.259-0
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
PABLO RUBIO 0	REQUÍNOA	REQUINOA	VI Región	995752265	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Autorizo notificación electrónica *	Correo Electrónico	Cód. Actividad Económica	N° Trab. Dependientes
FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA	[redacted]	[X] SI [ ] NO	constructora.albura.d@gmail.com	439000	5

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	07/2026	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	12/08/2026

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	23.065	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	23.065
Cotización Obligatoria	2.597
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	461
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP PlanVital	3.058

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	23.065	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	692
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	692

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

* Esta autorización habilita notificar por correo electrónico las demandas de cobranza judicial de cotizaciones previsionales adeudadas, conforme a las modificaciones introducidas a la Ley N° 17.322 , con los mismos efectos legales de una notificación válidamente practicada.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP PlanVital

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 07/2026

Número de Folio: 2004202607274014

8X3ZM0a1d6 - 5LAMWC3am5 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKXP8 - WW4m1mh8Y7 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA8

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
[redacted]	PONCE ESPINOZA ANGEL PATRICIO	23.065	2.597	461	0		0	0	23.065	0	692	6	31/07/2026	
TOTALES GENERALES		23.065	2.597	461	0		0	0	23.065	0	692			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Andes

Número de Folio: 2061202607103805

8X3L9UNGg5 - E20eWC3am0 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKHG1 - WhdA1mh8Y8 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hAK

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY)		SI	77.947.259-0	439000
Dirección	**Comuna**	**Ciudad**	**Región**	**Teléfono**
PABLO RUBIO 0	REQUÍNOA	REQUINOA	VI Región	995752265
Nombre Representante Legal		**RUT Representante Legal**	**Cambio en el Representante Legal**	
FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA		[redacted]	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros	
Detalle	**Valores($)**
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	5.344
ASIGNACIÓN FAMILIAR	0
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0
COTIZACIÓN - REBAJAS	5.344
Resumen de Productos	
CREDITOS PERSONALES	0
CONVENIOS DENTALES	0
LEASING	0
SEGUROS DE VIDA	0
OTROS	0
TOTAL PRODUCTOS	0
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Andes	5.344

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	**Gratificaciones**	**Desde**	**Hasta**
X			

Periodo	Código Participante
Julio 2026	
N° de Afiliados Informados	**N° de Declaración**
2	

Pago Electrónico
12/08/2026
3:43 PM
PREVIRED

Esteban Segura R.
Gerente General

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Andes

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2026

Número de Folio: 206120260710380 5

8X3L9UNGg5 - E20eWC3am0 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKHG1 - WhdA1mh8Y8 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hAK

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
			No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas										
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	Remuneración	Cotización 4,2%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.	Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
[redacted]	ALBORNOZ DINAMARCA FABIAN OCTAVIO	0	104.166	4.375	1	0	0	0	0	D	0	0	1	31/07/2026		
	PONCE ESPINOZA ANGEL PATRICIO	0	23.065	969	1	0	0	0	0	D	0	0	1	31/07/2026		
	TOTALES GENERALES	$0	$127.231	$5.344		0	0	0	$0		$0	$0				

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Número de Folio: 2080202607157830

8X38We8U25 - XZ9mWC3am3 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKHAK - W1HK1mh8Y1 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA1

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY)		constructora.albura.d@gmail.com	77.947.259-0	439000
Dirección	**Comuna**	**Ciudad**	**Región**	**Teléfono**
PABLO RUBIO 0	REQUÍNOA	REQUINOA	VI Región	995752265
Nombre Representante Legal		**RUT Representante Legal**	**Cambio en el Representante Legal**	
FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA		[redacted]	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	**Porcentaje**
TASA COTIZACIÓN	3,48%
Detalle	**Valores($)**
TOTAL REMUNERACIONES	127.231
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	4.428

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	**Gratificaciones**	**Desde**	**Hasta**
X			

Periodo	N° Contrato
Julio 2026	
N° de Afiliados Informados	**N° de Declaración**
2	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2026

Número de Folio: 2080202607157830

8X38We8U25 - XZ9mWC3am3 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKHAK - W1HK1mh8Y1 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA1

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
[redacted]	ALBORNOZ	DINAMARCA	FABIAN OCTAVIO	104.166	3.625	20	31/07/2026	
	PONCE	ESPINOZA	ANGEL PATRICIO	23.065	803	20	31/07/2026	

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic.Médica por enfermedad o acc.laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 12:Reliquidación, premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

FORMULARIO DE COTIZACIONES PREVISIONALES – SEGURO SOCIAL PREVISIONAL

Seguro Social

Número de Folio: 2006260701047014

8X30A48Nm2 - gHdmWC3am8 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKXA3 - W3W01mh8Y9 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA7

Identificación del Empleador: Empresa					
Nombre o Razón Social					RUT
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY)					77.947.259-0
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
PABLO RUBIO 0	REQUÍNOA	REQUINOA	VI Región	995752265	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Autorizo notificación electrónica *	Correo Electrónico	Cód Actividad Económica	N° Trab. Dependientes
FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA	[redacted]	[X] SI [ ] NO	constructora.albura.d@gmail.com	439000	5

[X] Pago en Plazo [ ] Declaración y no Pago [ ] Pago por Ley Bustos [ ] Pago Atrasado

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN $	$127.231
RESUMEN COTIZACIONES SEGURO SOCIAL	
Seguro Social Previsional	1.145
Rentabilidad Protegida	0
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	0
Subtotal:	1.145
Interés - Reajuste	0
Recargo	0

MONTO PAGADO	1.145

N° Afiliados Informados	2

PERIODO COTIZACIONES

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL [ ]	RETROACTIVO [ ]
Mes 07 Año 2026	Mes Año DESDE | Mes Año HASTA	Mes Año DESDE | Mes Año HASTA

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Formulario jurídicamente válido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

* Esta autorización habilita notificar por correo electrónico las demandas de cobranza judicial de cotizaciones previsionales adeudadas, conforme a las modificaciones introducidas a la Ley N° 17.322 , con los mismos efectos legales de una notificación válidamente practicada.

FORMULARIO DE COTIZACIONES PREVISIONALES - SEGURO SOCIAL PREVISIONAL

Seguro Social

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 07/2026

Número de Folio: 2006260701047014

8X30A48Nm2 - gHdmWC3am8 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKXA3 - W3W01mh8Y9 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA7

Identificación del Trabajador			Cotizaciones					Tipo Jornada	Días Trabajados	Movimiento de Personal		
N°	RUT	Nombres y Apellidos	Renta Imponible	Renta Imponible Anterior Días Licencia	Seguro Social Previsional	Rentabilidad Protegida	SIS			Código Mov.	Fecha Inicio	Fecha Término
1	[redacted]	ALBORNOZ DINAMARCA FABIAN OCTAVIO	104.166	0	937	0	0	JC	1	7	31/07/2026	
2		PONCE ESPINOZA ANGEL PATRICIO	23.065	0	208	0	0	JC	1	7	31/07/2026	
Totales Generales			127.231	0	1.145	0	0					

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 00: Sin movimiento; 01: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 02: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 03: Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 04: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 05: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 06: Accidente del trabajo.; 07: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 08: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12: Reliquidación, Premio o Bono pagados con fecha posterior al finiquito.

Descripción de Códigos de Tipo Jornada: JC: Jornada Completa; JP: Jornada Parcial;

Renta Imponible Anterior Días Licencia: Corresponde a la Renta Imponible Mes Anterior al subsidio por incapacidad laboral proporcional a los días con licencia médica (Mov. personal 3 o 6).

Formulario jurídicamente válido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

Fecha Emisión: **03/09/2026**
Hora: **11:16**
Cód. de Seguimiento: **KBQL-ROWO-VLYQ**

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de Entidad Empleadora y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, que es de su responsabilidad, resuelve lo siguiente:

1.- Entidad Empleadora

Nombre o Razón Social
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA

Código de Actividad Económica (CAE)
9048931 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

RUT Entidad Empleadora	Representante Legal	RUT Representante Legal
77947259-0	FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA	[redacted]

Solicitante	RUT Solicitante	Correo Electrónico NCC
FELIPE ANDRÉS PEREIRA BECERR	[redacted]	[redacted]

2.- Antecedentes Laborales y Previsionales

Disponibles en el Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional.

2.1 - Multas ejecutoriadas no publicadas en el Boletín de Infractores (Dirección del Trabajo)

N° de Multa	N° Unidades Monetarias	Tipo de Unidad Monetaria	Estado
NO REGISTRA			

2.2 - Multas ejecutoriadas publicadas en el Boletín de Infractores (Equifax)

N° de Multa	Tipo de Unidad Monetaria	Monto en CLP ($)

NO REGISTRA

2.3 - Deuda Previsional Publicada en el Boletín de Infractores (Equifax)

Motivo	Institución	Monto en UTM	Monto en CLP ($)
NO REGISTRA			

Verifica este documento

Dirección del Trabajo

Escaneando el código QR

O en el sitio
https://midt.dirtrab.cl/verificadorDocumental
ingresando

AZXGMMMGAOJX

REGISTRO FOTOGRAFIO – EDP N°1


REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY


CONSTRUCTORA ALBURA
INGENIERIA, ARQUITECTURA & CONSTRUCCION

Letrero indicativo de obra



Demolición de aceras

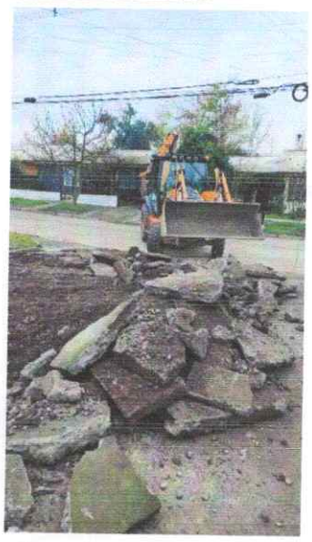

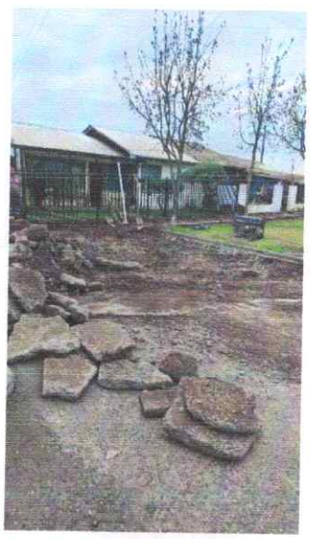



Excavaciones







REGISTRO FOTOGRAFIO – EDP N°1

REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY

CONSTRUCTORA ALBURA
INGENIERIA, ARQUITECTURA & CONSTRUCCION

Transporte a botadero



CERTIFICADO DISPOSICION PARA RELLENO SANITARIO
DISPOSICION FINAL PARA ESCOMBROS Y RESIDUOS INERTES



Base estabilizada e=0,05 mt (aceras de HC e =0,07 mt)








Base estabilizada e=0,15 mt (aceras de HC e=0,12mt)



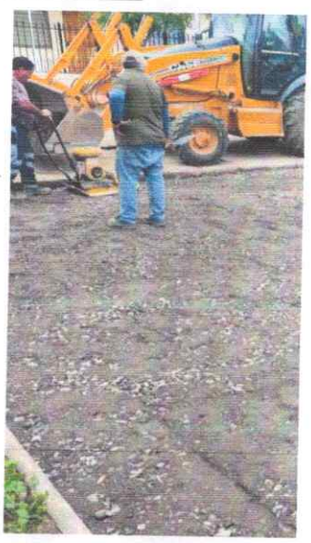



REGISTRO FOTOGRAFIO – EDP N°1

REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY


CONSTRUCTORA ALBURA
INGENIERIA, ARQUITECTURA & CONSTRUCCION

Moldajes de madera





Aceras de HC e=0,07 mt (circulación peatonal)

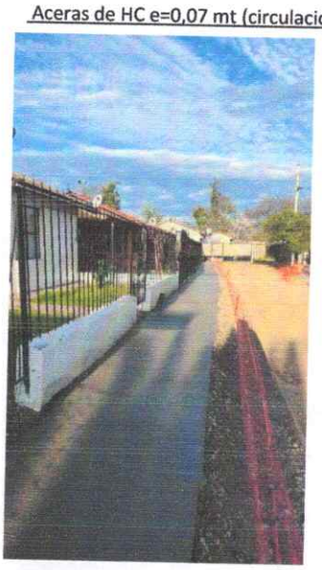



Aceras de HC e=0,12 mt (acceso vehicular y circulación peatonal)





REGISTRO FOTOGRAFIO – EDP N°1

REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY

CONSTRUCTORA ALBURA
INGENIERIA, ARQUITECTURA & CONSTRUCCION

Rampa

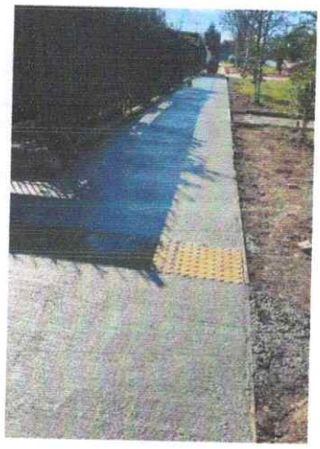



Base para instalación BMV





BMV Tipo Minvu 0 color amarillo





INGENIERIA, ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA
Giro: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCTORA
PARQUE INDUSTRIAL LT A- 2- SAN FERNANDO
eMail : consultora.omega2021@gmail.com Telefono : TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.947.259- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº48

S.I.I. - SAN FERNANDO

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Septiembre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESTADO DE PAGO N°1 REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY, COMUNA DE REQUINOA ID 3656-88-LP26	1	23.770.382			23.770.382

Referencias:
- Orden Compra N° 3656-349-SE26 del 2026-06-19

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.770.382
I.V.A. 19%	$	4.516.373
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	28.286.755

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

INGENIERIA, ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA
Giro: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCTORA
PARQUE INDUSTRIAL LT A- 2- SAN FERNANDO
eMail : consultora.omega2021@gmail.com Telefono : TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.947.259- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº48

S.I.I. - SAN FERNANDO

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Septiembre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESTADO DE PAGO N°1 REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY, COMUNA DE REQUINOA ID 3656-88-LP26	1	23.770.382			23.770.382

Referencias:
- Orden Compra N° 3656-349-SE26 del 2026-06-19

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.770.382
I.V.A. 19%	$	4.516.373
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	28.286.755

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MAT. : Lo que indica.

A: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

DE: VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS

A través del presente, y en relación al proyecto denominado **"REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN PARAGUAY, COMUNA DE REQUÍNOA"** a cargo de los Sres. **INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN ALBURA LIMITADA (UTP) RUT: 77.947.259-0**, Representante Legal el Sr. **Felipe Andrés Pereira Becerra RUT: 17.258.721-6**, tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago N°01 equivalente a un total de $ 31.429.728 (treinta y un millones cuatrocientos veintinueve mil setecientos veintiocho pesos), a los cuales se aplica retención del 10% del contrato equivalente a $ 3.142.973, resultando un monto líquido a cancelar de $ 28.286.755 (veintiocho millones doscientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 23,9%.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelación.
- Nómina de trabajadores que prestaron servicio en obra.
- Carátula Estado de Pago.
- Estado de avance por ítem y porcentaje.
- Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duración del contrato.
- Factura N° 48 de fecha 07 de Septiembre del 2026, por un monto de $28.286.755 IVA incluido.
- Certificado de materialidad según requerimiento de ITO.
- Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N° 2000/2026/19746974.
- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodo julio del 2026.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales del periodo julio del 2026.
- Registro Fotográfico con avance de la obra.

Saluda atentamente.

MABQ

Firmado electrónicamente
VICTOR ALFONSO MARTINEZ GONZALEZ
PROFESIONAL DIRECCION DE OBRAS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/xIgaUMLxNWQr287
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

F 2023
DON

CONSTRUCTORA
ALBURA
INGENIERIA, ARQUITECTURA & CONSTRUCCION

ORD. N° : 18 - 2026

MAT. : Ingreso Estado de Pago N°1

Requinoa, 08 de septiembre de 2026

I. MUNICIPALIDAD REQUINOA
DIRECCION DE OBRAS
Fecha: 08/09/2026
Folio: 1118
Línea: 670
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

A : Sr. WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

AT : Sr. VICTOR MARTINEZ GONZALEZ
ITO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DE : Sr. FELIPE PEREIRA BECERRA
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA.

Referente a la Licitación N°3656-88-LP26 "Reposición de Veredas Población Paraguay, comuna Requinoa".

Por la presente vengo a ingresar Estado de Pago N°1, correspondiente al contrato "Reposición de Veredas Población Paraguay, comuna Requinoa".

Se Adjunta la siguiente Documentación:

- Carta de Solicitud
- Nómina de Trabajadores.
- Caratula de Estado de Pago.
- Estado de Avance de Obra por Ítem.
- Informe de las Intervenciones Realizadas.
- Factura.
- Certificaciones de Materiales según requiriendo ITO
- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1).
- Certificado de pago de cotizaciones previsionales.
- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30).
- Set Fotográficos.

Saluda cordialmente.

Ingeniería, Arquitectura y Construcción
ALBURA LIMITADA
77.947.259-0

FELIPE PEREIRA BECERRA
Representante Legal
ING. ARQ. Y CONST. ALBURA LTDA.

FPB/fpb

Parque Industrial Lote A-2 San Fernando, e-mail: constructora.albura.d@gmail.com

09/09/2026

NOMINA DE TRABAJADORES JULIO 2026

RUT	TRABAJADOR
[redacted]	ANGEL PATRICIO PONCE ESPINOZA
	FABIAN OCTAVIO ALBORNOZ DINAMARCA

CONTRATO DE TRABAJO

AFP CUPRUM/FONASA

En San Fernando, con fecha 22 de JULIO de 2026, entre la firma INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LTDA., Cédula Nacional de Identidad Nº 77.947.259-0, Representada por Don FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA, RUT. 17.258.721-6 ambos con domicilio en Parque Industrial Lote A-2, comuna de San Fernando, y Don FABIAN OCTAVIO ALBORNOZ DINAMARCA, de nacionalidad CHILENA, [redacted] se celebra el siguiente contrato para Faena Determinada.

PRIMERO.- El trabajador se compromete a ejecutar las siguientes labores: PROFESIONAL DE OBRA, realizando labores tales como:

Realización de trámites y actualización de datos ante organismo públicos, informes de gastos, archivo de documentos, cubicación de proyectos, inspección mito, autocontrol y firmas, preparación de presupuestos, cotizaciones, supervisión de obras, carta Gantt, dibujos autocad, presentación en licitaciones verificaciones de materiales en bodegas, informes que se soliciten según su gestión, emisión de órdenes de compra, atención de proveedores y todas aquellas actividades inherentes a su cargo

Tareas serán realizadas, en la sección, **CONSTRUCCION VEREDAS POBLACION PARAGUAY,** del establecimiento denominado INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA, ubicada **CALLE PABLO RUBIO S/N** en la comuna de **REQUINOA**. Pudiendo ser trasladado a otro domicilio, o labores similares, dentro de la ciudad o comuna, por causa justificada, sin ello importe menoscabo para el trabajador.

SEGUNDO.- El Trabajo se realizara por MES, Pactándose una Jornada de 42 hrs. Semanales:

Lunes a Jueves: 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 18:00 hrs.
Viernes : 08:00 a 14:00 hrs.

TERCERO.- El empleador se compromete a remunerar al trabajador mensualmente en la forma que se indica:

Sueldo base mensual : 2.500.000.- (Dos Millones Quinientos mil pesos).-
Gratificación Legal : 25% de lo ganado con tope de 4,75 ingresos mínimos.-

CUARTO.- El presente contrato durará: **HASTA EL TERMINO DE FAENA** y podrá ponérsele término cuando concurra para ello las causales de caducidad o término establecidas en el Código del Trabajo y/o Reglamento Interno

QUINTO.- Se deja constancia que don, FABIAN OCTAVIO ALBORNOZ DINAMARCA ingresó al servicio el 22 de JULIO de 2026.

SEXTO.- Se entienden incorporadas al presente contrato todas las disposiciones legales que se dicten con posterioridad a la fecha de suscripción y que tengan relación con él.

SEPTIMO.- En el acto, el trabajador declara recibir una copia del Reglamento Interno, haberlo leído y comprendido, y se compromete a cumplirlo cabalmente asume y entiende que las presentes exigencias definidas en el reglamento interno son imposiciones de la Constructora y que el no cumplimiento de tales exigencias puede originar el termino del presente Contrato en las condiciones descritas en el articulo 160 N° 7 del código del Trabajo.

Para constancia firman las partes el presente contrato en tres ejemplares, quedando uno de ellos en poder de cada parte.

Ingeniería, Arquitectura y Construcción
ALBURA LIMITADA
77.947.259-0

FIRMA DEL TRABAJADOR
FABIAN OCTAVIO ALBORNOZ DINAMARCA
R.U.T [redacted]

FIRMA DEL EMPLEADOR
R.U.T. 77.947.259-0

CONTRATO DE TRABAJO

AFP PLAN VITAL/FONASA

En San Fernando, con fecha 29 de JULIO de 2026, entre la firma INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LTDA., Cédula Nacional de Identidad Nº 77.947.259-0, con domicilio en Parque Industrial Lote A-2, comuna de San Fernando, y Don ANGEL PATRICIO PONCE ESPINOZA de nacionalidad [redacted] R.U.T. [redacted] POBLACION LOS COPIGUE GULTRO, comuna EL OLIVAR, se celebra el siguiente contrato para Faena Determinada.

PRIMERO.- El trabajador se compromete a ejecutar las siguientes labores de **MAESTRO** y realizara las labores determinadas que se especifican:

Saca niveles y realizada trazados de elementos geométricos colocación de base, estabilizado, colocación de moldajes para hormigón y afinamiento de hormigón, cortes de hormigón y sellos asalticos y pegado de soleras.

Tareas serán realizadas, en la sección, **CONSTRUCCION VEREDAS POBLACION PARAGUAY,** del establecimiento denominado INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA, ubicada **CALLE PABLO RUBIO S/N** en la comuna de **REQUINOA**. Pudiendo ser trasladado a otro domicilio, o labores similares, dentro de la ciudad o comuna, por causa justificada, sin ello importe menoscabo para el trabajador.

SEGUNDO.- El Trabajo se realizara por MES, Pactándose una Jornada de 42 hrs. Semanales:

Lunes a Jueves:		08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 18:00 hrs.
Viernes	:	08:00 a 14:00 hrs.

TERCERO.- El empleador se compromete a remunerar al trabajador mensualmente en la forma que se indica:

Sueldo Base	:	553.553.- (Quinientos Cincuenta y Tres mil Quinientos cincuenta y tres pesos).-
Gratificación Legal	:	25% de lo ganado, con tope, según Ley de 4,75 Ingresos Mínimos.

CUARTO.- El presente contrato durará: **HASTA EL TERMINO DE CONSTRUCCION VEREDAS CALLE PABLO RUBIO, COMUNA DE REQUINOA,** podrá ponérsele término cuando concurra para ello las causales de caducidad o término establecidas en el Código del Trabajo y/o Reglamento Interno

QUINTO.- Se deja constancia que don, ANGEL PATRICIO PONCE ESPINOZA ingresó al servicio el 29 de JULIO de 2026.

SEXTO.- Se entienden incorporadas al presente contrato todas las disposiciones legales que se dicten con posterioridad a la fecha de suscripción y que tengan relación con él.

SEPTIMO.- En el acto, el trabajador declara recibir una copia del Reglamento Interno, haberlo leído y comprendido, y se compromete a cumplirlo cabalmente asume y entiende que las presentes exigencias definidas en el reglamento interno son imposiciones de la Constructora y que el no cumplimiento de tales exigencias puede originar el termino del presente Contrato en las condiciones descritas en el artículo 160 N° 7 del código del Trabajo.

Para constancia firman las partes el presente contrato en tres ejemplares, quedando uno de ellos en poder de cada parte.

Ingeniería, Arquitectura y Construcción
ALBURA LIMITADA
77.947.259-0

FIRMA DEL TRABAJADOR
ANGEL PATRICIO PONCE ESPINOZA
R.U.T. [redacted]

FIRMA DEL EMPLEADOR
R.U.T 77.947.259-0
R.L. FELIPE PEREIRA BECERRA
RUT [redacted]

GOBIERNO REGIONAL
REGIÓN DE O'HIGGINS

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

CARATULA ESTADO DE PAGO

ESTADO DE PAGO	N°1
FECHA	08/09/2026
MONTO	**$ 31.429.728**
AVANCE FINANCIERO	23,90%
AVANCE FISICO	23,90%

NOMBRE PROYECTO: REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY
CODIGO IDI (BIP):
ID LICITACIÓN: 3656-88-LP26
CONTRATISTA: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCCION ALBURA LIMITADA

DECRETO ADJUDICACION: N° 1502 FECHA 01/06/2026
FECHA INICIO DE OBRA: 24/06/2026 PLAZO 105 DIAS CORRIDOS
MODIFICACION DE PLAZO DECRETO N° DE AUMENTO
FECHA TERMINO DE OBRA: 06/10/2026

SUSPENSIÓN DE PLAZO: DECRETO N° 1857 DE 03/07/2026
INICIO SUSPENSIÓN DE OBRA: 26/06/2026

ACTIVACIÓN DE PLAZO: DECRETO N° 1951 DE 23/07/2026
NUEVA FECHA TERMINO DE OBRA: 31/10/2026

MONTO CONTRATO INICIAL (IVA INCLUIDO) $ 131.527.543
MODIFICACION MONTO DECRETO N° DE AUMENTO

MONTO TOTAL CONTRATO (IVA INCLUIDO) **$ 131.527.543**

MONTO TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS HASTA LA FECHA INCLUIDO EL PRESENTE ESTADO DE PAGO	$	31.429.728
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO IVA INCLUIDO	**$**	**31.429.728**
RETENCIONES	$	3.142.973
MULTAS ESTADO DE PAGO		
LIQUIDO A PAGAR	**$**	**28.286.755**

RESUMEN E.P.

N° ESTADO DE PAGO	*MONTO*	*MULTAS*	*RETENCIONES*	*$*
1	*$ 31.429.728*		*$ 3.142.973*	*$ 28.286.755*
TOTAL	***$ 31.429.728***	***$ -***	***$ 3.142.973***	***$ 28.286.755***

Inganieria, Arquitectura y Construcción
ALBURA LIMITADA
77.947.259-0

FIRMA Y NOMBRE CONTRATISTA

FIRMA , NOMBRE Y TIMBRE INSPECTOR TECNICO DE OBRA

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

FORMATO N°3

PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDA

	I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
	CUBICACION Y PRESUPUESTO OFICIAL
PROYECTO:	REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY
UBICACIÓN:	POBLACION PARAGUAY
COMUNA:	REQUÍNOA

CUBICACIÓN Y PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	PRECIO	TOTAL	ESTADO DE PAGO N°1				
						CANT	% AVANCE ANTERIOR	% AVANCE ACTUAL	% AVANCE ACUMULADO	Total a pago / partida
1	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS									
1.1	**OBRAS PROVISIONALES**									
1.1.1	Instalación de faena	uni	1,0	$ 2.400.000	$ 2.400.000		0%	0%	0%	$ -
1.1.2	Señalización provisoria	uni	1,0	$ 1.500.000	$ 1.500.000		0%	0%	0%	$ -
1.1.3	Letrero indicativo de obra	uni	1,0	$ 550.000	$ 550.000	1,00	0%	100%	0%	$ 550.000
1.2	**OBRAS PRELIMINARES**									
1.2.1	Destronque	uni	7,0	$ 36.000	$ 252.000		0%	0%	0%	$ -
2	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y ACCESOS VEHICULRES									
2.1	**OBRAS DE PREPARACIÓN DE TERRENO**									
2.1.1	Demolición de aceras	m2	1790,00	$ 6.000	$ 10.740.000	520,00	0%	29%	0%	$ 3.120.000
2.1.2	Excavaciones	m3	124,00	$ 25.000	$ 3.100.000	35,00	0%	28%	0%	$ 875.000
2.1.3	Transporte a botadero	m3	303,00	$ 20.000	$ 6.060.000	85,00	0%	28%	0%	$ 1.700.000
2.2	**REPOSICIÓN DE ACERAS Y ACCESOS VEHICULARES**									
2.2.1	Base estabilizada e=0,05 mt (aceras de HC e =0,07 mt)	m3	58,40	$ 25.000	$ 1.460.000	14,00	0%	24%	0%	$ 350.000
2.2.2	Base estabilizada e=0,15 mt (aceras de HC e=0,12mt)	m3	254,31	$ 25.000	$ 6.357.750	51,00	0%	20%	0%	$ 1.275.000
2.2.3	Moldajes de madera	ml	825,13	$ 2.200	$ 1.815.286	190,00	0%	23%	0%	$ 418.000
2.2.4	Aceras de HC e=0,07 mt (circulación peatonal)	m2	1168,00	$ 21.800	$ 25.462.400	269,00	0%	23%	0%	$ 5.864.200
2.2.5	Aceras de HC e=0,12 mt (acceso vehicular y circulación peatonal)	m2	1097,00	$ 23.800	$ 26.108.600	307,00	0%	28%	0%	$ 7.306.600
2.3	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERAS**									
2.3.1	Reposición de soleras Tipo A	ml	26,85	$ 25.000	$ 671.250		0%	0%	0%	$ -
2.3.2	Reposición de soleras Tipo C	ml	27,00	$ 15.000	$ 405.000		0%	0%	0%	$ -
2.4	**CONSTRUCCIÓN DE RAMPA**									
2.4.1	Rebaje de solera	ml	33,50	$ 25.000	$ 837.500		0%	0%	0%	$ -
2.4.2	Rampa	m2	47,90	$ 22.000	$ 1.053.800	5,00	0%	10%	0%	$ 110.000
2.4.3	Base para instalación BMV	m2	18,24	$ 5.000	$ 91.200	2,00	0%	11%	0%	$ 10.000
2.4.4	BMV Tipo Minvu 0 color amarillo	m2	18,24	$ 35.000	$ 638.400	2,00	0%	11%	0%	$ 70.000
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS									
3.1	Demarcación de Soleras	ml	70,00	$ 10.400	$ 728.000		0%	0%	0%	$ -
3.2	Aseo y entrega	uni	1,00	$ 365.000	$ 365.000		0%	0%	0%	$ -
SUBTOTAL					**$ 90.596.186**					**$ 21.648.800**
GASTOS GENERALES		%	10		$ 9.059.619					$ 2.164.880
UTILIDADES		%	12		$ 10.871.542					$ 2.597.856
SUBTOTAL OBRAS A EJECUTAR+GASTOS GENERALES+UTILIDADES					**$ 110.527.347**	$ -		$ -		**$ 26.411.536**
IVA		%	19		$ 21.000.196					$ 5.018.192
TOTAL					**$ 131.527.543**	$ -		$ -		**$ 31.429.728**

FIRMA DEL CONTRATISTA

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Ingeniería, Arquitectura y Construcción
ALBURA LIMITADA
77.947.259-0

FIRMA DEL ITO MUNICIPAL

UNIDAD TECNICA I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DIRECCION DE OBRAS I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

FIRMA DOM

INFORME DE INTERVENCIONES REALIZADAS

DIA	FECHA	INTERVENCIONES REALIZADAS
1	21.07.2025	LLUVIAS
2	22.07.2026	SE REALIZA LA INSTALACION DEL LETRERO DE OBRA
3	23.07.2026	SE RECIBE MATERIALES Y SE REALIZA INSTALACION DE FAENA
4	24.07.2026	SE TRAZA Y SE RATIFICAN NIVELES TOPOGRAFICOS PARA INTERVENCION DE LA VEREDA SE DETERMINA LA PARTIDA EN PASAJE GUARANI
5	27.07.2026	LLUVIAS
6	28.07.2026	LLUVIAS
7	29.07.2026	SE INICIA DEMOLICION EN SECTOR PASAJE GUARANI
8	30.07.2026	SE REALIZA DEMOLICION EN SECTOR PASAJE GUARANI Y PABLO RUBIO ENTRE PSJ ASUNCION Y PSJ GUARANI LADO ORIENTE
9	31.07.2026	LLUVIAS
10	03.08.2026	LLUVIAS
11	04.08.2026	SE REALIZA DEMOLICION EN SECTOR PABLO RUBIO ENTRE ASUNCION Y GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE
12	05.08.2026	SE SIGUE CON LA DEMOLICION EN SECTOR PABLO RUBIO ENTRE ASUNCION Y GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE
13	06.08.2026	SE REALIZA COMPACTACION , INSTALACION DE MOLDAJES Y BASE ESTABILIZADA SECTOR PABLO RUBIO ENTRE ASUNCION Y GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE
14	07.08.2026	SE REALIZA LA COLOCACION DE HORMIGON EN SECTOR DE PABLO RUBIO ENTRE ASUNCION Y GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE.
15	10.08.2026	SE REALIZAN LOS CORTES Y SE INSTALA MOLDAJES SECTOR ESQUINA PABLO RUBIO CON GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE
16	11.08.2026	SE REALIZA COMPACTACION , INSTALACION DE MOLDAJES Y BASE ESTABILIZADA SECTOR PABLO RUBIO ESQUINA GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE, PASAJE GUARANI Y PABLO RUBIO ENTRE PASAJE GUARANI Y PASAJE ASUNCION LADO ORIENTE
17	12.08.2026	SE REALIZA LA COLOCACION DE HORMIGON EN SECTOR DE PABLO RUBIO ESQUINA GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE , PASAJE GUARANI Y PABLO RUBIO ENTRE PSJ ASUNCION Y PASAJE GUARANI LADO ORIENTE
18	13.08.2026	SE REALIZAN LOS CORTES Y SE INSTALA MOLDAJES SECTOR ESQUINA PABLO RUBIO CON GABRIELA MISTRAL
19	14.08.2026	SE REALIZA DEMOLICION EN SECTOR PABLO RUBIO ENTRE ASUNCION Y GABRIELA MISTRAL LADO PONIENTE
20	17.08.2026	SE REALIZA COMPACTACION , INSTALACION DE MOLDAJES Y BASE ESTABILIZADA SECTOR PABLO RUBIO ESQUINA PSJ ASUNCION LADO PONIENTE
21	18.08.2026	SE REALIZA LA COLOCACION DE HORMIGON EN SECTOR DE PABLO RUBIO ESQUINA PSJ ASUNCION LADO PONIENTE
22	19.08.2026	SE REALIZA COMPACTACION , INSTALACION DE MOLDAJES Y BASE ESTABILIZADA SECTOR PABLO RUBIO ESQUINA PSJ JUAQUIN CONTRERAS LADO PONIENTE Y PASAJE GUARANI ENTRADAS VEHICULAR
23	20.08.2026	SE REALIZA LA COLOCACION DE HORMIGON EN SECTOR DE PABLO RUBIO ESQUINA PSJ JUAQUIN CONTRERAS LADO PONIENTE Y PASAJE GUARANI
24	21.08.2026	SE REALIZAN LOS CORTES Y SE INSTALA MOLDAJES Y BASE ESTABILIZADA SECTOR PABLO RUBIO ESQUINA PSJ JUAQUIN CONTRERAS LADO PONIENTE
25	24.08.2026	SE REALIZA LA COLOCACION DE HORMIGON EN SECTOR DE PABLO RUBIO ESQUINA JUAQUIN CONTRERAS LADO PONIENTE
26	25.08.2026	LLUVIAS
27	26.08.2026	LLUVIAS
28	27.08.2026	SE REALIZA DEMOLICION EN SECTOR PABLO RUBIO ENTRE ASUNCION Y GABRIELA MISTRAL LADO ORIENTE
29	28.08.2026	SE REALIZA COMPACTACION , INSTALACION DE MOLDAJES Y BASE ESTABILIZADA SECTOR PABLO RUBIO ENTRE ASUNCION Y GABRIELA MISTRAL LADO ORIENTE

INGENIERIA, ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA
Giro: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCTORA
PARQUE INDUSTRIAL LT A- 2- SAN FERNANDO
eMail : consultora.omega2021@gmail.com Telefono : TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.947.259- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº48

S.I.I. - SAN FERNANDO

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO


Fecha Emision: 07 de Septiembre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESTADO DE PAGO N°1 REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY, COMUNA DE REQUINOA ID 3656-88-LP26	1	23.770.382			23.770.382

Referencias:
- Orden Compra N° 3656-349-SE26 del 2026-06-19

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.770.382
I.V.A. 19%	$	4.516.373
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	28.286.755



Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

INGENIERIA, ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA
Giro: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCTORA
PARQUE INDUSTRIAL LT A- 2- SAN FERNANDO
eMail : consultora.omega2021@gmail.com Telefono : TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.947.259- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº48

S.I.I. - SAN FERNANDO

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.:	69.081.300- 9
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	COMERCIO 121
COMUNA	REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Septiembre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESTADO DE PAGO N°1 REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY, COMUNA DE REQUINOA ID 3656-88-LP26	1	23.770.382			23.770.382

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-349-SE26 del 2026-06-19

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.770.382
I.V.A. 19%	$	4.516.373
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	28.286.755

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089480

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
07-08-2026	337925	615623	2945079		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	8	98027
	INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:			
	REQUINOA FABIAN ALBORNOZ 981784066			

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
9:00	8:28	08/45	09/10	09/15	09/30	09/53	10/20	

CONTROL INTERNO		AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	DFRW93	Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	3224-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	BRAUULIO HUMBERTO / 76084154-4		
Operador:	LGALARCE		
Transportista		Nombre y Firma Op.Mixer / Nombre y Firma Cliente	

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: FABIAN ALBORNOZ

RUT: FECHA:

RECINTO: FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

CEDIBLE CON SU FACTURA

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 628 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089486

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
07-08-2026	337929	615888	2945379		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	8	98027

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

REQUINOA FABIAN ALBORNOZ 981784066

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
11:00	10:29	1054	1114	1116	1154	1200	1207	

CONTROL INTERNO			AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	ZP3806		Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	1333-X			Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	OLMOS FERNANDO	76084154-4		
Operador:	LGALARCE			
Transportista			Nombre y Firma Op.Mixer / Nombre y Firma Cliente	

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: Fran's Rivas

RUT: FECHA:

RECINTO: FIRMA:

(El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4°, y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s))

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

CEDIBLE CON SU FACTURA

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089565

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
12-08-2026	340953	619379	2945302		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	CALLE PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11004798	HORMIGON GN20.0(10)20/08	m3	7	83732

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

FELIPE PEREIRA

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
9:00	8:31	8:35	9:18	9:40	10:40	10:48		

CONTROL INTERNO		AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	LRTP23	Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	2670-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de Regada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos limites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	BARRALES MORAGA GE 76084154-4		
Operador:	LGALARCE	Nombre y Firma Op.Mixer	Nombre y Firma Cliente
Transportista			

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el homrigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: FELIPE PEREIRA

RUT: 17.287.446 FECHA: 12/08/2026

RECINTO: REQUINOA FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE CON SU FACTURA

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089573

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
12-08-2026	340955	619718	2945311		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	CALLE PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	7	98027

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

REQUINOA FELIPE PEREIRA

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
11:30	11:01	11:13	11:45	11:50	12:25	12:30	13	

CONTROL INTERNO		AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	DFRW93	Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	3224-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	BRAULIO HUMBERTO /76084154-4		
Operador:	LGALARCE	Nombre y Firma Op.Mixer	Nombre y Firma Cliente
Transportista			

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: FELIPE PEREIRA

RUT: 17.282.721-6 FECHA: 12/08/2026

RECINTO: REQUINOA FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 3° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE CON SU FACTURA

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089665

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
18-08-2026	343704	623783	476095		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	CALLE PABLO RUBIO POBLACION PARAGUA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	8	98027

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

FABIAN ALBORNOZ 981784066

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
9:00	8:34							

CONTROL INTERNO		AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	HTBP39	Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	1314-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	SILVA MIGUEL ANGEL 76084154-4		
Operador:	LGALARCE		
Transportista		Nombre y Firma Op.Mixer / Nombre y Firma Cliente	

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente: recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE:

RUT: FECHA:

RECINTO: FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

CEDIBLE CON SU FACTURA

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089677

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
18-08-2026	343708	624116	476140		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	CALLE PABLO RUBIO POBLACION PARAGUA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	8	98027

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

FABIAN ALBORNOZ 981784066

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
12:00	11:25	11:45	12:05	12:10	12:45	12:55	12:55	13:20

CONTROL INTERNO		AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	HBXR69	Adiciona Agua SI ( ) NO ( )	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	3233-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	76084154-4		
Operador:	LGALARCE		
Transportista		Nombre y Firma Op.Mixer / Nombre y Firma Cliente	

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: FELIPE FIGUEROA.

RUT: 17.278.721-6 FECHA: 18/08/2026

RECINTO: EQUILOS FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 3° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE CON SU FACTURA

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089730

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
20-08-2026	344569	626268	476222		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	7	98027

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

FABIAN ALBORNOZ 981784066

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
9:00	8:23	08:47	09:04	09:28	10:03		10:23	11:46

CONTROL INTERNO	AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente: XH5083	Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°: 1134-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.: MANRIQUEZ BARRIA MA 76084154-4		
Operador: LGALARCE	Nombre y Firma Op.Mixer	Nombre y Firma Cliente
Transportista		

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: Erika Alvarez

RUT: FECHA:

RECINTO: FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4°, y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

CEDIBLE CON SU FACTURA

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089830

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
24-08-2026	347054	629676	476317		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	CALLE PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	7	98027

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

FABIAN ALBORNOZ 981784066

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
11:00	10:52	11:05	11:25	11:30	12:10	12:25		

CONTROL INTERNO		AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	WB1968	Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	1137-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	CASTILLO EDUARDO 76084154-4		
Operador:	LGALARCE	Nombre y Firma Op.Mixer	Nombre y Firma Cliente
Transportista			

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: [illegible] RECEPCIONA

RUT: 18.258.[illegible]-6 FECHA: 24/08/2026

RECINTO: REQUINOA FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

CEDIBLE CON SU FACTURA

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089979

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
01-09-2026	351372	636421	476439		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	CALLE PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11005087	HORMIGON HF05.0(10)20/08	m3	7	98027

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

FABIAN ALBORNOZ 981784066

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
9:00	8:20	08:43	09:07	09:17	10:16		10:27	10:50

CONTROL INTERNO		AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO	MUESTRA N°
Patente:	XH5083	Adiciona Agua SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	1134-X		Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	MANRIQUEZ BARRIA MA 76084154-4		
Operador:	LGALARCE		
Transportista		Nombre y Firma Op.Mixer / Nombre y Firma Cliente	

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el hormigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE: Felix Reyes

RUT: 17.258.721-6 FECHA: 01/09/2026

RECINTO: Requinoa FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4°, y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE CON SU FACTURA

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

Polpaico

Hormigones Polpaico S.A.
Fabricación de Artículos de Hormigón, Cemento y Yeso
600 620 6200
Casa Matriz: Avda. El Bosque Norte 0177 Piso 5, Las Condes Santiago
Sucursal: PLANTA RANCAGUA, Longitudinal Norte 0227

R.U.T.: 76.084.154-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N°: 1089995

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	N°Pedido	Nro.Ticket	Sello	Entrega	Región	Planta
01-09-2026	351379	636855	476386		OHIGGINS	1R

Señor(es):	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONST	Obra:	PAV REQUINOA - ALBURA
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL LOTE A2 COLCHA	Dirección:	CALLE PABLO RUBIO REQUINOA
R.U.T.:	77947259-0	Comuna Obra:	
Codigo Cliente:	10180004	Ciudad de Destino:	RANCAGUA
Ciudad:		Codigo Destinatario:	10198684
Giro:	Construccion Edificios		

Sírvase recibir conforme lo siguiente de acuerdo a la Norma NCh 1934

Codigo del Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
11004798	HORMIGON GN20.0(10)20/08	m3	7	83732

INSTRUCCIONES - COMENTARIOS:

FABIAN ALBORNOZ 981784066

HORA PEDIDA	HORA CARGA	SALIDA PLANTA	LLEGADA OBRA	INICIO DESCARGA	FIN DESCARGA	SALIDA OBRA	RETORNO PLANTA	LLEGADA PLANTA
12:30	11:46	1205	1233	1235	1355	1405		

CONTROL INTERNO			AUTORIZACIÓN ADICIÓN DE AGUA U OTRO INSUMO		MUESTRA N°
Patente:	WH7915		Adiciona Agua	SI ◯ NO ◯	VÁLIDO SÓLO ACORDE A NORMAS
Camión N°:	1135-X				Ajuste de docilidad se realizará por única vez previo al inicio de la descarga, en un tiempo menor a 30 minutos desde la hora de llegada a obra y no superior a 90 minutos desde la hora de carga, cualquier adición de agua fuera de estos límites son responsabilidad de quien autoriza el ajuste de docilidad
Chofer Sr.:	RIQUELME MARCELO	76084154-4	Nombre y Firma Op.Mixer	Nombre y Firma Cliente	
Operador:	LGALARCE				
Transportista					

Observaciones:

DEVOLUCION DE HORMIGON

NOMBRE

FIRMA Cantidad M3

Estimado cliente, recuerde que todo hormigón devuelto tiene cobro ambiental de 1 UF por M3. Utilice todo el homrigón solicitado

Datos de Recepción

NOMBRE:

RUT: FECHA:

RECINTO: FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2014 - Verifique documento : www.sii.cl

CEDIBLE CON SU FACTURA

REGISTRO DE CALIDAD
Aréa Mecánica de Suelos
Método Nuclear para la determinación de la Densidad de Suelos
(Mèt. 8.502.1 Dic. 2003 M.C. V.8)

Cód.: F-S-11
Fecha: 28/01/19
N° Edición: 00
Pág 1 de 1

O.T.	242621	FECHA:	18-08-26	COD. DENSIMETRO:	122-01

Det. N°	Ubicación / lado / Kmp. / Sector	Capa N°	Prof. Controlada Cms.	Datos del Terreno			Ref. D.Min.	D.M.C.S D. Max.	Comp %
				D. C. H	H %	D. C. S.			
1	Acceso Vehicular Unifamiliar Calle Pablo Rubio F/casa 69	Base	15	2384	7,2	2224		2,24	99,3
	(Requinoa)								

Cont. Alburra Ltda
Suc = Rte De Verdos
Pdr. Paraguay
Requinoa

OT = 242621

18-8-26

Referencia N° OT	241946		

OBSERVACIONES:

Nombre y Firma Profesional Responsable de Obra

Mario Rojas
Responsable del Ensayo

V° B° Jefe de Area

	REGISTRO DE CALIDAD Aréa Mecánica de Suelos Método Nuclear para la determinación de la Densidad de Suelos (Mét. 8.502.1 Dic. 2003 M.C. V.8)	Cód. F-S-11 Fecha: 28/01/19 N° Edición: 00 Pág. 1 de 1

O.T.	242620	FECHA:	18-08-26	COD. DENSIMETRO:	122-01

Det. N°	Ubicacion / lado / Km. / Sector	Capa N°	Prof. Controlada Cms.	Datos del Terreno			Rel D.Min.	D.M.C.S D. Max	Comp. %
				D. C. H.	H %	D. C. S.			
1	Acceso Vehicular Unifamiliar Calle Pablo Rubio F/casa. 69	S/e	20	2271	8,7	2089	/	2,17	96,3
	(Requinoa)								

Referencia N° OT	241945		

OBSERVACIONES

Nombre y Firma Profesional
Responsable de Obra

Mario Rojas
Responsable del Ensayo

V° B° Jefe de Area

REGISTRO DE CALIDAD

Área hormigón y **Morteros**

I. Determinacion de la docilidad, Método de Asentamiento del cono Abrams. Nch 1019 EOf 2009. Determinación de la consistencia-Parte 3 Método del Asentamiento del cono Nch 2257/3 Of 96. **Extracción de muestras del Hormigón Fresco NCh171-2008**
Morteros-Confección de probetas en obra y determinación de la resistencia a compresión Nch 2261-2010
Hormigón-confección en obra y curado de probetas para ensayos de compresión, tracción por flexión y hendimiento NCh1017-2009

Cód.: F-H-3
Fecha: 02/10/24
Edición: 02

N° O.T.: 242107

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre **de la obra**
Ubicación de la obra
Nombre de la empresa
Solicitante Ensayo
Responsable **de obra**

EXTRACCIÓN DE MUESTRA

Fecha
N° identif. del cliente
Nombre Inspector obra
Volumen que representa el muestreo

Hora confección H° _
Hora de salida planta
Hora llegada **a la obra**
Hora descarga
Hora de muestreo
Hora de termino descarga

TIPO DE MUESTRAS	Tipo	Cantidad	N° Molde	EDAD DE ENSAYO Probeta	Dias
Cúbicas 15*15					
Cúbicas 20*20					
Cilíndricas 15*30					
Prismáticas 15*53	X	3		3	7
Prismáticas 4*16				2	28

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Cantidad de la Muestra Mayor a 30 lts (Hormigon)	Si	No
Hormigoneras estacionarias		
Camión Mezclador		X
Acopios		
Otros equipos de mezclado		
Muestra Compuesta		
Muestra Simple		X

M. compuesta: Cantidad de hormigón formada por dos o más porciones obtenida de una amasada.
M. simple: Cantidad de hormigón formada por una porción obtenida de una amasada.

DOCILIDAD - ASENTAMIENTO CONO DE ABRAMS **O CONO REDUCIDO**

Fecha
Hora obtención muestra
Hora inicio ensayo
Hora término ensayo
Valor Asentamiento de Cono : 6 Cms. (Hormigón) (Menor a 5 minutos desde la obtención de la muestra) (Menor a 2,5 minutos desde el inicio del ensayo) mm. (Mortero)

	SI	NO
* El hormigón moldeado sufre disgregaciones		X
* El hormigón moldeado carece de plasticidad y cohesión		X
* Incluinación superficie superior (< a 5 cm o repetir ensayo)		X

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Cantidad de la Muestra Mayor a 5 lts (Morteros)	Si	No
Mecanico		
No Mecanico		
METODO DE MUESTREO		
Pison		
Mesa Vibradora		

COD. CONO: 34.01
COD. REGLA: 03.02

PROCEDIMIENTO DE CURADO **PARA HORMIGÓN Y MORTEROS**

Curado Inicial 16 a 27°C	
a) Cubiertas con láminas de material impermeable y protegidas por sus lado con arena	X

Curado de probetas desmoldadas **21 a 25°C**	
a) Piscina de curado rengo temperatura	X

ANTECEDENTES DEL HORMIGON **Y MORTEROS**

Resistencia especificada
Nivel de confianza %
Ensayos(s) solicitados(s)
Volumen de amasada de H°
Procedencia de los áridos
Tipo de cemento

Elemento hormigonado (Proporcionado por cliente)
Ubicación del elemento Hormigonado (Proporcionado por cliente)
Ubicación del Muestreo (Responsabilidad del laboratorio)

Procedencia del H°

Fabricado en Obra	
Suministro Externo	X
Otros	

Comp. Muestras

Vibrada	X
Apisonada	

Temperaturas

	Corregida
Hormigón °C	12.3
Ambiente °C	7.7
Curado Inicial °c	

Fecha de retiro:
Hora:
Fecha de Recepción
Hora

*** Las muestras de hormigon y morteros seran transportadas en sus respectivos moldes para cuidar su condición y forma***

COD. VIBRADOR: 36.04 | COD. TERMOMETRO: 17.13 | COD. PISÓN:

SOLO PARA HORMIGONES **DE SUMINISTRO EXTERNO**

Proveedor
Guia N° 308780 Camión N° 322 Patente N° DTDW-39

Observaciones:

REGISTRO DE CALIDAD

Área hormigón y **Morteros**

I. Determinacion de la docilidad. Método de Asentamiento del cono Abrams. Nch 1019 EOf 2009. Determinación de la consistencia-Parte 3 Método del Asentamiento del cono Nch 2257/3 Of 96. **Extracción de muestras del Hormigón Fresco NCh171-2008**
Morteros-Confección de probetas en obra y determinación de la resistencia a compresión Nch 2261-2010
Hormigón-confección en obra y curado de probetas para ensayos de compresión, tracción por flexión y hendimiento NCh1017-2009

Cód.: F-H-3
Fecha: 02/10/24
Edición: 02
Pág. 1 de 1

N° O.T.: 242166

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre de la obra
Ubicación de la obra
Nombre de la empresa
Solicitante Ensayo
Responsable **de obra**

EXTRACCIÓN DE MUESTRA

Fecha: 07/06/24
N° identif. del cliente: 242166
Nombre Inspector obra
Volumen que representa el muestreo: 30 Lts

Hora confección H° _
Hora de salida planta: 08:10
Hora llegada **a la obra**
Hora descarga
Hora de muestreo: 09:25
Hora de termino descarga

TIPO DE MUESTRAS

	Tipo	Cantidad	N° Molde		
Cúbicas 15*15					
Cúbicas 20*20					
Cilíndricas 15*30	X	3	32	33	
Prismáticas 15*53					
Prismáticas 4*16					

EDAD DE ENSAYO

Probeta	Días
1	7
2	28

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

Cantidad de la Muestra Mayor a 30 lts (Hormigon)

Si		No	
Hormigoneras estacionarias			
Camión Mezclador			X
Acopios			
Otros equipos de mezclado			
Muestra Compuesta			
Muestra Simple			X

M. compuesta: Cantidad de hormigón formada por dos o más porciones obtenida de una amasada.
M. simple: Cantidad de hormigón formada por una porción obtenida de una amasada.

DOCILIDAD - ASENTAMIENTO CONO DE ABRAMS **O CONO REDUCIDO**

Fecha: 07/06/24
Hora obtención muestra: 08:45
Hora inicio ensayo: 08:50
(Menor a 5 minutos desde la obtención de la muestra)
Hora término ensayo: 08:55
(Menor a 2,5 minutos desde el inicio del ensayo)
Valor Asentamiento de Cono: 0.0 Cms. (Hormigón) ____ mm. (Mortero)

	SI	NO
* El hormigón moldeado sufre disgregaciones		X
* El hormigón moldeado carece de plasticidad y cohesión		X
* Incluinación superficie superior (< a 5 cm o repetir ensayo)		

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

Cantidad de la Muestra Mayor a 5 lts (Morteros)

Si		No	
Mecanico			
No Mecanico			

METODO DE MUESTREO

Pison			
Mesa Vibradora			

COD. CONO: 37.07
COD. REGLA: 03-21

PROCEDIMIENTO DE CURADO **PARA HORMIGÓN Y MORTEROS**

Curado Inicial 16 a 27°C

a) Cubiertas con láminas de material impermeable y protegidas por sus lado con arena: X

Curado de probetas desmoldadas **21 a 25°C**

a) Piscina de curado rengo temperatura: X

ANTECEDENTES DEL HORMIGÓN **Y MORTEROS**

Resistencia especificada: H-25 G-30 / H-30
Nivel de confianza %: 90%
Ensayos(s) solicitados(s): 7 y 28
Volumen de amasada de H°: 6 m3
Procedencia de los áridos
Tipo de cemento

Elemento hormigonado (Proporcionado por cliente): Radier
Ubicación del elemento Hormigonado (Proporcionado por cliente): Eje 1 a 10
Ubicación del Muestreo (Responsabilidad del laboratorio): Obra

Procedencia del H°

Fabricado en Obra	
Suministro Externo	2
Otros	

Comp. Muestras

Vibrada	2
Apisonada	

Temperaturas

	Corregida
Hormigón °C	15.3
Ambiente °C	17.4
Curado Inicial °c	

Fecha de retiro:
Hora:
Fecha de Recepcion:
Hora:


*** Las muestras de hormigon y morteros seran transportadas en sus respectivos moldes para cuidar su condición y forma***

COD. VIBRADOR:	36.04	COD. TERMOMETRO	44.23	COD. PISÓN:	

SOLO PARA HORMIGONES **DE SUMINISTRO EXTERNO**

Proveedor: Inacesa
Guía N°: 3065765
Camión N°: 3227
Patente N°: DTDW-33

Observaciones:

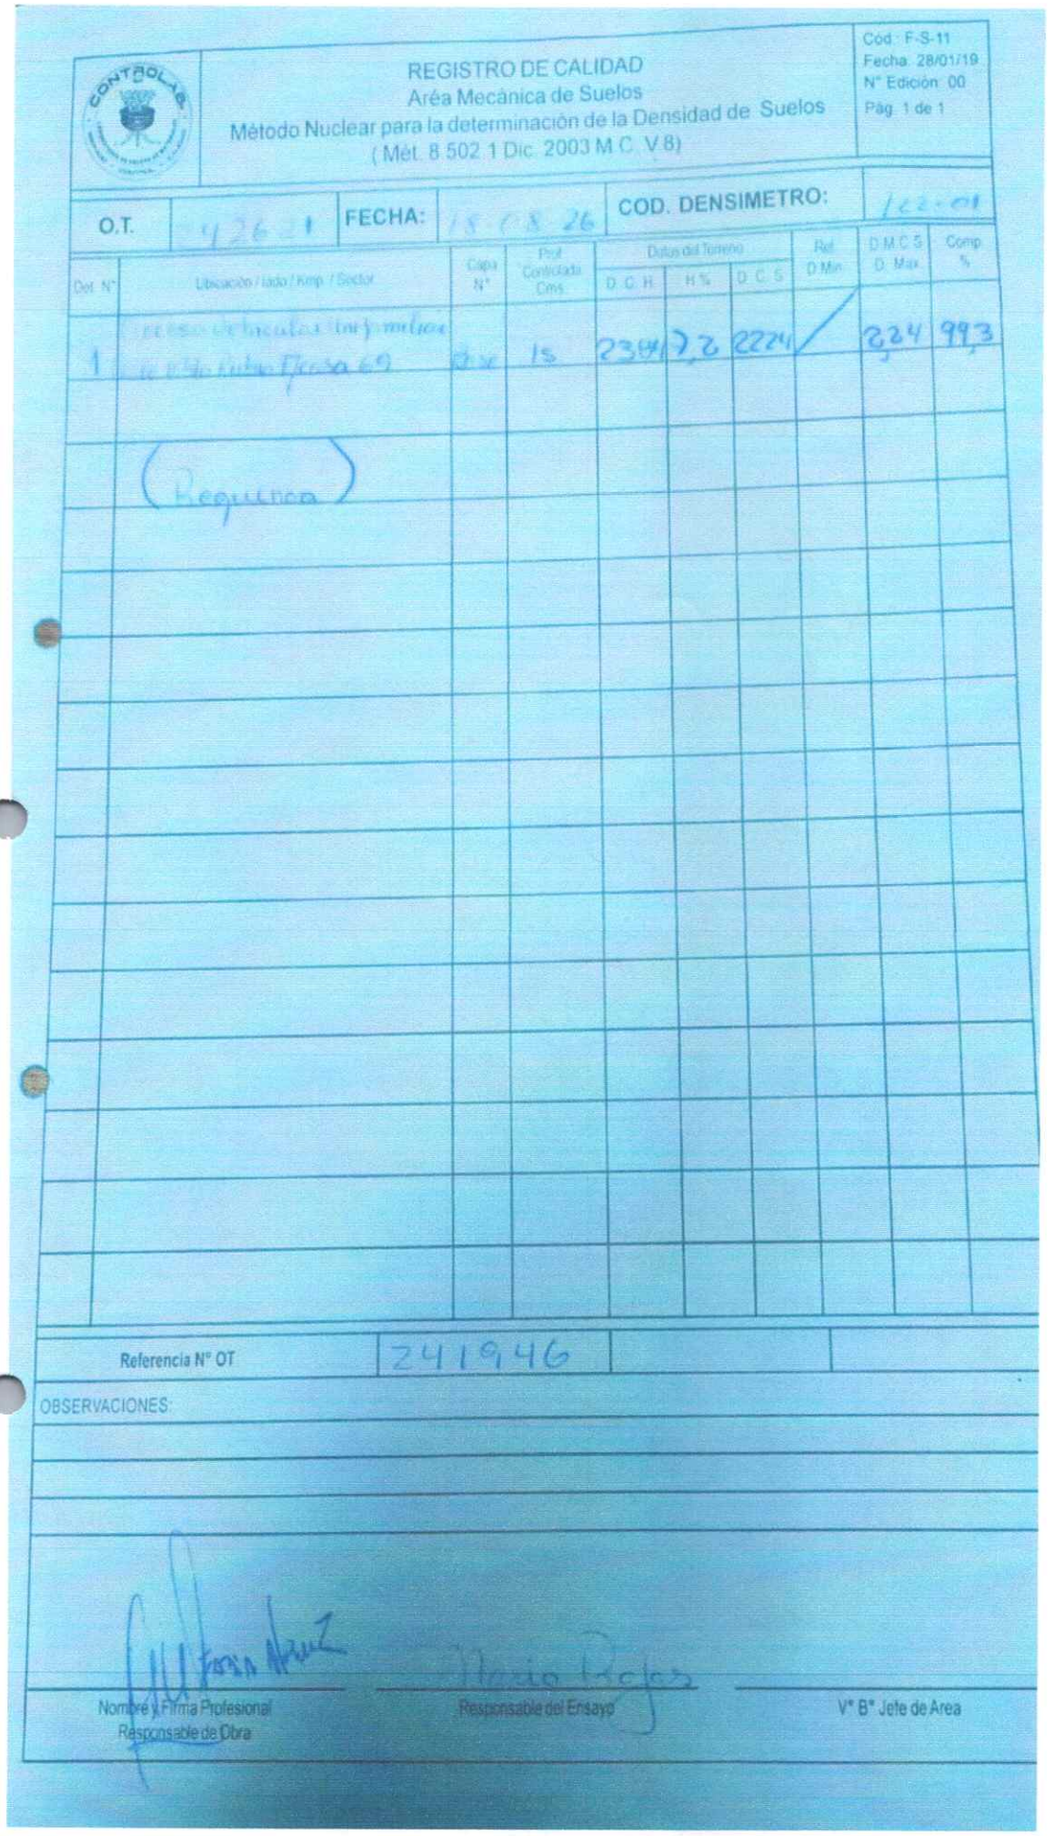

REGISTRO DE CALIDAD
Aréa Mecánica de Suelos
Método Nuclear para la determinación de la Densidad de Suelos
(Mét. 8.502.1 Dic. 2003 M.C. V.8)

Cód: F-S-11
Fecha: 28/01/19
N° Edición: 00
Pág. 1 de 1

O.T. 4261 FECHA: 18.08.26 COD. DENSIMETRO: 122-01

Det. N°	Ubicación / Lado / Km. / Sector	Capa N°	Prof. Controlada Cms.	Datos del Terreno D. C. H.	H %	D. C. S.	Rel. D Máx.	D.M.C.S. D. Max.	Comp. %
1	Acceso Circulación Informaciones Tubo Ejecución	2x	15	2364	7,2	2224	/	2,24	99,3
	(Requinoa)								

Referencia N° OT 241946

OBSERVACIONES:

Nombre y Firma Profesional Responsable de Obra

Responsable del Ensayo

V° B° Jefe de Area

CERTIFICADO DISPOSICION PARA RELLENO SANITARIO DISPOSICION FINAL PARA ESCOMBROS Y RESIDUOS INERTES

En la ciudad de Rancagua 26/08/2026

Jaramillo Ulloa Servicios y Tecnología Limitada, RUT: 76.273.262-9, con dirección en Los Suspiros #3558, Parcela 37, Ruta H30, Camino Doñihue, Rancagua. Resolución Sanitaria N° 04360, de fecha 29/04/2015, modificación N° Folio 2006436613, de fecha 14/12/2020 y rectificación Resolución Exenta N° 5004 de fecha 21/12/2020, todas otorgadas por el SEREMI de Salud de la región del Libertador Bernardo O´Higgins, certifica que los residuos inertes han sido depositados en nuestro relleno sanitario para escombros.

GENERADOR DE RESIDUO.

Nombre:	*Ilustre Municipalidad de Requínoa.*
Rut:	*69.081.300-9*
Dirección:	*Comercio N° 121, Requinoa..*

ORIGEN DEL RESIDUO.

Obra:	*Reposición veredas en Población Paraguay, Requínoa.*
Dirección:	*Poblacion Paraguay, Requinoa.*
Cantidad:	*135 M³.*
Periodo:	*Agosto de 2026.*

EMPRESA TRANSPORTISTA.

Nombre:	*Ingenieria, Arquitectura y Construcción Albura Ltda.*
Rut:	*77.947.259-0*
Dirección:	*Parque Industrial Lote A2, San Fernando.*

VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO.

Numero de Certificado:	***617/2026***
N° de factura de servicio:	*Boletas de servicios.*
Código de verificación:	*5895354697*
N° de Copia:	*1 (JUST LTDA. no entrega copias digitales)*

Para verificar la validez del origen del certificado, contactar al correo karla.ahumada@justservicios.cl y/o gonzalo.herrera@justservicios.cl, entregando el código de verificación podrá comprobar que este certificado es verdadero y confirmar la información contenida en el documento.

GONZALO HERRERA P.
Gerente de Operaciones
JUST SERVICIOS

GONZALO HERRERA POBLETE.
GERENTE DE OPERACIONES.
JUST LIMITADA.

Fecha Emisión: **13-08-2026**

Hora Emisión: **08:30**

Nº Certificado: **2000/2026/19746974**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

Nombre o Razón Social	RUT		
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA	77.947.259-0		
Representante Legal	**RUT Representante Legal**		
FELIPE PEREIRA BECERRA	[redacted]		
Código Actividad Económica	**Correo Electrónico**	**Teléfono**	
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION	constructora.albura.d@gmail.com	995752265	
Región	**Comuna**		
REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	SAN FERNANDO		
Calle	**Número**	**Departamento**	
PARQUE INDUSTRIAL LT A- 2	0		

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razón Social	RUT		
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	69.081.300-9		
Representante Legal	**RUT Representante Legal**		
WALDO VALDIVIA MONTECINOS	8.278.834-4		
Calle	**Número**	**Región**	**Comuna**
COMERCIO 121	121	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Según Contrato Civil	Modo Participación		
REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY	Contratista		
Tipo de Obra	**Empresa Principal**		
Pública	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		
Domicilio	**Número**	**Región**	**Comuna**
CALLE PABLO RUBIO	0	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	REQUÍNOA

3 - Periodos

Objetivo del Certificado	Institución Recaudadora
Cursar estado de pago	Previred

3.1 - Periodo : Julio 2026

Trabajadores	**Vigentes** 2	**Despedidos** 0	
Cotizaciones Previsionales	**Pagadas** Si	**Adjunta Nomina** No	
Remuneraciones	**Pagadas** 2	**No Pagadas** 0	**Monto Informado** $127.231
Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica
Indemnización por Año(s) de Sevicio	**Pagadas** No Aplica	**No Pagadas** No Aplica	**Monto Informado** No Aplica

4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY en el (los) periodo(s):

- Julio 2026

5 - Información Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.



María Begoña Inés Iglesias Danilla
Jefa Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

Nº Certificado: **2000/2026/19746974** Clave: **Jp85Gwb3**

Fecha Emisión: **13-08-2026**

Hora Emisión: **08:30**

N° Certificado: **2000/2026/19746974**

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificación

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Julio 2026		
N°	**RUT**	**Nombre Trabajador**
1	[redacted]	Angel Patricio Ponce Espinoza
2		Fabian Octavio Albornoz Dinamarca
		Total Trabajadores 2

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

Fonasa

8X30HVA520 - NCLEWC3amK - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKK37 - WWYX1mh8Y6 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA6

NÚMERO DE SERIE: 2017260700830537

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	X	Declaración y No Pago		Pago Declaración Anterior		Pago Parcial de Declaración	
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	X	Empleador Público		Entidad Pagadora de Subsidios			
	Trabajador Independiente		Empleador Casa Particular		Independiente TGR			

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY)			
R.U.T: 77.947.259-0			
Dirección: PABLO RUBIO		N°: 0	Depto:
Comuna: REQUÍNOA	Ciudad: REQUINOA	Región: VI Región	
Teléfono: 995752265	Casilla:	Correo electrónico: constructora.albura.d@gmail.com	
Código Actividad Económica: 439000			
Nombre Repr. Legal: FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA			
R.U.T. Repr. Lega [redacted]			
Nombre Caja Compensación: Los Andes			

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN $	127.231

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL [ ]		RETROACTIVO [ ]	
Mes: 07 Año: 2026	Mes / Año DESDE	Mes / Año HASTA	Mes / Año DESDE	Mes / Año HASTA

Tasa de Cotización		7%	X	2.8%
Modalidad de Pago	**X**	**Electrónico**		**Mixto**

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	3.563
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA	=	3.563
Compensación Asignación Familiar	-	0
MONTO PAGADO	=	3.563

N° de Afiliados	2
N° de Líneas de Detalles	2
N° Hojas Anexas	1

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30HVA520 - NCLEWC3amK - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKK37 - WWYX1mh8Y6 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA6

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017260700830537

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA

RUT 77.947.259-0

PERIODO DE REMUNERACIÓN 07 (MES) 2026 (AÑO)

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones

N°	R.U.T C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN $	COTIZACIÓN 7% ó 2,8% EN $	* Ccd. Mov.	Movimiento del personal					
										FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	[redacted]	ALBORNOZ	DINAMARCA	FABIAN OCTAVIO	1	AFP	104.166	2.917	7	31	07	2026			
2		PONCE	ESPINOZA	ANGEL PATRICIO	1	AFP	23.065	646	7	31	07	2026			

	Renta Imponible	Cotiz Obligatoria
TOTAL PÁGINA	127.231	3.563
TOTAL ACUMULADO	127.231	3.563

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

*** CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL**

0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios(Licencia médica)	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

AFP Cuprum

Número de Folio: 2001202607152407

8X3ZNC4hT2 - X2T2WC3am4 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKEX5 - WGL51mh8Y6 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hAK

Identificación del Empleador: Empresa						
Nombre o Razón Social						RUT
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY)						77.947.259-0
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono		
PABLO RUBIO 0	REQUÍNOA	REQUINOA	VI Región	995752265		
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Autorizo notificación electrónica *	Correo Electrónico	Cód. Actividad Económica	N° Trab. Dependientes	
FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA	[redacted]	[X] SI [ ] NO	constructora.albura.d@gmail.com	439000	5	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	07/2026	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	12/08/2026

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	104.166	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	104.166
Cotización Obligatoria	12.021
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	2.083
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Cuprum	14.104

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	104.166	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	3.125
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	3.125

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/08/2026
3:43 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

* Esta autorización habilita notificar por correo electrónico las demandas de cobranza judicial de cotizaciones previsionales adeudadas, conforme a las modificaciones introducidas a la Ley N° 17.322 , con los mismos efectos legales de una notificación válidamente practicada.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Cuprum

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 07/2026

Número de Folio: 2001202607152407

8X3ZNC4hT2 - X2T2WC3am4 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKEX5 - WGL51mh8Y6 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hAK

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
[redacted]	ALBORNOZ DINAMARCA FABIAN OCTAVIO	104.166	12.021	2.083	0		0	0	104.166	0	3.125	6	31/07/2026	
TOTALES GENERALES		104.166	12.021	2.083	0		0	0	104.166	0	3.125			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

AFP PlanVital

Número de Folio: 2004202607274014

8X3ZM0a1d6 - 5LAMWC3am5 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKXP8 - WW4m1mh8Y7 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA8

Identificación del Empleador: Empresa						
Nombre o Razón Social						RUT
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY)						77.947.259-0
Dirección	Comuna	Ciudad	Región		Teléfono	
PABLO RUBIO 0	REQUÍNOA	REQUINOA	VI Región		995752265	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Autorizo notificación electrónica *	Correo Electrónico		Cód. Actividad Económica	N° Trab. Dependientes
FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA	[redacted]	[X] SI [ ] NO	constructora.albura.d@gmail.com		439000	5

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	07/2026	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	12/08/2026

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	23.065	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	23.065
Cotización Obligatoria	2.597
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	461
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP PlanVital	3.058

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	23.065	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	692
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	692

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

* Esta autorización habilita notificar por correo electrónico las demandas de cobranza judicial de cotizaciones previsionales adeudadas, conforme a las modificaciones introducidas a la Ley N° 17.322 , con los mismos efectos legales de una notificación válidamente practicada.

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP PlanVital

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 07/2026

Número de Folio: 2004202607274014

8X3ZM0a1d6 - 5LAMWC3am5 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKXP8 - WW4m1mh8Y7 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA8

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
[redacted]	PONCE ESPINOZA ANGEL PATRICIO	23.065	2.597	461	0		0	0	23.065	0	692	6	31/07/2026	
	TOTALES GENERALES	23.065	2.597	461	0		0	0	23.065	0	692			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Andes

Número de Folio: 2061202607103805

8X3L9UNGg5 - E20eWC3am0 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKHG1 - WhdA1mh8Y8 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hAK

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Adherido a Mutual	RUT	Código Act. Econom.
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY)		SI	77.947.259-0	439000
Dirección	**Comuna**	**Ciudad**	**Región**	**Teléfono**
PABLO RUBIO 0	REQUÍNOA	REQUINOA	VI Región	995752265
Nombre Representante Legal		**RUT Representante Legal**	**Cambio en el Representante Legal**	
FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA		[redacted]	NO	

Resumen de Cotizaciones, Rebajas y Reintegros	
Detalle	**Valores($)**
COTIZACIÓN NO AFILIADOS A ISAPRE	5.344
ASIGNACIÓN FAMILIAR	0
ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA	0
REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR	0
COTIZACIÓN - REBAJAS	5.344
Resumen de Productos	
CREDITOS PERSONALES	0
CONVENIOS DENTALES	0
LEASING	0
SEGUROS DE VIDA	0
OTROS	0
TOTAL PRODUCTOS	0
TOTAL A PAGAR A La Caja de Compensación Los Andes	5.344

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	**Gratificaciones**	**Desde**	**Hasta**
X			

Periodo	Código Participante
Julio 2026	
N° de Afiliados Informados	**N° de Declaración**
2	

Pago Electrónico
12/08/2026
3:43 PM
PREVIRED

Esteban Segura R.
Gerente General

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Caja de Compensación Los Andes

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2026

Número de Folio: 206120260710380 5

8X3L9UNGg5 - E20eWC3am0 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKHG1 - WhdA1mh8Y8 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hAK

Identificación del Trabajador		Monto Remuneraciones Imponibles				Asignaciones Familiares							Movimiento de Personal			
			No Afiliados a Isapre			Cantidad de Cargas										
RUT	Nombre Afiliado	Afiliados a Isapre	Remuneración	Cotización 4,2%	Días Trab.	Sim.	Invl.	Mat.	Monto Asig. Fam.	Cod. Tramo	Pago A.F. Retroactiva	Reintegro Asig. Fam.	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término	Rut. Ent. Pag. Subs.
[redacted]	ALBORNOZ DINAMARCA FABIAN OCTAVIO	0	104.166	4.375	1	0	0	0	0	D	0	0	1	31/07/2026		
	PONCE ESPINOZA ANGEL PATRICIO	0	23.065	969	1	0	0	0	0	D	0	0	1	31/07/2026		
	TOTALES GENERALES	$0	$127.231	$5.344		0	0	0	$0		$0	$0				

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Movimientos de Personal: 1. Contrataciones 2. Retiros 3. Subsidios 4. Permiso sin goce de sueldo 5. Remuneraciones 12. Reliquidación premio o bono posterior al finiquito 13. Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227) 14. Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227) 15. Reducción de Jornada (Ley N°21.227)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Número de Folio: 2080202607157830

8X38We8U25 - XZ9mWC3am3 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKHAK - W1HK1mh8Y1 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA1

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY)		constructora.albura.d@gmail.com	77.947.259-0	439000
Dirección	**Comuna**	**Ciudad**	**Región**	**Teléfono**
PABLO RUBIO 0	REQUÍNOA	REQUINOA	VI Región	995752265
Nombre Representante Legal		**RUT Representante Legal**	**Cambio en el Representante Legal**	
FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA		[redacted]	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	**Porcentaje**
TASA COTIZACIÓN	3,48%
Detalle	**Valores($)**
TOTAL REMUNERACIONES	127.231
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	4.428

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	**Gratificaciones**	**Desde**	**Hasta**
X			
Periodo		**N° Contrato**	
Julio 2026			
N° de Afiliados Informados		**N° de Declaración**	
2			

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 07/2026

Número de Folio: 2080202607157830

8X38We8U25 - XZ9mWC3am3 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKHAK - W1HK1mh8Y1 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA1

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
[redacted]	ALBORNOZ	DINAMARCA	FABIAN OCTAVIO	104.166	3.625	20	31/07/2026	
	PONCE	ESPINOZA	ANGEL PATRICIO	23.065	803	20	31/07/2026	

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic.Médica por enfermedad o acc.laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 12:Reliquidación, premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

FORMULARIO DE COTIZACIONES PREVISIONALES – SEGURO SOCIAL PREVISIONAL

Seguro Social

Número de Folio: 2006260701047014

8X30A48Nm2 - gHdmWC3am8 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKXA3 - W3W01mh8Y9 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA7

Identificación del Empleador: Empresa					
Nombre o Razón Social					RUT
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA (REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY)					77.947.259-0
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
PABLO RUBIO 0	REQUÍNOA	REQUINOA	VI Región	995752265	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Autorizo notificación electrónica *	Correo Electrónico	Cód Actividad Económica	N° Trab. Dependientes
FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA	[redacted]	[X] SI [ ] NO	constructora.albura.d@gmail.com	439000	5

[X] Pago en Plazo [ ] Declaración y no Pago [ ] Pago por Ley Bustos [ ] Pago Atrasado

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN $	$127.231
RESUMEN COTIZACIONES SEGURO SOCIAL	
Seguro Social Previsional	1.145
Rentabilidad Protegida	0
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	0
Subtotal:	1.145
Interés - Reajuste	0
Recargo	0

MONTO PAGADO	1.145

N° Afiliados Informados	2

PERIODO COTIZACIONES

REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL [ ]	RETROACTIVO [ ]
Mes 07 Año 2026	Mes Año DESDE | Mes Año HASTA	Mes Año DESDE | Mes Año HASTA

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Formulario jurídicamente válido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

* Esta autorización habilita notificar por correo electrónico las demandas de cobranza judicial de cotizaciones previsionales adeudadas, conforme a las modificaciones introducidas a la Ley N° 17.322 , con los mismos efectos legales de una notificación válidamente practicada.

FORMULARIO DE COTIZACIONES PREVISIONALES - SEGURO SOCIAL PREVISIONAL

Seguro Social

Pago Electrónico
12/08/2026 3:43 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 07/2026

Número de Folio: 2006260701047014

8X30A48Nm2 - gHdmWC3am8 - CHHZX8XPa7 - 8hN5NTKXA3 - W3W01mh8Y9 - 3AXPa8Wd22 - 4C0gAXPa89 - WTU8N1hA7

Identificación del Trabajador			Cotizaciones					Tipo Jornada	Días Trabajados	Movimiento de Personal		
N°	RUT	Nombres y Apellidos	Renta Imponible	Renta Imponible Anterior Días Licencia	Seguro Social Previsional	Rentabilidad Protegida	SIS			Código Mov.	Fecha Inicio	Fecha Término
1	[redacted]	ALBORNOZ DINAMARCA FABIAN OCTAVIO	104.166	0	937	0	0	JC	1	7	31/07/2026	
2		PONCE ESPINOZA ANGEL PATRICIO	23.065	0	208	0	0	JC	1	7	31/07/2026	
Totales Generales			127.231	0	1.145	0	0					

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 00: Sin movimiento; 01: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 02: Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 03: Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 04: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 05: Incorporación en el Lugar de Trabajo; 06: Accidente del trabajo.; 07: Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 08: Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 11: Otros Movimientos (Ausentismo); 12: Reliquidación, Premio o Bono pagados con fecha posterior al finiquito.

Descripción de Códigos de Tipo Jornada: JC: Jornada Completa; JP: Jornada Parcial;

Renta Imponible Anterior Días Licencia: Corresponde a la Renta Imponible Mes Anterior al subsidio por incapacidad laboral proporcional a los días con licencia médica (Mov. personal 3 o 6).

Formulario jurídicamente válido para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

Fecha Emisión: **03/09/2026**
Hora: **11:16**
Cód. de Seguimiento: **KBQL-ROWO-VLYQ**

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de Entidad Empleadora y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, que es de su responsabilidad, resuelve lo siguiente:

1.- Entidad Empleadora

Nombre o Razón Social
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA

Código de Actividad Económica (CAE)
9048931 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

RUT Entidad Empleadora	Representante Legal	RUT Representante Legal
77947259-0	FELIPE ANDRES PEREIRA BECERRA	17258721-6

Solicitante	RUT Solicitante	Correo Electrónico NCC
FELIPE ANDRÉS PEREIRA BECERRA	17258721-6	constructora.albura.d@gmail.com

2.- Antecedentes Laborales y Previsionales

Disponibles en el Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional.

2.1 - Multas ejecutoriadas no publicadas en el Boletín de Infractores (Dirección del Trabajo)

N° de Multa	N° Unidades Monetarias	Tipo de Unidad Monetaria	Estado
NO REGISTRA			

2.2 - Multas ejecutoriadas publicadas en el Boletín de Infractores (Equifax)

N° de Multa	Tipo de Unidad Monetaria	Monto en CLP ($)

NO REGISTRA

2.3 - Deuda Previsional Publicada en el Boletín de Infractores (Equifax)

Motivo	Institución	Monto en UTM	Monto en CLP ($)
NO REGISTRA			

Verifica este documento

Dirección del Trabajo

Escaneando el código QR

O en el sitio
https://midt.dirtrab.cl/verificadorDocumental
ingresando

AZXGMMMGAOJX

REGISTRO FOTOGRAFIO – EDP N°1


REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY


CONSTRUCTORA ALBURA
INGENIERIA, ARQUITECTURA & CONSTRUCCION

Letrero indicativo de obra



Demolición de aceras

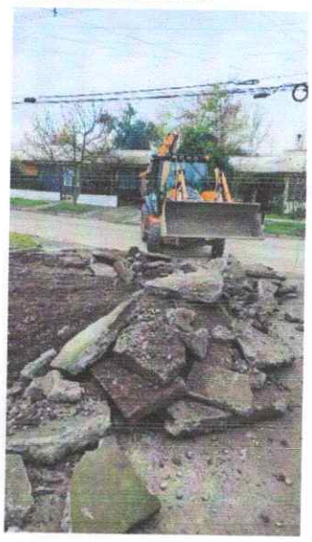

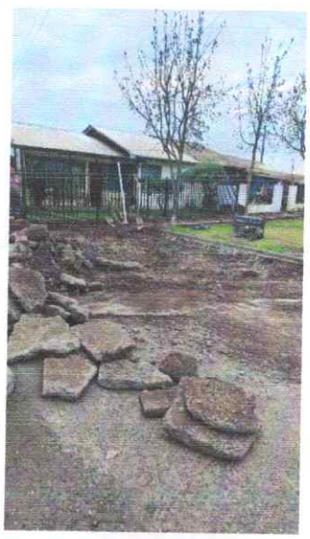



Excavaciones







REGISTRO FOTOGRAFIO – EDP N°1

REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY

CONSTRUCTORA ALBURA
INGENIERIA, ARQUITECTURA & CONSTRUCCION

Transporte a botadero



CERTIFICADO DISPOSICION PARA RELLENO SANITARIO
DISPOSICION FINAL PARA ESCOMBROS Y RESIDUOS INERTES



Base estabilizada e=0,05 mt (aceras de HC e =0,07 mt)








Base estabilizada e=0,15 mt (aceras de HC e=0,12mt)



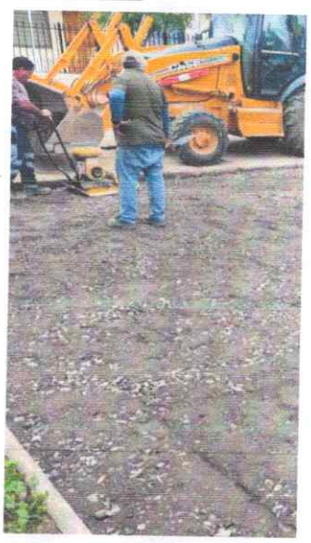



REGISTRO FOTOGRAFIO – EDP N°1

REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY


CONSTRUCTORA ALBURA
INGENIERIA, ARQUITECTURA & CONSTRUCCION

Moldajes de madera





Aceras de HC e=0,07 mt (circulación peatonal)

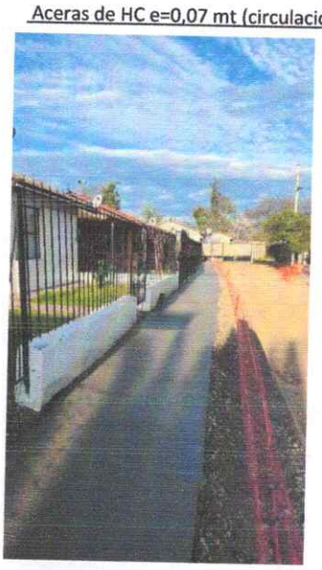



Aceras de HC e=0,12 mt (acceso vehicular y circulación peatonal)





REGISTRO FOTOGRAFIO – EDP N°1

REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY

CONSTRUCTORA ALBURA
INGENIERIA, ARQUITECTURA & CONSTRUCCION

Rampa

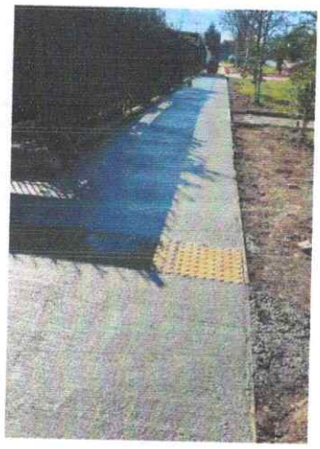



Base para instalación BMV





BMV Tipo Minvu 0 color amarillo





REQUINOA
AREA : MUNICIPAL

Fecha: 16/9/2026
Hora: 10:07:51

OBLIGACION

Comprobante: 4811 Fecha: 16/09/2026 Resolución:
Rut: 77947259-0 Nombre: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIM
Tipo Doc.: DECRETO ALCALDICIO N° Documento: 1694 Departamento: GABINETE
Banco: 38509007087 FONDOS GENERALES Centro de Costo: GENERAL
Glosa: ANULA OBLIGACIÓN N° 2840. SE OBLIGA NUEVAMENTE PARA CAMBIAR EL TIPO DE BANCO

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-31-02-004-230-000	PMU REPOSICION VEREDAS	-131,527,543	143,422,000	0	143,422,000
	TOTAL:	**-131,527,543**			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-31-02-004-230-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(22) PROYECTOS MUNICIPALES	(1) PROYECTOS MUNICIPALES	-131,527,543	143,422,000	0	143,422,000

PREPARADO POR | JEFE CONTABILIDAD | D.A.F. | CONTROL

Folio N° : **23791234**

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 16-09-2026, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIMITADA**, RUT N° **77947259-0**, domiciliado en **PARQUE INDUSTRIAL LT A- 2**, ha transferido al cesionario **BORA FACTORING SPA**, RUT N° **76509844-0**, domiciliado en **SAN SEBASTIAN N?2807**, anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

Nombre o Razón Social del Deudor:	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Vigencia de la Anotación Fecha Inicio:	**VIGENTE** 09-09-2026 15:59:02
Fecha último vencimiento:	10-10-2026 00:00:00
Monto cedido:	$ 28.286.755

RUT Emisor del Documento	77947259-0
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	48
Fecha del Documento	07-09-2026 00:00:00
Monto del Documento	$ 28.286.755

_____
FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____
N° de RUT: _____
Fecha del certificado: 16-09-2026 10:20:27

Imprimir Cerrar

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 3855

REQUINOA , 16 de Septiembre de 2026

Vistos:

Decreto

Páguese a: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIM Rut 77947259-0

La Cantidad de 28,286,755 VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR ESTADO DE PAGO N°1 DEL PROYECTO "REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY". CERT. DISPONIBILIDAD N°509. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-349-SE26.CEDIDO A BORA FACTORING SPA//TRANSFER//

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	48	07/09/2026	28,286,755

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	28,286,755	
215-31-02-004-230-000	PMU REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY (F.EXT.)		28,286,755
	Totales	28,286,755	28,286,755

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... $ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA		28,286,755
215-31-02-004-230-000	PMU REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY (F.EXT.)	28,286,755	
	Totales	28,286,755	28,286,755

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 5520 **FECHA:** 16/09/2026

R.U.T.: 77947259-0 **NOMBRE:** INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIM

DEPARTAMENTO: SECPLAN **CENTRO DE COSTO:** GENERAL

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA **N° DOCUMENTO:** 48

GLOSA: ESTADO DE PAGO N°1 DEL PROYECTO "REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY". CERT. DISPONIBILIDAD N°509. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-349-SE26.

BANCO: 38509019964 FONDOS EXTERNOS **N° CHEQUE:** 0 **FECHA CHEQUE:**

DECRETO PAGO: **N° EGRESO:** 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	D E B E	H A B E R
215-31-02-004-230-000	PMU REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY (F.EXT.)	0	28,286,755
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	28,286,755	0
	TOTAL:	**28,286,755**	**28,286,755**

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
4812	16/09/2026	215-31-02-004-230-000	131,527,543	1694	143,422,000	0	11,894,457

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
4812	215-31-02-004-230-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	PROYECTOS MUNICIPALES	PROYECTOS MUNICIPALES	28,286,755

PREPARADO POR | JEFE CONTABILIDAD | D.A.F. | CONTROL

REQUINOA
AREA : MUNICIPAL

Fecha: 16/9/2026
Hora: 10:11:15

OBLIGACION

Comprobante: 4812 Fecha: 16/09/2026 Resolución:

Rut: 77947259-0 Nombre: INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALBURA LIM

Tipo Doc.: DECRETO ALCALDICIO N° Documento: 1694 Departamento: SECPLAN

Banco: 38509019964 FONDOS EXTERNOS Centro de Costo: GENERAL

Glosa: POR PROYECTO "REPOSICION DE VEREDAS POBLACION PARAGUAY". CERT. DISPONIBILIDAD N°509. ORDEN DE COMPRA N°3656-349-SE26.

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-31-02-004-230-000	PMU REPOSICION VEREDAS	131,527,543	143,422,000	0	11,894,457
	TOTAL:	**131,527,543**			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-31-02-004-230-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(22) PROYECTOS MUNICIPALES	(1) PROYECTOS MUNICIPALES	131,527,543	143,422,000	131,527,543	11,894,457

PREPARADO POR | JEFE CONTABILIDAD | D.A.F. | CONTROL
